

CLFC/2022/11 del 24 novembre 2022

CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ-CESENA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo
Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

IL COORDINATORE

F.to Giuseppe Petetta

CLFC/2022/11

CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ-CESENA

L'anno **2022** il giorno **24** del mese di **novembre** alle ore **15:30** si è riunito il Consiglio Locale di Forlì-Cesena, convocato con lettera PG.AT/2022/00011498 del 15/11/2022.

La seduta si è svolta in modalità telematica.

Assume la presidenza Giuseppe Petetta.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	Garbuglia Luciana	Consigliere	SI	10,0000
Bagno di Romagna	Spighi Enrico	Vicesindaco	SI	1,4604
Bertinoro				2,5691
Borghi				0,8921
Castrocaro Terme e Terra del Sole				1,5986
Cesena	Lucchi Francesca	Assessore	SI	20,2244
Cesenatico	Agostini Jacopo	Assessore	SI	5,6626
Civitella di Romagna				1,0539
Dovadola	Scotti Marco	Assessore	SI	0,6211
Forlì	Petetta Giuseppe	Sindaco	SI	24,4767
Forlimpopoli				3,0054
Galeata				0,8031
Gambettola	Bisacchi Maria Letizia	Sindaco	SI	2,4969
Gatteo				2,2271
Longiano				1,7937
Meldola				2,3382
Mercato Saraceno	Palazzi Ignazio	Assessore	SI	1,7037
Modigliana				1,1970
Montiano				0,6469
Portico e San Benedetto				0,4519
Predappio	Canali Roberto	Sindaco	SI	1,5897
Premilcuore				0,4463
Rocca San Casciano				0,6709
Roncofreddo				1,0001
San Mauro Pascoli	Garbuglia Luciana	Sindaco	SI	2,8298
Santa Sofia				1,1335
Sarsina				0,9804
Savignano sul Rubicone	Bertozzi Natascia	Assessore	SI	3,9832
Sogliano al Rubicone				0,9473

Tredozio				0,5327
Verghereto				0,6631

Presenti n. 11 quote 75,0484 - Assenti n. 20 quote 24,9516

Riconosciuta la validità della seduta Giuseppe Petetta, in qualità di Coordinatore assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.9 del 28 novembre 2019 del Consiglio locale di Forlì-Cesena è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'Ambito;
- con deliberazione n.86 del Consiglio d'Ambito del 21 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A.;

- con deliberazione n.18 del Consiglio d'Ambito del 7 giugno 2021 è stato approvato l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A. di cui alla deliberazione CAMB n. 86/2020, e approvazione della connessa istanza di proroga delle attuali concessioni del Servizio Idrico Integrato di durata quinquennale nei medesimi territori;
- con nota PG.AT/2021/0000044 del 07/01/2021 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR il nulla osta di ATERSIR ai sensi della deliberazione di Consiglio d'Ambito n.75/2017, per "Variante progettuale che determina un aumento dell'importo progettuale complessivo superiore a 200.000 € rispetto a quello già previsto nel POI vigente" (Caso D) relativo all'intervento 2014FCHA0065 "RISAN.SCARICHI 213-214 BORGO SISA-FORLI" in Comune di Forlì (FC);
- con nota PG.AT/2021/0009588 del 21/10/2021 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR il nulla osta di ATERSIR ai sensi della deliberazione di Consiglio d'Ambito n.75/2017, per "Variante progettuale che determina un aumento dell'importo progettuale complessivo superiore a 200.000 € rispetto a quello già previsto nel POI vigente" (Caso D) relativo all'intervento 2017FCHA0002 - RISANAMENTO SC. 6-41 – LOCALITÀ ACQUAPARTITA;
- con deliberazione n.10 del 27 luglio 2022 del Consiglio locale di Forlì-Cesena è stata approvata la revisione del Programma Operativo degli Interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A., per le sole annualità 2022 e 2023;

considerato inoltre che:

- con deliberazione n. del 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato": modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017";
- la deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);

- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore HERA S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata a tutti i comuni del bacino provinciale di Forlì-Cesena, in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all'annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

rilevato inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano complessivamente pari a 17.241.677,92 €, valore inferiore di circa il 17% rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2021;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti a favore unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal gestore HERA S.p.a. e relativi al bacino tariffario di Forlì-Cesena, come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 11 del 24 novembre 2022

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 24 novembre 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO
2021**

**GESTORE: HERA S.p.A.
BACINO PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA**

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 09 del 28/11/2019 (oggetto di successiva revisione straordinaria per le sole annualità 2022 e 2023 con deliberazione di Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.10 del 27/07/2022), che il gestore HERA S.p.A. ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
GESTORE	13.088.500,00	12.015.813,04	-1.072.686,96	-8%
SOCIETÀTERZE	6.120.000,00	3.433.409,23	-2.686.590,77	-44%
FINANZIAMENTI PUBBLICI	1.460.000,00	1.792.455,65	332.455,65	23%
TOTALE	20.668.500,00	17.241.677,92	-3.426.822,08	-17%

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 (esclusi gli investimenti di struttura)

Per quanto riguarda il riconoscimento tariffario degli investimenti di struttura si rimanda alle *Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa* approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il Gestore HERA S.p.A. abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 8% con riferimento a quelli direttamente finanziati, e minori per circa un 44% con riferimento a quelli finanziati da altro soggetto investitore (Società degli assets). Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è maggiore di quello pianificato di un 23%. Complessivamente lo scostamento è stato del 17% in diminuzione.

La percentuale di investimenti realizzati, esclusi gli investimenti di struttura, è pertanto dell'83%.

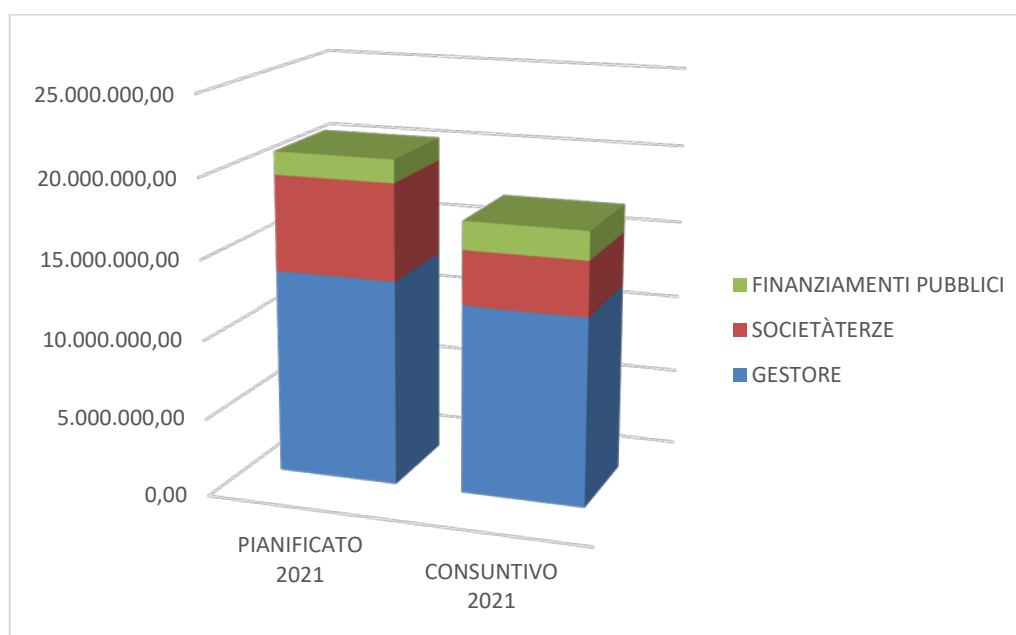


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	8.649.500,00	8.759.392,73	109.892,73	1%
DEPURAZIONE	3.632.000,00	4.792.990,51	1.160.990,51	32%
FOGNATURA	8.387.000,00	3.689.294,68	-4.697.705,32	-56%
ACQUE METEORICHE	-	-	-	-
TOTALE	20.668.500,00	17.241.677,92	-3.426.822,08	-17%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per servizio e rappresentati graficamente come segue:

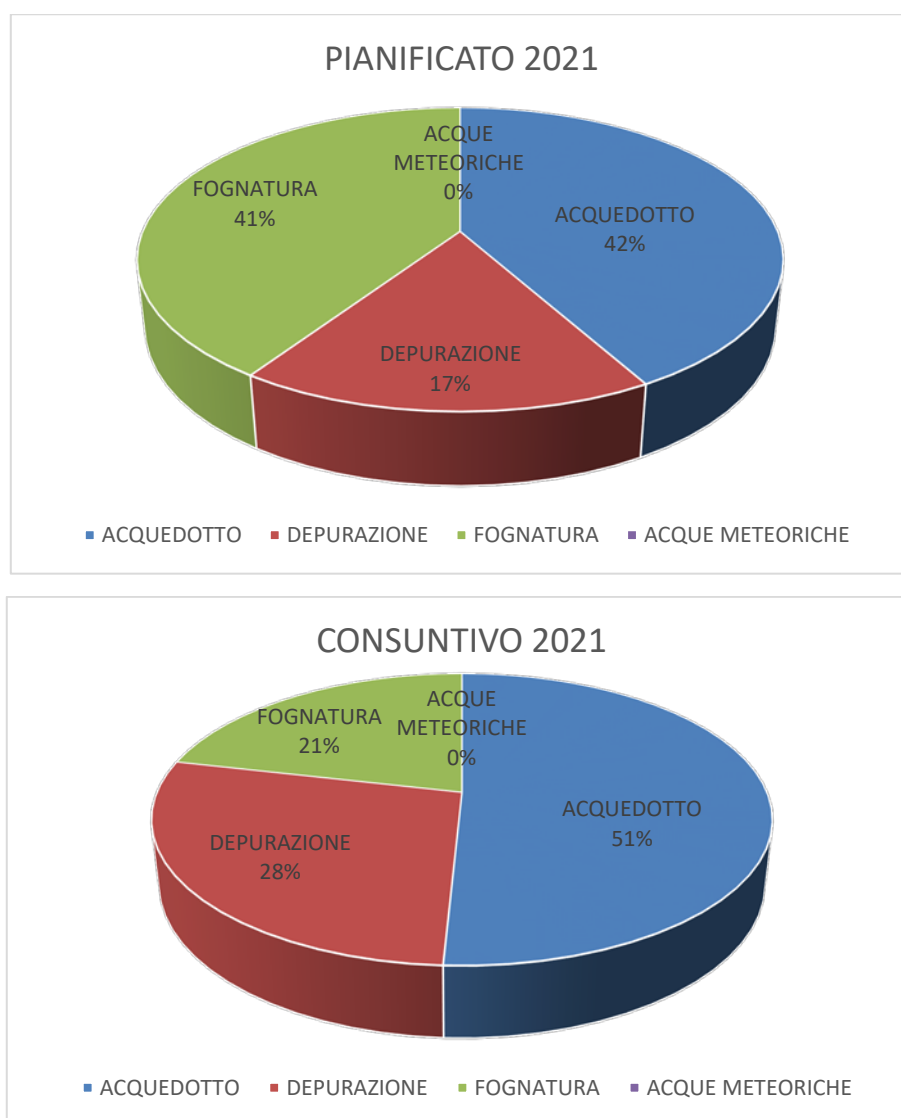


FIG.2 –Suddivisione per servizio investimenti pianificati e consuntivati 2021

La tabella successiva fornisce un focus degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie di acquedotto, fognatura e depurazione contenute in titoli cumulativi.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	6.878.500,00	8.100.655,32	1.222.155,32	18%
DEPURAZIONE	1.175.000,00	2.856.672,73	1.681.672,73	143%
FOGNATURA	1.905.000,00	1.519.906,83	-385.093,17	-20%
ACQUE METEORICHE	-	-	-	-
TOTALE	9.958.500,00	12.477.234,88	2.518.734,88	25%

TAB.3 – Investimenti relativi ai titoli cumulativi delle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito dagli interventi di manutenzione straordinaria contenuti in titoli cumulativi; per questi titoli è previsto un budget complessivo a cui il Gestore associa i micro-interventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Confrontando i dati della TAB.3 con quelli della TAB.2 si deduce che l'incidenza dei titoli cumulativi nell'anno 2021, era il 48% del valore totale pianificato e si accresce fino al 72% del valore totale consuntivato.

Si specifica che, per quanto riguarda la tipologia "acque meteoriche", i costi di investimento pianificati e consuntivati sono posti uguali a zero perché non è stato affidato al Gestore del SII il servizio di gestione delle acque meteoriche nel bacino territoriale di Forlì-Cesena.

Si riportano di seguito gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

IMPORTO	N.	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	69	2.378.000,00	685.477,99	-1.692.522,01	-71%
501.000-1.000.000 €	19	1.311.000,00	725.291,33	-585.708,67	-45%
1.000.001-2.000.000 €	12	1.753.000,00	1.158.246,79	-594.753,21	-34%
2.000.001-5.000.000 €	10	5.903.000,00	2.867.883,93	-3.035.116,07	-51%
Oltre 5.000.000 €	1	90.000,00	50.102,77	-39.897,23	-44%
Interventi cumulativi	19	9.233.500,00	11.754.675,11	2.521.175,11	27%
TOTALE	130	20.668.500,00	17.241.677,92	- 3.426.822,08	-17%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

In ultimo viene effettuata un'analisi degli scostamenti tra quanto il Gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato.

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- ritardi accumulati per il prolungamento delle attività autorizzative o approfondimenti tecnici
- riprogrammazione di attività
- ritardo fornitura di materiale correlata alla generalizzata crisi delle materie prime
- flusso di fatturazione alle Società degli Asset
- accordo di finanziamento non ancora sottoscritto
- minori/maggiori esigenze di manutenzione straordinaria a riguardo dei titoli cumulativi, i quali hanno una pianificazione annuale di massima
- interventi stralciati/sostituiti

Il numero di interventi a piano, esclusi i 2 interventi di struttura, è pari a 130.

Il numero di interventi con un importo pianificato nel 2021 è pari a 59. Il numero di interventi con un importo rendicontato nel 2021 è pari a 47.

Ci sono inoltre 62 interventi presenti a piano nell'annualità 2021 con importo pianificato pari a 0 e importo rendicontato pari a 0.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%), cd "non avviati"	21	3.568.000,000	0,00
Interventi con un valore pianificato pari a 0 e un valore consuntivato diverso da 0 (+100%)	9	0,00	312.717,02
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	30	10.820.500,00	10.891.684,80
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	8	6.280.000,00	6.037.276,10
TOTALE	68	20.668.500,00	17.241.677,92

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal Gestore

Si può notare come gli scostamenti in aumento o diminuzione tra pianificato 2021 e consuntivato 2021 si compensano.

I minori importi consuntivati sono dovuti principalmente agli interventi così detti "non avviati", cioè con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0. Possono essere, ad esempio, interventi non iniziati, annullati, sospesi, con accordo di finanziamento non ancora sottoscritto, etc... Per maggiori dettagli si rimanda alle note giustificative del Gestore.

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono ritenute esaustive e sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

3. INTERVENTI “NON AVVIATI”

Si riporta l'elenco degli interventi “non avviati”, che presentano un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (inseriti convenzionalmente con scostamento pari a -100%).

Possono essere, ad esempio, interventi non iniziati, annullati, sospesi, con accordo di finanziamento non ancora sottoscritto. Per maggiori dettagli si rimanda alle note giustificative contenute nell'allegato 1.

	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo lordo pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021
1	2019FCHA0002	Potenz. collegamento acquedottistico Acquapartita-Casenuove	A	Bagno di Romagna	Romagna Acque	256.000,00	-
2	2019FCHA0003	Potenziamento sollevamento "Colombarone"	A	Bertinoro	Gestore	80.000,00	-
3	2019FCHA0004	Ottimizzazione dello scolmatore "ex depuratore Bertinoro"	F	Bertinoro	Gestore	80.000,00	-
4	2019FCHA0005	Automazione dell'opera di presa "Capocolle"	F	Bertinoro	Gestore	80.000,00	-
5	2019FCHA0006	Realizzazione del sollevamento rompitratte sulla premente "Cavalli"	F	Bertinoro	Gestore	170.000,00	-
6	2019FCHA0007	Ottimizzazione dello scolmatore "Coromano"	F	Bertinoro	Gestore	80.000,00	-
7	2019FCHA0009	Realizzazione rete fognaria v. Colombarone	F	Bertinoro	Unica Reti	135.000,00	-
8	2019FCHA0010	Revamping digestori depuratore di Cesena	D	Cesena	Unica Reti	83.000,00	-
9	2019FCHA0011	Installazione centrifughe e silos fanghi depuratore di Cesena	D	Cesena	Romagna Acque	87.000,00	-
10	2019FCHA0015	Revamping digestori del depuratore di Forlì	D	Forlì	Soc. Asset non definitiva	90.000,00	-

11	2019FCHA0016	Installazione centrifuga e silos fanghi depuratore di Forlì - 2 stralcio	D	Forlì	Soc. Asset non definita	97.000,00	-
12	2019FCHA0018	Ottimizzazione del sistema fognario di Gatteo mare	F	Gatteo	Gestore	50.000,0	-
13	2019FCHA0020	Interferenze sotto servizi acquedotto con rete autostradale - FC-ATO8	A	Opere Pluri-comunali	Gestore	10.000,00	-
14	2019FCHA0025	Interferenze sotto servizi fognatura con rete autostradale - FC-ATO8	F	Opere Pluri-comunali	Gestore	10.000,00	-
15	2018FCHA0001	Risan. Roncofreddo e Cento - stralcio 2 (collettamento Cento - Longiano)	F	Roncofreddo	Romagna Acque	1.272.000,00	-
16	2018FCHA0002	Risan. Roncofreddo e Cento - stralcio 1 (1 lotto - Cento-cimitero)	F	Roncofreddo	Romagna Acque	57.000,00	-
17	2017FCHA0026	Potenz. dorsale SP 138 Sarsina/Quarto	A	Sarsina	Gestore	360.000,0	-
18	2019FCHA0031	Collettamento al depuratore di Bacciolino	F	Sarsina	Gestore	200.000,00	-
19	2019FCHA0033	Revamping digestori del depuratore di Savignano	D	Savignano sul Rubicone	Soc. Asset non definita	100.000,00	-
20	2019FCHA0034	Bonifica condotta Cagnona (1 stralcio)	F	Savignano sul Rubicone	Unica Reti	250.000,00	-
21	2014FCHA0117	Rifacimento fognatura bivio Montegelli	F	Sogliano al Rubicone	Gestore	21.000,00	-

							Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Forlì-Cesena n. 9 del 28/11/2019				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
1	2014FCHA0006	Risan. sc.17 agglom.<200ae v. Casellina	F	Bagno di Romagna	Gestore	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2014FCHA0007	Risan. sc.16 Castello s.Piana 2 stralcio	F	Bagno di Romagna	Gestore	255.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2015FCHA0001	Risan. sc.8 loc. Pian di gallina	F	Bagno di Romagna	Gestore	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2015FCHA0002	Risan. loc.Marcone	F	Bagno di Romagna	Gestore	225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2015FCHA0003	Risan. sc.4-7-9 loc. Valgianna	F	Bagno di Romagna	Gestore	399.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	2015FCHA0005	Risan. sc.5 loc. Ca di Foietta	F	Bagno di Romagna	Gestore	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	2015FCHA0007	Risoluzione interferenze con servizio tecniciodi bacino	F	Bagno di Romagna	Gestore	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	2017FCHA0002	Risan. sc.6-41 loc. Acquapartita	F	Bagno di Romagna	Unica Reti	2.941.000,00	710.000,00	-	710.000,00	-	920.865,98	-	920.865,98	-	210.865,98	30%	Intervento in fase esecutiva. AA sottoscritto il 25/11/2021
9	2019FCHA0001	Costruzione nuovo sollevamento val Gimigli	A	Bagno di Romagna	Soc. Asset non definita	251.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Intervento in fase prog. prelim. AA non sottoscritto al 31/12/2021: i costi saranno rendicontati nell'anno di sottoscrizione dell'accordo
10	2019FCHA0002	Potenz. collegamento acquedottistico Acquapartita-Casenuove	A	Bagno di Romagna	Romagna Acque	-	256.000,00	-	256.000,00	-	-	-	-	-	256.000,00	-100%	ID sostituito per cambio di Soggetto finanziatore (da RASDF a HERA). Intervento in esecuzione che verrà rendicontato sul nuovo ID 2022FCHA0014
11	2014FCHA0012	Potenz. rete acq. S. Maria nuova-lotto2	A	Bertinoro	Romagna Acque	750.265,00	213.000,00	-	213.000,00	-	158.933,40	-	158.933,40	-	54.066,60	-25%	Intervento in esecuzione senza particolari criticità. Scostamento legato al flusso di fatturazione. Tempistiche realizzative in linea con il POI
12	2014FCHA0013	Potenz. rete acq. S. Maria nuova-lotto3	A	Bertinoro	Romagna Acque	747.000,00	-	-	-	-	8.965,15	-	8.965,15	-	8.965,15	100%	Intervento concluso. Scostamento legato al flusso di fatturazione alla Soc. Asset
13	2014FCHA0015	Potenz. rete idrica via Dismano	A	Bertinoro	Romagna Acque	87.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	2014FCHA0016	Risan. sc.19-20 v. Cerbiano-Bracciano Bert	F	Bertinoro	Gestore	261.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	2014FCHA0017	Risan. sc.1 S.Pietro-sc.3 S.Andrea	F	Bertinoro	Romagna Acque	1.316.000,00	-	-	-	-	104.736,11	-	104.736,11	-	104.736,11	100%	Intervento concluso. Scostamento legato al flusso di fatturazione alla Soc. Asset
16	2015FCHA0009	Risan. sc.37-38 Collinello	F	Bertinoro	Gestore	739.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	2017FCHA0003	Potenziamento rete idrica località La Fratta	A	Bertinoro	Unica Reti	693.802,00	117.000,00	-	117.000,00	-	44.188,83	-	44.188,83	-	72.811,17	-62%	Intervento tecnicamente concluso. Da realizzare i tappeti. Scostamento legato al flusso di fatturazione alla Soc. Asset
18	2017FCHA0004	Realizzazione rete fognaria v. Colombarone	F	Bertinoro	Gestore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ID stralciato
19	2019FCHA0003	Potenziamento sollevamento "Colombarone"	A	Bertinoro	Gestore	-	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-100%	ID stralciato. Il potenziamento del sollevamento non è più necessario come confermato dal Comune: il PAC 11 è fermo e non sono previsti aumenti di richiesta idrica nell'area
20	2019FCHA0004	Ottimizzazione dello scolmatore "ex depuratore Bertinoro"	F	Bertinoro	Gestore	-	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-100%	ID stralciato. Lo scolmatore è stato telecontrollato ed è stato verificato che non esiste la criticità che aveva generato l'inserimento dell'ID a piano
21	2019FCHA0005	Automazione dell'opera di presa "Capocolle"	F	Bertinoro	Gestore	100.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-100%	Sospesa progettazione. L'intervento non è prioritario. Si rimanda alla conclusione del tavolo di confronto con la RER sulle opere di presa
22	2019FCHA0006	Realizzazione del sollevamento rompitratta sulla premente "Cavalli"	F	Bertinoro	Gestore	-	170.000,00	-	-	170.000,00	-	-	-	-	170.000,00	-100%	ID stralciato. Raggiunto obiettivo con attività manutentive rendicontate in ID 2014FCHA0094
23	2019FCHA0007	Ottimizzazione dello scolmatore "Coromano"	F	Bertinoro	Gestore	100.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-100%	L'intervento è stato realizzato nell'ambito di attività manutentive rendicontate nell'ID 2014FCHA0094, pertanto risolta la problematica
24	2019FCHA0008	Risan. sc. 36 Polenta Bertinoro	F	Bertinoro	Soc. Asset non definita	340.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	2019FCHA0009	Realizzazione rete fognaria v. Colombarone	F	Bertinoro	Unica Reti	868.000,00	135.000,00	-	135.000,00	-	-	-	-	-	135.000,00	-100%	Intervento in fase prog. def. AA non sottoscritto al 31/12/2021: i costi verranno rendicontati nell'anno di sottoscrizione dell'accordo

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Forlì-Cesena n. 9 del 28/11/2019				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
63	2019FCHA0018	Ottimizzazione del sistema fognario di Gatteo mare	F	Gatteo	Gestore	100.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-100%	Intervento di separazione delle reti, che verrà realizzato solo a valle di ordinanze di allacciamento relative alle reti già realizzate. In assenza di tali ordinanze questo ulteriore intervento di separazione non avrebbe l'efficacia ambientale prevista e pertanto al momento resta sospeso
64	2014FCHA0076	Adeg. e potenz. imhoff Teodorano-sc.6 <200ae	F	Meldola	Gestore	291.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	2014FCHA0079	Dismissione depuratore Borgo Stecchi	D	Mercato Saraceno	Gestore	165.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	2015FCHA0015	Risan. sc. loc. Ciola (<200 a.e.)	F	Mercato Saraceno	Gestore	382.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	2017FCHA0014	Nuovo serbatoio e sollev. Frati 2	A	Modigliana	Gestore	320.000,00	65.000,00	-	-	65.000,00	1.044,33	-	-	1.044,33	63.955,67	-98%	Eseguita modellazione di sistema per valutazione delle possibili soluzioni. Concluso lo studio di fattibilità e avviata la prog. def.
68	2014FCHA0083	Rinn. reti/all. acqua da PI - FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	1.404.409,38	-	-	1.404.409,38	104.409,38	8%	
69	2014FCHA0084	Rinnovo reti programmato - FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	1.561.500,00	-	-	1.561.500,00	2.133.928,15	-	-	2.133.928,15	572.428,15	37%	Maggiori esigenze di manutenzione straordinaria reti acquedottistiche
70	2014FCHA0085	Manut. stra. imp. acquedotto - FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	362.000,00	-	-	362.000,00	754.957,47	-	-	754.957,47	392.957,47	109%	Maggiori esigenze di manutenzione straordinaria impianti acquedotto
71	2014FCHA0086	Ripr. asfalti rete idrica - FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	440.000,00	-	-	440.000,00	426.590,90	-	-	426.590,90	13.409,10	-3%	
72	2014FCHA0087	Adeg.sicurezza imp.acquedotto - FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	100.000,00	-	-	100.000,00	84.827,96	-	-	84.827,96	15.172,04	-15%	
73	2014FCHA0088	Potenziamento rete acq. Borgo delle rose-Molino di sopra	A	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	545.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	2014FCHA0089	Manutenzione straordinaria impianti depurazione - FC-ATO8	D	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	1.010.000,00	-	-	1.010.000,00	2.739.235,23	-	-	2.739.235,23	1.729.235,23	171%	Maggiori esigenze di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione
75	2014FCHA0090	Adeg. sicurezza imp. dep. - FC-ATO8	D	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	150.000,00	-	-	150.000,00	63.268,04	-	-	63.268,04	86.731,96	-58%	Minori esigenze di adeguamenti alla sicurezza
76	2014FCHA0092	Rinn. reti fog. Programmato - FC-ATO8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	450.000,00	-	-	450.000,00	460.053,30	-	-	460.053,30	10.053,30	2%	
77	2014FCHA0093	Ripristini asfalti fognatura - FC-ATO8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	150.000,00	-	-	150.000,00	53.536,88	-	-	53.536,88	96.463,12	-64%	Minori esigenze di ripristini asfalti in ambito fognario
78	2014FCHA0094	Manut. stra. imp. fognatura -FC-ATO8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	380.000,00	-	-	380.000,00	282.100,07	-	-	282.100,07	97.899,93	-26%	Minori esigenze di manutenzione straordinaria sugli impianti fognari
79	2014FCHA0095	Rilievo reti fognarie - FC-ATO8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	33.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	2014FCHA0096	Potenenz. sollevamento Cesolino - 2 stralcio	F	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	551.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	2014FCHA0097	Potenz. sollevamento Cesolino - 1 stralcio	F	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	2014FCHA0098	Collettamento reflui al dep. di Baccio-Ranchio Borello	F	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	4.010.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83	2014FCHA0123	Sost. ctr pari calibro - FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	1.280.000,00	-	-	1.280.000,00	1.075.234,42	-	-	1.075.234,42	204.765,58	-16%	Minori esigenze di sostituzione contatori pari calibro
84	2014FCHA0126	Verif.e adeg.sismici imp. acq - FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.644.137,00	310.000,00	-	-	310.000,00	291.524,46	-	-	291.524,46	18.475,54	-6%	
85	2014FCHA0131	Telecontrollo e automaz .imp. acq. - FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	40.000,00	-	-	40.000,00	59.136,29	-	-	59.136,29	19.136,29	48%	Maggiori esigenze di interventi di adeguamento alla sicurezza degli impianti acquedotto
86	2014FCHA0132	Rinn. reti/all. fog. da PI - FC-ATO8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	500.000,00	-	-	500.000,00	341.542,12	-	-	341.542,12	158.457,88	-32%	Minori esigenze di manutenzione straordinaria conseguente a rotture da P.I. in ambito fognario
87	2015FCHA0016	Adeg. attrav. ferroviari - FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Intervento di natura ricorsiva con pianificazione importi annuali di larga massima. Nel 2021 non si è manifestata la necessità di intervento
88	2015FCHA0017	Recupero aree serbatoi pensili dismessi FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00	315.000,00	-	-	315.000,00	200.663,87	-	-	200.663,87	114.336,13	-36%	ID che raggruppa vari interventi di riqualificazione delle aree dei pensili con pianificazione annuale di larga massima. Nel 2021 è continuata la progettazione area pensile Casemurate e avviata area pensile Roncadello
89	2015FCHA0019	Telecontrollo e automazione impianti depurazione - FC-ATO8	D	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	15.000,00	-	-	15.000,00	54.169,46	-	-	54.169,46	39.169,46	261%	Maggiori esigenze di interventi sul sistema di telecontrollo depurazione

							Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Forlì-Cesena n. 9 del 28/11/2019				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
127	2014FCHA0121	Risan. sc. 7-33 - fraz. Alfero	F	Verghereto	Gestore	4.950.532,00	1.838.000,00	-	-	1.838.000,00	27.945,76	-	-	27.945,76	- 1.810.054,24	-98%	Scostamento legato al prolungamento delle attività autorizzative legate sia alla definizione dei numerosi accordi bonari necessari (accordo di vendita per area depuratore siglato a marzo 2021 e definizione di alcuni stralci da progetto a seguito di mancati accordi a ottobre 2021) sia agli Enti interessati (richiesta di taglio alberi e vincolo idrogeologico legati all'acquisto dell'area del depuratore)
128	2014FCHA0122	Risan. sc.9-10-11-24 - fraz. Riofreddo	F	Verghereto	Gestore	1.042.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	2015FCHA0035	Risan. sc.2-3 Verghereto	F	Verghereto	Gestore	257.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	2017FCHA0024	Ottimizzazione sistema fognario comune di Verghereto loc. Balze	F	Verghereto	Gestore	150.000,00	-	-	-	-	93.691,14	-	-	93.691,14	93.691,14	100%	Intervento concluso. Scostamento dovuto ai ritardi registrati durante l'iter autorizzativo
131	2019FCHA0036	Risan. sc. 1-15-16 Verghereto	F	Verghereto	Soc. Asset non definita	520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132	2019FCHA0037	Risan. sc. 17 Verghereto	F	Verghereto	Soc. Asset non definita	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale							22.442.884,00	1.460.000,00	6.120.000,00	14.862.884,00	17.241.677,92	1.792.455,65	3.433.409,23	12.015.813,04	83%		
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura							20.668.500,00	1.460.000,00	6.120.000,00	13.088.500,00	17.241.677,92	1.792.455,65	3.433.409,23	12.015.813,04			



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Forlì-Cesena
F.to Giuseppe Petetta

Il segretario verbalizzante
F.to Daniele Cristofori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 1 giugno 2023

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
