

CLFE/2021/6 del 1 giugno 2021

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2019**

IL COORDINATORE
F.to Daniele Garuti

CLFE/2021/1

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

L'anno **2021** il giorno 1 del mese di giugno alle ore 10.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0004841 del 27/05/2021.

Risultano presenti all'appello:

| Ente | Cognome e Nome | Qualifica | Presenti | Quote |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------|---------|
| PROVINCIA DI FERRARA | | | | 10,0000 |
| COMUNE DI ARGENTA | Borea Sauro | Assessore | SI' | 5,5003 |
| COMUNE DI BONDENO | Simone Saletti | Sindaco | SI' | 3,8924 |
| COMUNE DI CENTO | | | | 8,3853 |
| COMUNE DI CODIGORO | | | | 3,2675 |
| COMUNE DI COMACCHIO | Antonio Cardì | Assessore | SI' | 5,6183 |
| COMUNE DI COPPARO | Pagnoni Fabrizio | Sindaco | SI' | 4,3280 |
| COMUNE DI FERRARA | Balboni Alessandro | Assessore | SI' | 30,8012 |
| COMUNE DI FISCAGLIA | | | | 2,6098 |
| COMUNE DI GORO | | | | 1,3211 |
| COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA | | | | 1,1167 |
| COMUNE DI LAGOSANTO | | | | 1,5633 |
| COMUNE DI MASI TORELLO | | | | 0,9712 |
| COMUNE DI MESOLA | Gianni Michele Padovani | Sindaco | SI' | 2,0647 |
| COMUNE DI OSTELLATO | Rossi Elena | Sindaco | SI' | 1,9073 |
| COMUNE DI POGGIO RENATICO | Garuti Daniele | Sindaco | SI' | 2,6454 |
| COMUNE DI PORTOMAGGIORE | | | | 3,2208 |
| COMUNE DI RIVA DEL PO | Astolfi | Assessore | SI' | 2,3782 |
| COMUNE DI TERRE DEL RENO | Roberto Lodi | Sindaco | SI' | 2,8509 |
| COMUNE DI TRESIGNANA | Laura Perelli | Sindaco | SI' | 2,1160 |
| COMUNE DI VIGARANO MAINARDA | | | | 2,1314 |
| COMUNE DI VOGHIERA | Bandiera Dante | Assessore | SI' | 1,3101 |

Presenti n 12, quote 65.41

Assenti n 10, quote 33.59

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2019

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l'art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

premesse che:

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

considerato che:

- con deliberazione n.12 del 19 novembre 2019 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato il programma degli interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore CADF S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
 - o entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - o il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore CADF S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2019 dal Gestore risultano essere inferiori di 2.674.246 euro rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il gestore CADF s.p.a. nel periodo 2016-2019 ha costantemente realizzato minori investimenti rispetto a quelli previsti e di tale fatto si è tenuto conto nella predisposizione tariffaria per il periodo 2020-2023 di cui alla delibera CAMB/2020/50 del 16 novembre 2020, applicando una penalità per mancato rispetto della pianificazione secondo quanto previsto dal metodo tariffario MTI3 predisposto da ARERA;

ritenuto pertanto:

- di valutare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 sulla base di quanto indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti a favore n. 7 (quote 27,99), con voti contrari n. 0, astenuti n. 5 (quote 41,50);

DELIBERA

1. di non approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore CADF S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 1 del 01 giugno 2021.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2019.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 1 giugno 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara
F.to Daniele Garuti

Il segretario verbalizzante
F.to Daniele Cristofori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 gennaio 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019**

GESTORE: CADF S.P.A.

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n.5 del 16 Dicembre 2015 e aggiornato con Delibera del Consiglio locale di Ferrara n. 12 del 19 Novembre 2019, che il gestore CADF ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015. Gli importi sono al netto degli investimenti di struttura.

| | PIANIFICATO 2019 | CONSUNTIVO 2019 | DIFFERENZA | DIFFERENZA% |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| GESTORE CADF | 6'587'000 € | 3'912'754 € | 2'674'246 € | -41% |
| FONDO PERDUTO | 602'000 € | - € | 602'000 € | -100% |
| TOTALE | 7'189'000 € | 3'912'754 € | 3'276'246 € | -46% |

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore CADF abbia effettuato nel corso del 2019 investimenti decisamente inferiori rispetto al pianificato, per circa un 46 %, connessi anche, in parte, al mancato incasso dei contributi a fondo perduto.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

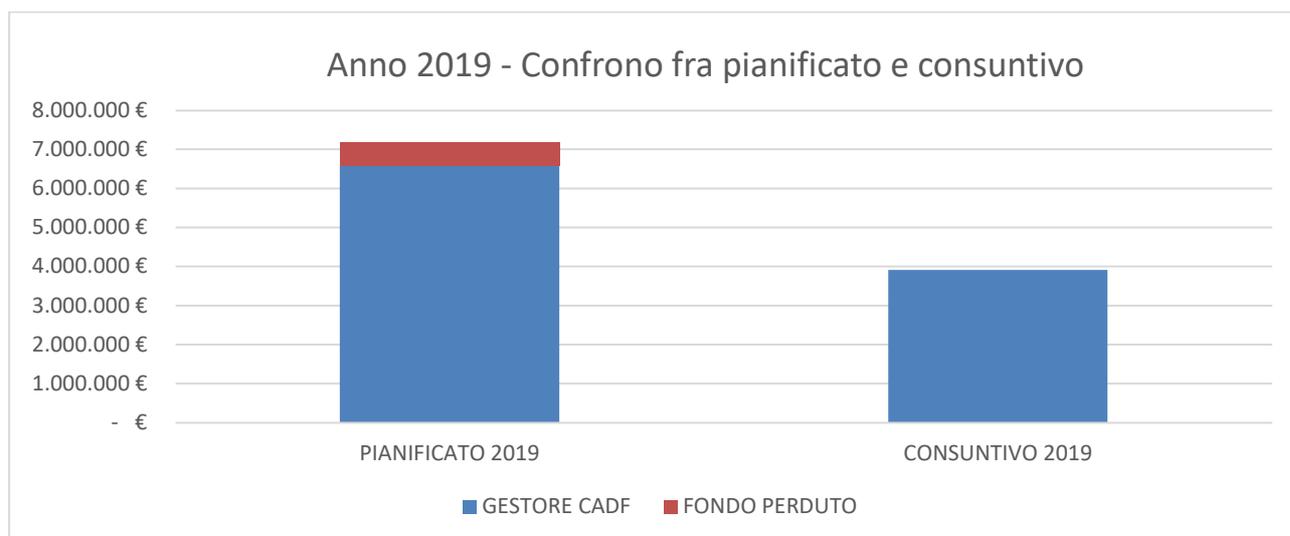


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota un sostanziale equilibrio degli investimenti fra il comparto acquedottistico e fognario depurativo, con una notevole uniformità degli scostamenti degli importi consuntivati rispetto a quelli pianificati.

| | PIANIFICATO 2019 | CONSUNTIVO 2019 | DIFFERENZA | DIFFERENZA% |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ACQUEDOTTO | 3'235'000 € | 1'767'748 € | 1'467'252 € | -45% |
| FOGNATURA | 954'000 € | 539'554 € | 414'446 € | -43% |
| DEPURAZIONE | 2'314'000 € | 1'372'857 € | 941'143 € | -41% |
| TUTTI | 686'000 € | 232'595 € | 453'405 € | -66% |
| TOTALE | 7'189'000 € | 3'912'754 € | 3'276'246 € | -46% |

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella di seguito riportata sintetizza invece lo scostamento tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato.

| COD | TIPOLOGIA | Numero | Importo Lordo Pianificato nel 2019 (€) | Importo Lordo a consuntivo nel 2019 (€) |
|-----|---|-----------|--|---|
| 1a | Interventi non avviati (scostamento pari al -100%) | 1 | 60'000 € | - € |
| 1b | Interventi non avviati dalle scorse annualità (con importo pianificato pari a 0 nel 2019) | 0 | - € | - € |
| 2a | Interventi con avvio anticipato nel 2019 (già presenti nel POI o nel Piano d'Ambito) | 0 | - € | - € |
| 2b | Chiusure di interventi già avviati contenuti nel POI o nel Piano d'Ambito | 1 | - € | 14'209 € |
| 3 | Interventi avviati nel 2019 che non erano contenuti nel Piano d'Ambito - Nuovo ID | 0 | - € | - € |
| 4 | Interventi con scostamento rendicontato rispetto al pianificato inferiore al ±20% | 24 | 5'502'000 € | 2'384'994 € |
| 5 | Interventi con scostamento rendicontato rispetto al pianificato superiore al ±20% | 10 | 1'627'000 € | 1'513'551 € |
| | TOTALE | 36 | 7'189'000 € | 3'912'754 € |

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- Il gestore nel 2019 non ha avviato 1 intervento che invece era stato programmato e per esso ha addotto le motivazioni che sono riportate all'interno dell'allegato 1 al presente documento;
- il gestore ha rendicontato nel 2019 un totale di 35 interventi (categorie 2a, 2b, 4 e 5);
- non vi sono interventi con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a) e c'è invece 1 intervento (2b) che rappresenta una "coda" di interventi già terminati e per i quali quindi il gestore in sede di programmazione non aveva imputato alcuna somma.

Inoltre si può notare come rispetto ai 36 interventi che il gestore ha rendicontato, 2/3 di questi (24 interventi, 67% del totale) abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno (4).

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi.

| | Numero | PIANIFICATO 2019 | CONSUNTIVO 2019 | DIFFERENZA | DIFFERENZA % |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Fino a 500'000 € | 16 | 1'419'000 € | 658'568 € | - 760'432 € | -54% |
| 500'000-1'000'000 € | 9 | 1'125'000 € | 912'164 € | - 212'836 € | -19% |
| 1'000'000-2'000'000 € | 4 | 870'000 € | 477'125 € | - 392'875 € | -45% |
| 2'000'000-5'000'000 € | 4 | 880'000 € | 211'809 € | - 668'191 € | -76% |
| Oltre 5'000'000 € | 1 | 955'000 € | 538'374 € | - 416'626 € | -44% |
| Manutenzioni | 2 | 1'940'000 € | 1'114'715 € | - 825'285 € | -43% |
| TOTALE | 36 | 7'189'000 € | 3'912'754 € | -3'276'246 € | -46% |

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Si nota che gli scostamenti in termini percentuali sono sostanzialmente omogenei in riferimento alle diverse classi di importo, denotando criticità sistematiche.

| Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Soggetto investitore | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2019 | Contributi pianificati 2019 | Importo netto pianificato 2019 | Importo lordo consuntivo 2019 | Contributi consuntivo 2019 | Importo netto consuntivo 2019 | Scostamentosu inv. Lordo | Scostamento % | Note giustificative |
|--------------|--|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|---|
| 2014FEFC0003 | Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di accumulo e sollevamento esistenti della rete idropotabile | ACQUEDOTTO | | Opere Pluricomunali | 1.237.672,00 € | 70.000,00 € | - € | 70.000,00 € | 63.419,67 € | - € | 63.419,67 € | - 6.580,33 € | -9 | |
| 2014FEFC0001 | Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Serravalle | ACQUEDOTTO | | Riva del Po (Berra) | 1.183.967,00 € | 280.000,00 € | - € | 280.000,00 € | 231.671,31 € | - € | 231.671,31 € | - 48.328,69 € | -17 | |
| 2014FEFC0015 | Comacchio-Lido degli Scacchi, via Plutone, rifacimento di condotta fognaria (cofinanziamento con Comune) | FOGNATURA | Comacchio | Gestore | 150.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2019FEFC0005 | Sistemazione generale impianto di Comacchio via Marina | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 130.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2017FEFC0005 | Adeguamenti normativi e verifiche impianti elettrici | TUTTI | | Opere Pluricomunali | 240.000,00 € | 180.000,00 € | - € | 180.000,00 € | 154.611,69 € | - € | 154.611,69 € | - 25.388,31 € | -14 | |
| 2018FEFC0007 | Sostituzione DN 60 in C.Am. Con PVC DE 75 per ml. 3000. Località Volania, Via Valmana - FSC scheda 12 | ACQUEDOTTO | Comacchio | Gestore | 110.000,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 2.706,26 € | - € | 2.706,26 € | - 7.293,74 € | -72 | |
| 2018FEFC0004 | Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 80 in località Brazzolo -FSC scheda 8 | ACQUEDOTTO | Tresignana (Formignana) | Gestore | 200.000,00 € | 40.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 4.400,00 € | - € | 4.400,00 € | - 35.600,00 € | -89 | A causa delle tempistiche di approvazione dei pareri degli enti interessati, nel 2019 è stata completata la progettazione. Attualmente sono in corso le fasi di gara e le opere saranno eseguite nel 2020. |
| 2015FEFC0011 | Depuratore di Comacchio: realizzazione scolmatore di prima pioggia nel canale collettore Adige | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 335.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0008 | Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S3 Loc. Lido Pomposa | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 770.000,00 € | 240.000,00 € | 160.000,00 € | 80.000,00 € | 178.200,13 € | - € | 178.200,13 € | - 61.799,87 € | -25 | L'intervento è stato ultimato nel 2019. lo scostamento è dovuto ai maggiori lavori eseguiti nell'anno 2018. |
| 2019FEFC0003 | Depuratore di Comacchio: vasca per stoccaggio fanghi | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 518.000,00 € | 25.000,00 € | - € | 25.000,00 € | 18.345,78 € | - € | 18.345,78 € | - 6.654,22 € | -26 | La progettazione è stata ultimata nel 2019. Sono in fase di espletamento la conferenza di servizi asincrona per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e la modifica non sostanziale AIA. |
| 2014FEFC0010 | Massafiscaglia, via Castagna, sostituzione condotta m 2550 | ACQUEDOTTO | Fiscaglia | Gestore | 230.000,00 € | 5.000,00 € | - € | 5.000,00 € | 19.713,27 € | - € | 19.713,27 € | 14.713,27 € | 294 | |
| 2019FEFC0001 | Depuratore di Codigoro - installazione di un nuovo sistema di essiccamento fanghi | DEPURAZIONE | Codigoro | Gestore | 210.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2019FEFC0002 | Depuratore di Copparo - installazione di un nuovo sistema di essiccamento fanghi | DEPURAZIONE | Copparo | Gestore | 260.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2018FEFC0002 | Rifacimento parte condotta di connessione tra centrali di prelievo | ACQUEDOTTO | Riva del Po (Berra) | Opere Pluricomunali | 1.200.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0020 | Verifiche sismiche centrali di potabilizzazione | ACQUEDOTTO | | Opere Pluricomunali | 150.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0005 | Porto Garibaldi: sostituzione tronco di condotta DN 700 in acciaio inox ancorato al ponte della S.S. Romea sul Canale Navigabile | FOGNATURA | Comacchio | Gestore | 800.000,00 € | 15.000,00 € | - € | 15.000,00 € | 12.489,12 € | - € | 12.489,12 € | - 2.510,88 € | -16 | |
| 2015FEFC0019 | Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario - 2° stralcio | FOGNATURA | Ro Ferrarese | Gestore | 150.000,00 € | - € | - € | - € | 14.208,94 € | - € | 14.208,94 € | 14.208,94 € | 100 | Lavori ultimati nel 2018, l'importo è relativo alle spese tecniche interne emerse in chiusura di esercizio 2019. |
| 2018FEFC0009 | Depuratore di Codigoro - installazione di un nuovo sistema di essiccamento fanghi | DEPURAZIONE | Codigoro | Gestore | 210.000,00 € | 147.000,00 € | - € | 147.000,00 € | 94.120,80 € | - € | 94.120,80 € | - 52.879,20 € | -35 | Si sono completate le operazioni di installazione delle apparecchiature a fine 2019, attualmente sono in fase di completamento le operazioni di collaudo. |
| 2019FEFC0004 | Depuratore di Comacchio: rifacimento ed efficientamento sedimentazione secondaria e ricircolo fanghi | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 570.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2017FEFC0001 | Capoluogo: depuratore: rifacimento ed efficientamento pretrattamenti e sed. primaria | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 700.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2014FEFC0013 | Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie | FOGNATURA | | Opere Pluricomunali | 2.188.708,00 € | 730.000,00 € | - € | 730.000,00 € | 436.831,12 € | - € | 436.831,12 € | - 293.168,88 € | -40 | Codice contenitore di numerosi interventi. La maggior parte caratterizzati da progettazione particolarmente complessa che ha impegnato quasi interamente il 2019 e di cui si prevede l'esecuzione nel 2020. Altri interventi hanno richiesto indagini in sito che hanno rallentato ulteriormente la progettazione spostandola ai primi mesi del 2020. |
| 2014FEFC0002 | Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Ro Ferrarese | ACQUEDOTTO | Riva del Po (Ro) | Gestore | 988.123,00 € | 540.000,00 € | - € | 540.000,00 € | 533.567,89 € | - € | 533.567,89 € | - 6.432,11 € | -1 | |
| 2019FEFC0010 | Adduttrice Serravalle - Codigoro: sostituzione di tratto di condotta in località Ariano | ACQUEDOTTO | Mesola | Gestore | 900.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2014FEFC0005 | Realizzazione punti di dosaggio del passivante Alifos LCZ sul DN 800 Ro-Collinara | ACQUEDOTTO | Migliarino | Gestore | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0015 | Sostituzione m. 1200 condotta idrica via De Bernardi e via Bonaglia 5° traversa | ACQUEDOTTO | Jolanda di Savoia | Gestore | 296.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0001 | Serravalle: revisione rete scolante del Consorzio di Bonifica, parte CADF fornitura e posa scatolare | FOGNATURA | Riva del Po (Berra) | Gestore | 307.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2014FEFC0021 | Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di Migliarino e sistema di collettamento dei reflui di Migliaro e Ostellato (*) | DEPURAZIONE | | Opere Pluricomunali | 535.872,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2014FEFC0022 | Impianto sperimentale; recupero vecchia stazione presso depuratore Codigoro | DEPURAZIONE | Codigoro | Gestore | 350.000,00 € | 192.000,00 € | - € | 192.000,00 € | 222.061,55 € | - € | 222.061,55 € | 30.061,55 € | 15 | |
| 2014FEFC0011 | Comacchio-Lido Pomposa, via Marfisa d'Este, sostituzione condotta m 650 - FSC scheda 11 | ACQUEDOTTO | Comacchio | Gestore | 190.000,00 € | 40.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 3.960,00 € | - € | 3.960,00 € | - 36.040,00 € | -90 | A causa delle tempistiche di approvazione dei pareri degli enti interessati, nel 2019 è stata completata la progettazione. Attualmente sono in corso le fasi di gara e le opere saranno eseguite nel 2020. |

| Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Soggetto investitore | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2019 | Contributi pianificati 2019 | Importo netto pianificato 2019 | Importo lordo consuntivo 2019 | Contributi consuntivo 2019 | Importo netto consuntivo 2019 | Scostamentosu inv. Lordo | Scostamento % | Note giustificative |
|--------------|--|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|---|
| 2019FEFC0009 | Copparo: sostituzione/relining di un tratto di condotta DN 500 | ACQUEDOTTO | Copparo | Gestore | 800.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2017FEFC0002 | Capoluogo: depuratore: quinta linea trattamento da 40.000 AE | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 2.900.000,00 € | 180.000,00 € | - € | 180.000,00 € | 10.132,73 € | - € | 10.132,73 € | - 169.867,27 € | -94 | Rispetto alla previsione si sono dilungati i tempi di gara per l'affidamento della progettazione che hanno portato l'avvio della progettazione stessa solamente nei primi mesi del 2020. |
| 2014FEFC0017 | Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Bonfieni ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03 | DEPURAZIONE | Copparo | Gestore | 252.500,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2017FEFC0004 | Laboratorio analisi: ammodernamento e nuove apparecchiature | TUTTI | Opere Pluricomunali | Gestore | 120.000,00 € | 60.000,00 € | - € | 60.000,00 € | 10.600,00 € | - € | 10.600,00 € | - 49.400,00 € | -82 | |
| 2019FEFC0016 | Centrale di Ro: recupero con riperforazione pozzo n.34 | ACQUEDOTTO | Riva del Po (Ro) | Gestore | 117.000,00 € | 60.000,00 € | - € | 60.000,00 € | - € | - € | - € | - 60.000,00 € | -100 | La progettazione è stata differita al 2020 in attesa della autorizzazione alla riperforazione da parte di ARPAE. |
| 2014FEFC0012 | Piano ricerca perdite. Ammodernamento contatori utenza | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 650.000,00 € | 120.000,00 € | - € | 120.000,00 € | 99.748,13 € | - € | 99.748,13 € | - 20.251,87 € | -16 | |
| 2014FEFC0009 | Formignana, via Prov.le Copparo-Migliarino, sostituzione condotta | ACQUEDOTTO | Formignana | Gestore | 288.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2019FEFC0006 | Depuratore di Comacchio: rifacimento ed efficientamento digestione anaerobica e trattamento fanghi | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 600.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2019FEFC0007 | Depuratore di Comacchio: installazione sistema di essiccamento fanghi | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 660.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | Importo caricato su lavoro errato |
| 2018FEFC0003 | Distrettualizzazione dell'intera rete acquedotto | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 200.000,00 € | 140.000,00 € | - € | 140.000,00 € | 11.112,18 € | - € | 11.112,18 € | - 128.887,82 € | -92 | Nel 2019 è stata completata la progettazione e sono stati affidati i lavori che sono stati consegnati nei primi mesi del 2020. |
| 2015FEFC0012 | Costruzione condotte di sfioro acque bianche - Canali Naviglio e Brusabò | FOGNATURA | Copparo | Gestore | 350.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2014FEFC0004 | Ristrutturazione del pensile di Comacchio | ACQUEDOTTO | Comacchio | Gestore | 670.000,00 € | 50.000,00 € | - € | 50.000,00 € | 13.873,17 € | - € | 13.873,17 € | - 36.126,83 € | -72 | La progettazione è stata ultimata nel 2019. E' in fase di espletamento la conferenza di servizi asincrona per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni. |
| 2018FEFC0006 | Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 100 in località Vaccolino SS Romea - FSC scheda 10 | ACQUEDOTTO | Comacchio | Gestore | 250.000,00 € | 30.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 13.203,04 € | - € | 13.203,04 € | - 16.796,96 € | -55 | |
| 2014FEFC0018 | Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Vallazza ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/04 | DEPURAZIONE | Copparo | Gestore | 252.500,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0018 | Recupero con riperforazione pozzo n° 2 | ACQUEDOTTO | Riva del Po (Ro) | Gestore | 123.000,00 € | - € | - € | - € | 15.860,60 € | - € | 15.860,60 € | 15.860,60 € | 100 | L'intervento è previsto nel 2021. E' stata anticipata la progettazione al fine di attivare l'iter di esproprio. |
| 2015FEFC0003 | Ricostruzione condotta di via Pambianco | FOGNATURA | Codigoro | Gestore | 100.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2014FEFC0016 | Adegamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di depurazione e sollevamenti fognari | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 6.163.758,00 € | 955.000,00 € | - € | 955.000,00 € | 538.373,68 € | - € | 538.373,68 € | - 416.626,32 € | -43 | Codice contenitore di numerosi interventi. La maggior parte caratterizzati da progettazione particolarmente complessa che ha impegnato quasi interamente il 2019 e di cui si prevede l'esecuzione nel 2020. Altri interventi hanno richiesto indagini in situ che hanno rallentato ulteriormente la progettazione spostandola ai primi mesi del 2020. |
| 2019FEFC0012 | Depuratori di Berra, Massafiscaglia, San Giovanni, Bosco Mesola, Lagosanto, Codigoro, Copparo: disinfezione con acido peracetico | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 500.000,00 € | 25.000,00 € | - € | 25.000,00 € | 4.500,00 € | - € | 4.500,00 € | - 20.500,00 € | -82 | Il progetto interessa più siti che hanno comportato un allungamento della fase progettuale. Il progetto è stato approvato all'inizio del 2020 e sono attualmente in fase di espletamento le operazioni di gara. |
| 2019FEFC0014 | Adduttrice Comacchio-Lagosanto: sostituzione intera condotta | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 820.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2014FEFC0006 | Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nella rete primaria | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 4.907.477,00 € | 1.210.000,00 € | - € | 1.210.000,00 € | 677.883,79 € | - € | 677.883,79 € | - 532.116,21 € | -43 | Codice contenitore di numerosi interventi. La maggior parte caratterizzati da progettazione particolarmente complessa che ha impegnato quasi interamente il 2019 e di cui si prevede l'esecuzione nel 2020. Altri interventi hanno richiesto indagini in situ che hanno rallentato ulteriormente la progettazione spostandola ai primi mesi del 2020. |
| 2018FEFC0001 | Interventi di rifunionalizzazione di N. 6 pozzi di emungimento utili all'ottimizzazione del funzionamento della centrale di potabilizzazione di Ro | ACQUEDOTTO | Riva del Po (Ro) | Gestore | 600.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0010 | Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S5 Loc. Porto Garibaldi Nord | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 2.560.000,00 € | 100.000,00 € | 71.000,00 € | 29.000,00 € | 84.598,35 € | - € | 84.598,35 € | - 15.401,65 € | -15 | |
| 2015FEFC0006 | Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S1 Lido Nazioni - Via Nazioni Unite | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 1.300.000,00 € | 320.000,00 € | 150.000,00 € | 170.000,00 € | 111.140,72 € | - € | 111.140,72 € | - 208.859,28 € | -65 | L'intervento è stato ultimato nel 2019. lo scostamento è dovuto ai maggiori lavori eseguiti nell'anno 2018. |
| 2015FEFC0009 | Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S4 Loc. San Giuseppe | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 530.000,00 € | 30.000,00 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 31.060,65 € | - € | 31.060,65 € | 1.060,65 € | 3 | |

| Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Soggetto investitore | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2019 | Contributi pianificati 2019 | Importo netto pianificato 2019 | Importo lordo consuntivo 2019 | Contributi consuntivo 2019 | Importo netto consuntivo 2019 | Scostamentosu inv. Lordo | Scostamento % | Note giustificative |
|---------------|---|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| 2019FEFC0011 | Impianti di sollevamento e accumulo acqua potabile: abbattimento torri | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 3.500.000,00 € | 500.000,00 € | - € | 500.000,00 € | 36.755,66 € | - € | 36.755,66 € | - 463.244,34 € | -92 | Il centro di costo è finalizzato all'adeguamento antisismico delle strutture aziendali strategiche. Riguarda quindi una serie di interventi puntuali nella maggior parte dei casi riguardanti le torri piezometriche. Per la maggior parte di esse si è deciso l'abbattimento in quanto non più necessarie e con costi di adeguamento strutturale molto alti. Nel 2019 è stata quindi riorientata la progettazione alla demolizione dovendo risolvere le problematiche collaterali di acquisizione del titolo edilizio abilitativo, disconnessione idraulica e trasloco degli impianti di telecomunicazione ospitati. Il prolungarsi della fase di progettazione degli interventi non ha consentito l'avvio dei relativi lavori. |
| 2019FEFC0015 | Ponte Albersano: sostituzione condotta idrica adduttrice e distributrice | ACQUEDOTTO | Riva del Po (Berra) | Gestore | 1.200.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0014 | Rifacimento e razionalizzazione del sistema fognario della Zona Industriale | FOGNATURA | Goro | Gestore | 1.300.000,00 € | 200.000,00 € | - € | 200.000,00 € | 70.893,09 € | - € | 70.893,09 € | - 129.106,91 € | -64 | La complessità della progettazione ha portato un dilungamento dei tempi e l'approvazione del progetto è avvenuta nell'estate 2019. I lavori sono stati avviati nel dicembre 2019. |
| 2015FEFC0013 | Modifica e potenziamento del sistema di scolo acque meteoriche - Canale Madonna a Migliarino (CADF/Consorzio Bonifica/Comune) | FOGNATURA | Massa Fiscaglia | Gestore | 150.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2019FEFC0008 | Adduttrice Copparo - Massafiscaglia: dismissione condotta e nuovi allacciamenti | ACQUEDOTTO | Copparo | Gestore | 150.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0007 | Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nor | DEPURAZIONE | Comacchio | Gestore | 2.700.000,00 € | 100.000,00 € | 71.000,00 € | 29.000,00 € | 80.322,21 € | - € | 80.322,21 € | - 19.677,79 € | -19 | |
| 2014FEFC0007 | Interventi di dettaglio sulla rete secondaria | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 40.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2014FEFC0019 | Altri interventi di adeguamento scarichi urbani ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03 | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0004 | Volania via Valmana - sostituzione DN 60 in c.am. Con PVC DE 75 ml 3.000 | ACQUEDOTTO | Comacchio | Gestore | 110.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0016 | Via Nuova Corriera - sostituzione DN 125 in c.am. Con PVC DE 140 ml 2.900 - FSC scheda 13 | ACQUEDOTTO | Mesola | Gestore | 400.000,00 € | 60.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 19.494,64 € | - € | 19.494,64 € | - 40.505,36 € | -67 | A causa delle tempistiche di approvazione dei pareri degli enti interessati, la progettazione si è dilungata. Attualmente è in fase di completamento il progetto e le opere saranno eseguite nel 2021. |
| 2018FEFC0005 | Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 250in via Poderale Rosario - FSC scheda 9 | ACQUEDOTTO | Comacchio | Gestore | 900.000,00 € | 80.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 20.378,68 € | - € | 20.378,68 € | - 59.621,32 € | -74 | A causa delle tempistiche di approvazione dei pareri degli enti interessati, la progettazione si è dilungata. Attualmente è in fase di completamento il progetto e le opere saranno eseguite nel 2021. |
| 2015FEFC0002 | Riparazione DN 600 sotto S.P. Granlinea a Corte Schiavina | ACQUEDOTTO | Codigoro | Gestore | 180.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2019FEFC0013 | Implementazione telecontrollo negli impianti di sollevamento fognari e depurazione | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 300.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2014FEFC0008 | Sostituzione ml 1.500 acquedotto Copparo-Ambrogio | ACQUEDOTTO | Copparo | Gestore | 2.288,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2015FEFC0017 | Adeguamento funzionale di due tratti fognari nell'abitato di Mesola e di Ariano | FOGNATURA | Mesola | Gestore | 55.000,00 € | 9.000,00 € | - € | 9.000,00 € | 5.131,85 € | - € | 5.131,85 € | - 3.868,15 € | -42 | Lavori ultimati nel 2018. Nel 2019 sono state completate le pratiche urbanistiche, catastali e notarili, il cui costo totale è stato inferiore a quanto previsto. Opera completata. |
| 2014FEFC0020 | Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario e nuovo depuratore | DEPURAZIONE | Ro Ferrarese | Gestore | 253.092,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2014FEFC0023 | Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di Rovereto | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 700.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2014FEFC0014 | Adeguamento funzionale e potenziamento della rete scolante delle acque bianche nell'abitato di Mesola | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | 151.673,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 | |
| 2017FEFC0003 | Acquisto di mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori | TUTTI | Opere Pluricomunali | Gestore | 446.000,00 € | 446.000,00 € | - € | 446.000,00 € | 67.383,30 € | - € | 67.383,30 € | - 378.616,70 € | -84 | Si prevedeva l'acquisto di alcuni mezzi d'opera per il servizio reti e manutenzioni impianti, che è stato effettuato nei primi mesi del 2020. |
| TOTALE | | | | | 7.189.000,00 € | 602.000,00 € | 6.587.000,00 € | 6.587.000,00 € | 3.912.754,00 € | - € | 3.912.754,00 € | - 3.276.246,00 € | | |
