

CLRA/2019/3 del 26 luglio 2019

CONSIGLIO LOCALE DI RAVENNA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2017 - Gestore HERA S.p.A.

IL COORDINATORE

F.to Antonio Bandini

CLRA/2019/3

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

L'anno **2019** il giorno 26 del mese di luglio alle ore 9.30 presso la sala del Consiglio della Provincia di Ravenna, si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato con lettera protocollo PG.AT/2019/0004490 del 10/07/2019.

Assume la presidenza il Coordinatore Antonio Bandini.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALFONSINE	GRAZIANI RICCARDO	SINDACO	SI	3,2301
BAGNACAVALLO	PRONI ELEONORA	SINDACO	SI	4,2542
BAGNARA DI ROMAGNA			NO	0,9101
BRISIGHELLA			NO	2,2465
CASOLA VALSENIO			NO	1,1623
CASTELBOLOGNESE			NO	2,4123
CERVIA	ENRICO MAZZOLANI	ASSESSORE	SI	6,5292
CONSELICE	PAOLA PULA	SINDACO	SI	2,5543
COTIGNOLA	BALDINI PIERLUCA	ASSESSORE	SI	2,1009
FAENZA	BANDINI ANTONIO	ASSESSORE	SI	12,9909
FUSIGNANO	MINGUZZI ANDREA	ASSESSORE	SI	2,2502
LUGO	DAVIDE RANALLI	SINDACO	SI	7,8591
MASSA LOMBARDA	AVVEDUTI LAURA	ASSESSORE	SI	2,4835
RAVENNA	GIANANDREA BARONCINI	ASSESSORE	SI	31,8503
RIOLO TERME	ALFONSO NICOLARDI	SINDACO	SI	1,7425
RUSSI	MIRCO FREGA	ASSESSORE	SI	2,9457
S.AGATA SUL SANTERNO	ELISA SGARAVATO	ASSESSORE	SI	0,9962
SOLAROLO	BRICCOLANI STEFANO	ASSESSORE	SI	1,4817
PROVINCIA DI RAVENNA	MICHELE DE PASCALE	SINDACO	SI	10,0000

Presenti n.15, quote 93,27

Assenti n. 4, quote 6,73

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g. Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2017 - Gestore HERA S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresses forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 1 del 12 febbraio 2016 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 il Consiglio d'ambito ha approvato, per il bacino di Ravenna, la determinazione, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 5 del 25 luglio 2017 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI; negli appositi campi previsti dal software di rendicontazione HERA ha indicato per ogni intervento compreso nella pianificazione, gli scostamenti tra gli importi degli investimenti consuntivati nel 2017 ed i rispettivi valori di programmazione e le motivazioni che hanno determinato detti scostamenti.

considerato che:

- le Linee guida succitate prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei casi ivi contemplati;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che:
 - non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi (nuovi ID) rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con deliberazione n. 1 del 12 febbraio 2016 del Consiglio locale di Ravenna ed aggiornato a seguito della deliberazione n. 5 del 25 luglio 2017 del Consiglio locale di Ravenna.
 - vi sono stati n. 25 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel Programma operativo degli interventi; di questi solo n. 2 interventi (ID 2014RAHA0031 e ID 2017RAHA0004) rappresentano degli anticipi di interventi programmati nelle annualità successive;
 - non sono stati avviati n. 23 interventi per un importo complessivo di 1.232.206 €
 - per 36 interventi si è rilevato uno scostamento superiore al + o - 20% del rendicontato rispetto al consuntivato: per tali interventi, rispetto ad un importo pianificato complessivo di 4.282.535 € l'importo complessivo consuntivato è stato di 5.950.000;
 - per 10 interventi si è rilevato uno scostamento inferiore al + o - 20% del rendicontato rispetto al consuntivato: per tali interventi, rispetto ad un importo pianificato complessivo di 5.227.643 € l'importo complessivo consuntivato è stato di 5.410.000 €
- in conseguenza delle variazioni sopracitate, dai dati presentati si evince che il volume complessivo di investimenti realizzati nell'anno 2017 è stato pari al 88,9% del volume di investimenti programmato dal piano degli interventi 2015-2019 approvato;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta, per n. 21 interventi individuati nell'allegata TAB.2 con il relativo codice identificativo, la nota prodotta dal Gestore a giustificazione dei ritardi rilevati non è stata considerata esaustiva dalla struttura tecnica di ATERSIR: per i medesimi interventi si rende pertanto necessario avviare un supplemento di istruttoria finalizzato a valutare le eventuali azioni da intraprendere nei confronti del gestore ai sensi della vigente convenzione di regolazione del servizio;

ritenuto pertanto di prendere atto:

– del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.15**, quote **93,27**, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 dal gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla struttura tecnica di ATERSIR l'incarico di svolgere un supplemento di istruttoria sui 21 interventi identificati dalla TAB.2 della relazione, allegato parte integrate della delibera, per i quali non sono state giudicate esaustive le motivazioni addotte dal gestore a giustificazione dei ritardi rilevati rispetto al cronoprogramma di pianificazione: l'approfondimento è finalizzato alla valutazione delle azioni da intraprendere nei confronti del gestore ai sensi della vigente convenzione di regolazione del Servizio Idrico.
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2017**

**GESTORE: HERA S.P.A.
SOTTOAMBITO: RAVENNA**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ravenna n. 01 del 12 Febbraio 2016 e successivamente modificato nel corso del 2017 con delibera n.ro 05 del 25 Luglio 2017, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015

	PIANIFICATO 2017		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017	
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 9.697.000	-€ 361.327	€ 9.335.673	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 40.000	-€ 40.000	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 9.657.000	-€ 321.327	€ 9.335.673	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 2.625.206	-€ 996.711	€ 1.628.495	Importo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera
TOTALE	Totale pianificato	€ 12.322.206	-€ 1.358.039	€ 10.964.167	Totale consuntivato


TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2017 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 11,0 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore HERA ha invece eseguito investimenti superiori per circa il 3,3 % rispetto al pianificato.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato alla presente relazione.

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

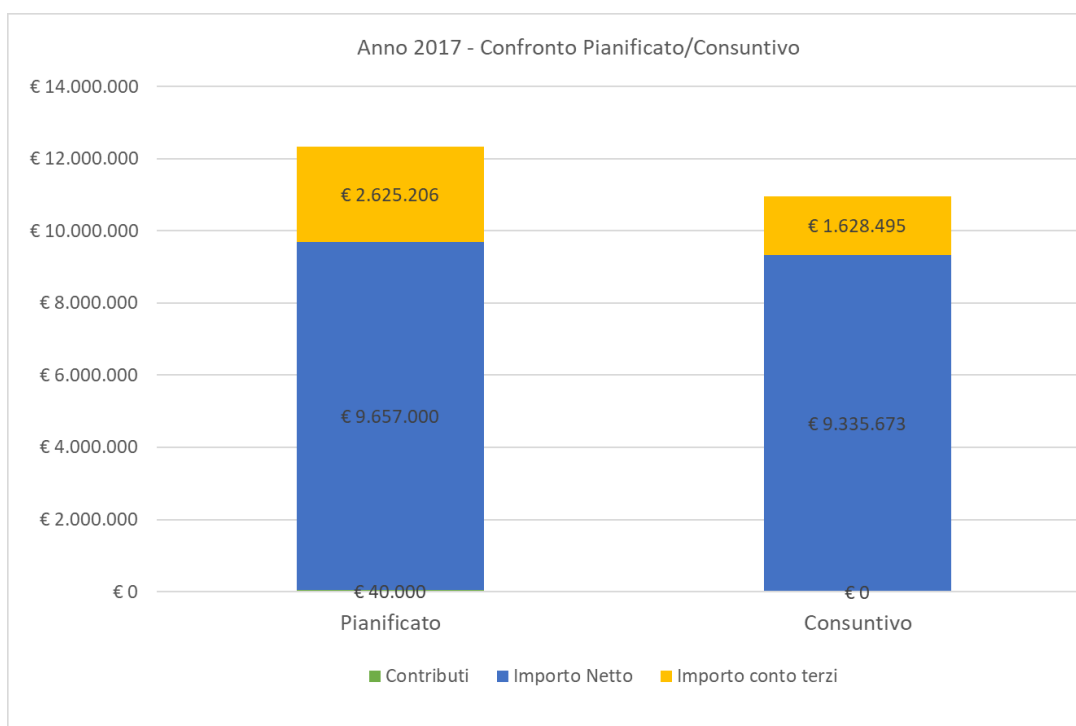

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2017 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2017*): 69

Numero di interventi rendicontati nel 2017: 71

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	23	€ 0	€ 1.232.206	14	2014RAHA0101*; 2017RAHA0017*; 2014RAHA0120*; 2017RAHA0018*; 2014RAHA0158*; 2014RAHA0159*; 2014RAHA0117*; 2014RAHA0119*; 2014RAHA0167*; 2015RAHA0003 ; 2014RAHA0048 ; 2015RAHA0008 ; 2014RAHA0063 ; 2015RAHA0011
2	Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	25	€ 1.453.989	€ 0	0	
3	Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0	
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	36	€ 4.282.535	€ 5.950.000	7	2017RAHA0001; 2015RAHA0005; 2015RAHA0006; 2014RAHA0029; 2014RAHA0043; 2014RAHA0080; 2014RAHA0130
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	10	€ 5.227.643	€ 5.140.000		GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA


TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2017 n.ro 23 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3);
- vi sono stati n.ro 25 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel Programma operativo degli interventi; di questi solo n.ro 2 interventi (ID 2014RAHA0031 e ID 2017RAHA0004) rappresentano degli anticipi di interventi programmati nelle annualità successive;
- vi sono 21 interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non è stata ritenuta esaustiva e per le quali ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere.
- In particolare ve ne sono 9 (contrassegnati con asterisco in tab. 2) per i quali la nota riporta un riferimento ad accordi non ancora sottoscritti con società degli asset e per i quali le somme realizzate nel 2017 verranno rendicontate a seguito della sottoscrizione dell'accordo; non vi è tuttavia un indicazione nella nota del reale stato di avanzamento dell'intervento;

Inoltre si può notare come rispetto agli 71 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 50 % di questi (36 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 28 % rispetto al pianificato.

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

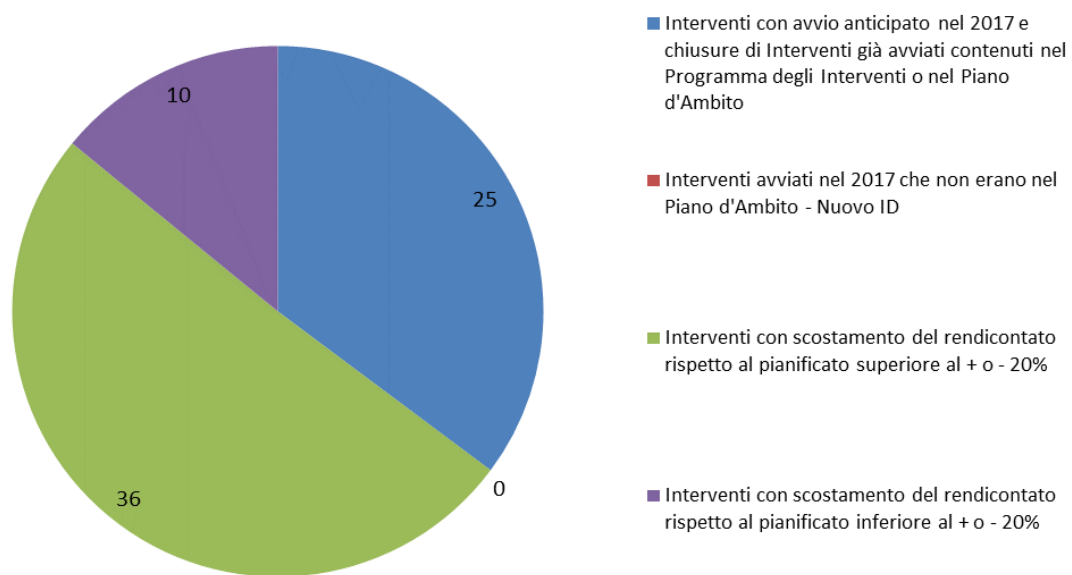

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2017 INV. LORDI
2015RAHA0001	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - ALFONSINE	FOGNATURA	Gestore	Alfonsine	5.000,00
2015RAHA0003	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VILLA VEZZANO	DEPURAZIONE	Gestore	Brisighella	10.000,00
2014RAHA0021	ADEGUAMENTO RETE FOGNA V.FRIULI	FOGNATURA	CONAMI	Brisighella	25.000,00
2014RAHA0101	SISTEMA APPROVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE -CONAMI	ACQUEDOTTO	CONAMI	Castel Bolognese	250.206,00
2014RAHA0048	MODELLAZIONE RETE FOGNARIA E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CONSELICE	FOGNATURA	Gestore	Conselice	10.000,00
2017RAHA0017	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LAVEZZOLA	DEPURAZIONE	Gestore	Conselice	5.000,00
2015RAHA0008	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - LAVEZZOLA	FOGNATURA	Gestore	Conselice	5.000,00
2014RAHA0063	COLLETTAMENTO DEPURAZIONE QUART.VIA DALPOZZO VIA BIASOLA	FOGNATURA	Romagna Acque	Faenza	182.000,00
2015RAHA0011	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	Romagna Acque	Faenza	40.000,00
2014RAHA0080	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SAN BERNARDINO	FOGNATURA	Gestore	Lugo	40.000,00
2015RAHA0024	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO - RA	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	20.000,00
2014RAHA0057	VERIFICA ADEGUAMENTO IMPIANTI ELET DIRI - ATO7	DEPURAZIONE	Gestore	Opere Pluricomunali	5.000,00
2014RAHA0120	COMPLCOND.IDRICARAVENNANORDCASALBORSETTI	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Ravenna	10.000,00
2014RAHA0123	Depuratore Ravenna - Adeguamento Linea Fanghi	DEPURAZIONE	Gestore	Ravenna	50.000,00
2017RAHA0018	REALIZZAZIONE OPERE BACINI 1 E 2 ED ALTRI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	40.000,00
2014RAHA0158	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN1 VIA CHERSO - DARSENA	FOGNATURA	Romagna Acque	Ravenna	40.000,00
2014RAHA0159	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN3 ROTONDA BELGIO - DARSENA	FOGNATURA	Romagna Acque	Ravenna	20.000,00
2014RAHA0117	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE ""CORSO NORD"" - III STRALCIO	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Ravenna	230.000,00
2017RAHA0011	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	10.000,00
2014RAHA0119	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE ""CORSO NORD""- IV STRALCIO	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Ravenna	5.000,00
2014RAHA0167	COLLETTAMENTO ZA ""MONALDINA NORD"" - I STRALCIO	FOGNATURA	Romagna Acque	Russi	190.000,00
2017RAHA0014	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RUSSI	FOGNATURA	Gestore	Russi	10.000,00
2017RAHA0015	ADEGUAMENTO FOGNATURA TRATTO MAZZARI SOLLEVAMENTO VIA GIARDINO	FOGNATURA	Gestore	Sant'Agata sul Santerno	30.000,00
				Totale	1.232.206

TAB.3 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ALLEGATO

HERA SpA

Consuntivo investimenti annualità 2017 Bacino Ex-ATO 7 Ravenna

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2017			CONSUNTIVO HERA 2017					
						PIANO ATERSIR 2017 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2017 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2017 INV. NETTI	CONS 2017 INV. LORDI	CONS 2017 CONTRIBUTI	CONS 2017 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2017
2015RAHA0001	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - ALFONSINE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Alfonsine	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	-5.000	-100%	ATTIVITA' NON AVVIATA IN QUANTO NECESSARIE VERIFICHE PRELIMINARI SULLA RETE FOGNARIA
2014RAHA0003	ADEG. SCOLMAT. V ROMA E RICOST. PARATOIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Alfonsine	0	0	0	13.531,22	0	13.531,22	13.531		INTERVENTO CONCLUSO. TRASCINAMENTO DI UNA PARTE DEL LAVORO AL 2017
2014RAHA0009	Potenziamento Rete Boncellino - Il stralcio	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Bagnacavallo	233.000,00	0	0	36.258,38	0	0	-196.742	-84%	INTERVENTO ANCORA IN CORSO DI PROGETTAZIONE CONSEQUENTE ALLA REVISIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' PRECEDENTE (NECESSITA' DI UNA RIPROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO PER LA PARTE RELATIVA ALLA POSA DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI VIA ALBERGONE. LA NUOVA IPOTESI PROGETTUALE CONCORDATA CON IL TECNICO DI RIFERIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER L'AREA DI LUGO GEOM. GADDONI, PREVEDE L'IMPIEGO DI UNA TECNOLOGIA NO-DIG CHE NON IMPLICA LAVORAZIONI/OCCUPAZIONI DELLA SEDE STRADALE PROVINCIALE). RALLENTAMENTI NELL'ITER AUTORIZZATIVO.
2017RAHA0001	OTTIMIZZAZIONE SIST. FOG. SU SCOLO REDINO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Bagnacavallo	30.000,00	0	30.000,00	1.434,82	0	1.434,82	-28.565	-95%	RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE IN QUANTO SONO NECESSARIE VERIFICHE PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA SCELTA DELLE LINEE PROGETTUALI ED ACCORDI COI PRIVATI INTERESSATI
2014RAHA0014	INSTALLAZIONE TLC-ADEGUAMENTO PRESA-SOLL.CA DEL VENTO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Bagnacavallo	0	0	0	14.214,89	0	14.214,89	14.215		INTERVENTO CONCLUSO. NEL 2015 SONO STATI NECESSARI APPROFONDIMENTI PER DEFINIRE LA REALE NECESSITA' DELL'INTERVENTO E SUCCESSIVAMENTE ANCHE LA SOLUZIONE PROGETTUALE PIU' ADEGUATA. PER TALE MOTIVO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA POSTICIPATA AL 2016. CONSEQUENTE TRASCINAMENTO DI UNA PARTE DEL LAVORO AL 2017. RISPARMI IN FASE DI LAVORO
2014RAHA0015	ADEGUAMENTO SCOLMATORE-GRIGLIA-SOLL.VIA FORMA BAGNACAVALLO	FOGNATURA		Gestore	Bagnacavallo	0	0	0	33.561,46	0	33.561,46	33.561		INTERVENTO CONCLUSO. TRASCINAMENTO DI UNA PARTE DEL LAVORO AL 2017 COME GIA' COMUNICATO NELLA NOTA 2016
2015RAHA0003	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VILLA VEZZANO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Brisighella	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-10.000	-100%	RIPIANIFICATO SULLA BASE DELLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DETTATE DALLA DGR 201/2016. INOLTRE L'INTERVENTO SARÀ SOSTITUITO DA UN COLLETTAMENTO A RIOLO TERME.
2014RAHA0021	ADEGUAMENTO RETE FOGNA V.FRIULI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	CONAMI	Brisighella	25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000	-100%	PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO RFI: RICHIESTA DI CONNESSIONE INVIATA IL 10/04/2017 POT. 37157, RFI INFORMALMENTE HA CHIESTO INTEGRAZIONI, INVIATE INTEGRAZIONI IL 27/10/2017 PROT. 104025, RFI HA INVIATO PARERE PER CONFERENZA DEI SERVIZI ATERSIR 29/05/2018 MA NON HA ANCORA INVIATO CONCESSIONE.
2014RAHA0020	MANUTENZIONE FOGNATURA IN V. EMILIANI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Brisighella	0	0	0	45.832,27	0	45.832,27	45.832		SCOSTAMENTO LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL 2016. NEL 2017 E' STATO COMPLETATO IL PRIMO TRATTO DI BONIFICA. LA PARTE RESTANTE IN ACCORDO CON COMUNE E PROVINCIA E' STATO INSERITO NELLA RIQUALIFICAZIONE MULTISERVIZI E RIPRISTINO ASFALTO PREVISTA NELL'ANNUALITA' 2018.
2015RAHA0004	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO		Gestore	Casola Valsenio	80.000,00	0	80.000,00	6.994,41	0	6.994,41	-73.006		RITARDO CAUSATO DALLA PROGETTAZIONE CHE E' RISULTATA PIU' COMPLESSA DI QUANTO PREVISTO. SI E' RESA NECESSARIA VARIANTE URBANISTICA E REGOLARIZZAZIONE AREA D' IMPIANTO ATTUALE
2015RAHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CASOLA VALSENI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Casola Valsenio	10.000,00	0	10.000,00	3.400,56	0	3.400,56	-6.599	-66%	
2014RAHA0101	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE -CONAMI	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	CONAMI	Castel Bolognese	250.206,00	0	0	0	0	0	-250.206	-100%	CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2015RAHA0006	POTENZIAMENTO RETE IDRICA MILANO MARITTIMA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Cervia	20.000,00	0	20.000,00	2.501,83	0	2.501,83	-17.498	-87%	
2014RAHA0041	BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA III LOTTO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Cervia	1.000.000,00	0	0	205.688,43	0	0	-794.312	-79%	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO DERIVANTE DAGLI SLITTAMENTI GIA' MOTIVATI NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI.
2014RAHA0029	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Cervia	85.000,00	0	85.000,00	65.814,13	0	65.814,13	-19.186	-23%	
2014RAHA0032	Adeguamento Linea Acque Imp.Elett. Dep. Cervia	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Cervia	290.000,00	0	290.000,00	206.693,11	0	206.693,11	-83.307	-29%	INTERVENTO CONCLUSO. I MAGGIORI COSTI 2017 SONO DOVUTI ALLO SLITTAMENTO DI ATTIVITA' PREVISTE NEL 2016; RALLENTAMENTO DEL CANTIERE PER ALCUNE CRITICITA' CONNESSE ALLO STATO DEI CAVIDOTTI ELETTRICI ESISTENTI. VEDI NOTA DELL'ANNUALITA' 2016. NEL COMPLESSO SI EVIDENZIANO ECONOMIE.
2017RAHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO CERVIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Cervia	150.000,00	0	150.000,00	147.247,57	0	147.247,57	-2.752	-2%	
2014RAHA0031	DEPURATORE CERVIA: AUTOMAZIONE ADEGUAMENTO LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Cervia	0	0	0	67.869,98	0	67.869,98	67.870		COME MOTIVATO NELLE NOTE 2016 L'INTERVENTO E' STATO ANTICIPATO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, STANTE LA DISPONIBILITA' ECONOMICA DETTATA DAI RITARDI DI ALCUNI INTERVENTI O RISPARMI IN FASE DI ESECUZIONE
2014RAHA0036	REALIZZAZIONE IMP.SOLLEVAMENTO FOGNARIO TANTLON-CERVIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Cervia	0	0	0	91.680,75	0	0	91.681		INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2017 E' LEGATO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI E RISULTA COERENTE CON QUANTO GIAI MOTIVATO NELLA NOTA DEL 2016.
2014RAHA0048	MODELLAZIONE RETE FOGNARIA E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CONSELICE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Conselice	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-10.000	-100%	ATTIVITA' NON AVVIATA IN QUANTO NECESSARIE VERIFICHE PRELIMINARI SULLA RETE FOGNARIA
2014RAHA0043	RICONFIGURAZIONE ALIMENTAZIONE IDRICA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Conselice	328.000,00	0	328.000,00	28.137,93	0	28.137,93	-299.862	-91%	RALLENTAMENTO DOVUTO AD UNA ANALISI DI RIVALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
2014RAHA0042	SISTEMAZIONE EDILE STRUTTURALE POTABILIZZATORE CONSELICE	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Conselice	0	0	0	78.463,02	0	78.463,02	78.463		INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO DOVUTO AL CONSOLIDAMENTO DI UNA VARIANTE
2017RAHA0017	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LAVEZZOLA	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Conselice	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	-5.000	-100%	CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2015RAHA0008	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - LAVEZZOLA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Conselice	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	-5.000	-100%	ATTIVITA' NON AVVIATA IN QUANTO NECESSARIE VERIFICHE PRELIMINARI SULLA RETE FOGNARIA
2014RAHA0052	ADEGUAMENTO SOLLEVAMENTO VIA GRILLI-RISANAMENTO VASCA E IMP.ELETTRICO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Cotignola	0	0	0	58.900,55	0	58.900,55	58.901		INTERVENTO CONCLUSO. COMPLETAMENTO LAVORI AVVIATI NEL 2016. SCOSTAMENTO CONSEQUENTE A QUANTO GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' 2016
2014RAHA0051	ADEGUAMENTO SCOLMATORE VIA VIGNE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Cotignola	0	0	0	32.164,52	0	32.164,52	32.165		INTERVENTO CONCLUSO. COMPLETAMENTO LAVORI AVVIATI NEL 2016. SCOSTAMENTO CONSEQUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' 2016
2014RAHA0053	NUOVA FOGNATURA VIA DEL RIO BARBIANO COTIGNOLA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Cotignola	0	0	0	147.839,30	0	147.839,30	147.839		MAGGIORI ONERI COMPLESSIVI IN QUANTO E' AUMENTATA LA PORZIONE DI RETE SU CUI SI E' DECISO DI INTERVENIRE RISPETTO ALL'IPOTESI INIZIALE. NEL CORSO DEI LAVORI DI BONIFICA PROGRAMMATI, AVVIATI GIA' NEL 2014-15, SI E' VERIFICATA UN'ULTERIORE ROTTURA DI UN TRATTO DI RETE SULLA QUALE SI E' DECISO DI INTERVENIRE DANDO CONTINUITA' AI LAVORI GIA' IN PRECEDENZA AVVIATI.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 3 del 26 luglio 2019

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2017 - Gestore HERA S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 26 luglio 2019

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Antonio Bandini

Il segretario verbalizzante
F.to Stefano Santandrea

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 27/08/2019

per il Direttore
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti
