



CLRE/2021/7 del 22 ottobre 2021

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2022. Approvazione consuntivo 2020.

IL COORDINATORE

Nico Giberti

CLRE/2021/7

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno **2021** il giorno **22** del mese di **ottobre** alle ore 11:30 si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera prot. PG.AT/2021/0009391 del 15/10/2021.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle *“Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”*, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

Assume la presidenza il Coordinatore Nico Giberti

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA	Nico Giberti	Sindaco	SI'	1,5851
BAGNOLO IN PIANO	Gianluca Paoli	Sindaco	SI'	1,6839
BAISO	Piccinini Vanessa	Assessore	SI'	0,7471
BIBBIANO	Andrea Carletti	Sindaco	SI'	1,7746
BORETTO			NO	1,0384
BRESCELLO			NO	1,0827
CA DEL BOSCO SOPRA			NO	1,8441
CAMPAGNOLA EMILIA	Alessandro Santachiara	Sindaco	SI'	1,0744
CAMPEGINE	Artioli Giuseppe	Sindaco	SI'	1,0150
CANOSSA			NO	0,8069
CARPINETI	Roberto Lugli	Consigliere	SI'	0,8685
CASALGRANDE			NO	3,1321
CASINA			NO	0,9242
CASTELLARANO	Giorgio Zanni	Sindaco	SI'	2,5376
CASTELNOVO MONTI			NO	1,8554
CASTELNOVO SOTTO	Francesco Monica	Sindaco	SI'	1,5599
CAVRIAGO	Francesca Bedogni	Sindaco	SI'	1,7328
CORREGGIO	Fabio Testi	Assessore	SI'	4,1013
FABBRICO	Roberto Ferrari	Sindaco	SI'	1,2627

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
GATTATICO	Luca Ronzoni	Sindaco	SI'	1,1379
GUALTIERI			NO	1,2538
GUASTALLA	Camilla Verona	Sindaco	SI'	2,5294
LUZZARA			NO	1,6499
MONTECCHIO EMILIA	Stefano Ferri	Assessore	SI'	1,8115
NOVELLARA	Elena Carletti	Sindaco	SI'	2,3210
POVIGLIO			NO	1,3174
QUATTROCASTELLA			NO	2,2355
REGGIO EMILIA	Lanfranco De Franco	Assessore	SI'	25,5927
REGGIOLO			NO	1,6575
RIO SALICETO	Lucio Malavasi	Sindaco	SI'	1,1682
ROLO	Luca Nasi	Sindaco	SI'	0,8465
RUBIERA	Emanuele Cavallaro	Sindaco	SI'	2,4723
S. MARTINO IN RIO	Paolo Fuccio	Sindaco	SI'	1,4314
S. POLO D'ENZA	Elisa Cavatorti	Assessore	SI'	1,1458
S. ILARIO D'ENZA	Carlo Perucchetti	Sindaco	SI'	1,9271
SCANDIANO	Matteo Nasciuti	Sindaco	SI'	4,0962
TOANO	Vincenzo Volpi	Sindaco	SI'	0,9123
VENTASSO			NO	0,9043
VETTO			NO	0,5206
VEZZANO SUL CROSTOLO	Mario Lugarini	Assessore	SI'	0,8741
VIANO	Nello Borghi	Sindaco	SI'	0,7430
VILLA MINOZZO			NO	0,8249
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Giorgio Zanni	Delegato Pr.le	SI'	10,0000

Presenti n. 28 quote 78,9523

Assenti n. 15 quote 21,0477



Riconosciuta la validità della seduta Nico Giberti, in qualità di Coordinatore assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2022. Approvazione consuntivo 2020.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con Deliberazione n° 5 del 30 novembre 2018 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stato approvato il Programma Operativo degli Interventi per gli anni 2019-2022 con revisione straordinaria annualità 2019, per il Gestore Iren S.p.a.;
- con deliberazione n.57 del Consiglio d'Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IREN S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato"
- la deliberazione n.75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:

- entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore Iren S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata a tutti i comuni del bacino provinciale di Reggio Emilia, in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all'annualità 2020 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2022, ai sensi della Delibera n° 75 del 12 ottobre 2017;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

rilevato inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2022 approvato per l'annualità 2020;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;

- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti a favore n. 28 (quote 78,95), resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 per il gestore Iren S.p.a. per il bacino tariffario ad esso afferente, come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 22 ottobre 2021

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2022. Approvazione consuntivo 2020.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 22 ottobre 2021

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2020
Gestore: IREN S.p.A. (RE)**

22 ottobre 2021

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 5 del 30 novembre 2018, che il gestore IREN S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

	PIANIFICATO 2020	DIFFERENZA		CONSUNTIVO 2020
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 22.561.163	+ € 7.847.625	€ 30.408.788	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributi Pianificati esclusi gli Investimenti di Struttura [B]	€ 725.060	+€ 1.027.178	€ 1.752.238	Importo Contributi a Consuntivo esclusi gli investimenti di Struttura[B]
Importo Netto Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]-[B]	€ 21.836.103	+ € 6.820.447	€ 28.656.550	Importo Netto a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura[A]-[B]

Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IREN S.p.A. abbia effettuato maggiori investimenti netti rispetto alla pianificazione approvata. Precisamente i maggiori investimenti risultano pari ad €. 7.847.625 a fronte di maggiori contributi incassati pari a + € 1.027.178.

La percentuale degli investimenti realizzati con riferimento agli importi lordi, esclusi gli investimenti di struttura, è pari a 135%.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

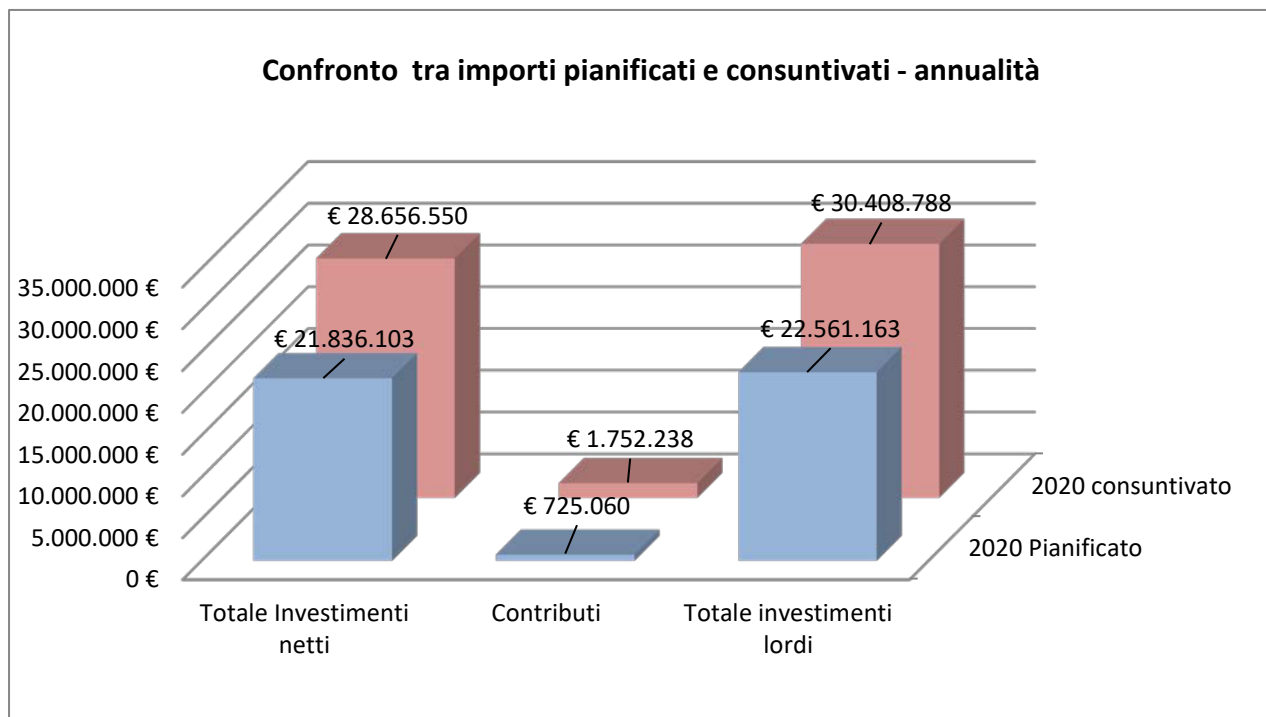


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2020 sono stati suddivisi per servizio e rappresentati graficamente come segue:

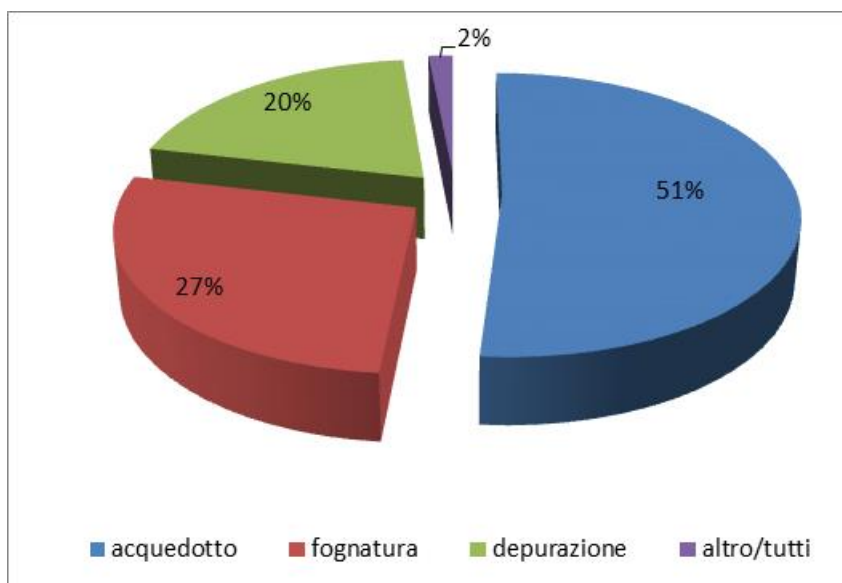


Fig.2 –Suddivisione investimenti 2020 per servizio

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppati sulla base degli scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria rapportata al totale:

Interventi non iniziati (-100%)	21
interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%)	83
Interventi con scostamento superiore a + o - 20%	15
interventi con scostamento inferiore a + o - 20%	9

Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra pianificato e quanto rendicontato

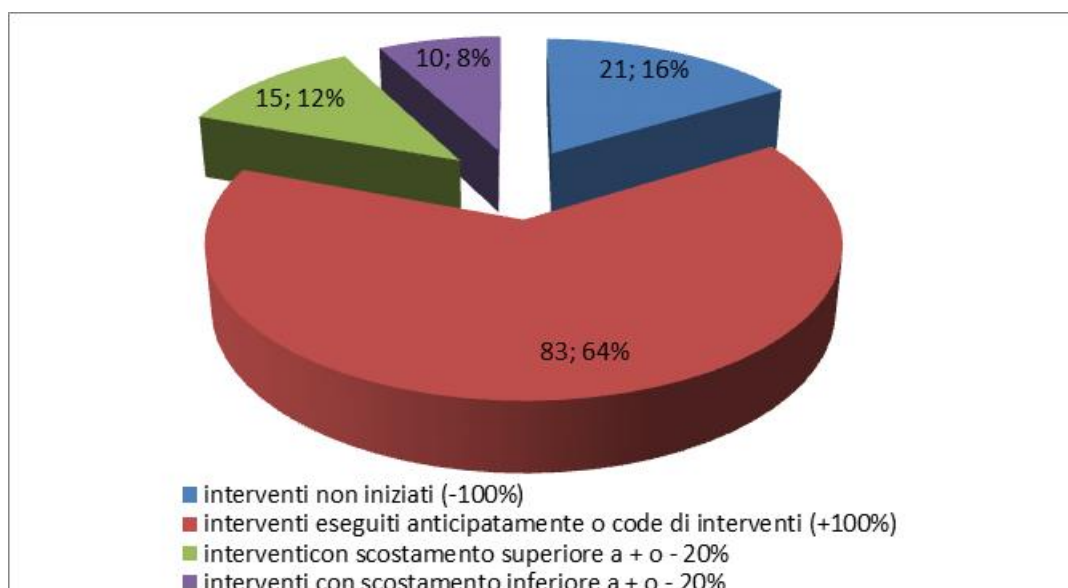


Fig.3 –Interventi realizzati nell'anno 2020 suddivisi per scostamento

Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l'annualità 2020, n.21 interventi, che erano stati programmati per complessivi €. 4.181.038, non sono stati avviati (scostamento pari a 100%), (per l'elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1). Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.83 interventi e n.15 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.10 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2020 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 46. Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2020: 129

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2020	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2020	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	21	€ 0	€ 4.181.038	NO	Vedi TAB. 4 Vedi il dettaglio in ALLEGATO 1	
Interventi con avvio anticipato nel 2020 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito (+100%)	83	€ 6.197.179	€ 0	NO	2014REIA0001 2014REIA0004 2014REIA0006 2014REIA0008 2014REIA0018 2014REIA0019 2014REIA0023 2014REIA0025 2014REIA0026 2014REIA0028 2014REIA0030 2014REIA0032 2014REIA0033 2014REIA0034 2014REIA0041 2014REIA0042 2014REIA0045 2014REIA0050 2014REIA0052 2014REIA0055 2014REIA0057 2014REIA0063 2014REIA0064 2014REIA0065 2014REIA0066 2014REIA0071 2014REIA0081 2014REIA0082 2014REIA0083 2016REIA0105 2016REIA0107 2016REIA0108 2016REIA0109 2016REIA0113 2016REIA0114	

					2016REIA0115 2016REIA0116 2016REIA0117 2016REIA0120 2016REIA0122 2016REIA0127 2016REIA0129 2016REIA0130 2016REIA0132 2016REIA0135 2016REIA0136 2016REIA0138 2016REIA0140 2016REIA0141 2016REIA0142 2016REIA0145 2017REIA0149 2017REIA0151 2017REIA0153 2017REIA0154 2017REIA0155 2017REIA0156 2017REIA0158 2017REIA0159 2017REIA0160 2017REIA0162 2017REIA0164 2017REIA0165 2017REIA0167 2018REIA0175 2018REIA0176 2018REIA0181 2018REIA0184 2018REIA0192 2018REIA0196 2018REIA0198 2018REIA0199 2018REIA0204 2018REIA0207 2018REIA0217 2018REIA0225 2018REIA0228 2018REIA0229 2018REIA0233 2018REIA0234 2018REIA0240 2018REIA0250 2018REIA0252	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	15	€ 18.089.510	€ 12.043.500	NO	2014REIA0007 2014REIA0021 2014REIA0079 2014REIA0091 2016REIA0126 2016REIA0134 2018REIA0174 2018REIA0183 2018REIA0203 2018REIA0235 2018REIA0238 2018REIA0253 2018REIA0254 2018REIA0255 2018REIA0256	

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2020	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2020	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	9	€ 6.122.099	€ 6.336.625	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 21 sintetizzati nella tabella che segue:

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020
2014REIA0073	5.8.Uspf.139 - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 3° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	182.740
2014REIA0087	5.2.25 - Estendimenti acqua in zone non servite. zone contaminate da arsenico Comuni di Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto	ACQUEDOTTO	Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto	50.000
2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fogne nere o miste	FOGNATURA	Opere pluricomunali	100.000
2016REIA0111	Nuova vasca di stoccaggio Caprara (2000 mc)	ACQUEDOTTO	Campegine	50.000
2018REIA0180	Realizzazione nuova rete adduttrice Corniano-Malamassata	ACQUEDOTTO	Bibbiano	200.000
2018REIA0182	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Tre Ponti tra Via Carrara e la linea ferroviaria in fragio all'abitato di Via Ghizzardi	FOGNATURA	Boretto	120.000
2018REIA0188	Rifacimento impianto di sollevamento in loc. Ponte Testa	FOGNATURA	Campagnola	200.000
2018REIA0190	Rifacimento tratto di rete fognaria in via Matteotti	FOGNATURA	Carpineti	100.000
2018REIA0200	Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Matilde di Canossa	FOGNATURA	Castelnovo Monti	60.000

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020
2018REIA0201	Piano Fognario - Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Rivasi Ovest	FOGNATURA	Cavriago	150.000
2018REIA0208	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Fattori nel tratto tra Via Codisotto a sera e Via Allende	FOGNATURA	Gualtieri	200.000
2018REIA0214	Piano Fognario - adeguamento condotta fognaria in Via Montegrappa	FOGNATURA	Montecchio	118.298
2018REIA0219	Potenziamento adduttrice a monte centrale idrica di Volpara	ACQUEDOTTO	Quattro Castella	250.000
2018REIA0220	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via del Casalino	FOGNATURA	Quattro Castella	100.000
2018REIA0224	Raddoppio collettore fognario in Viale Isonzo	FOGNATURA	Reggio Emilia	450.000
2018REIA0227	Realizzazione nuovo pozzo centrale idrica di Roncocesi	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	200.000
2018REIA0231	Depuratore di Mancasale: adeguamento linea di digestione anaerobica	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	700.000
2018REIA0232	Depuratore di Roncocesi: adeguamenti impiantistici diversi	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	300.000
2018REIA0236	Potenziamento impianto chimico-fisico depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	200.000
2018REIA0237	Raddoppio collettore fognario attraversamento canale Fiuma - tratto sollevamento Ponte testa - depuratore di Reggiolo	FOGNATURA	Reggiolo	250.000
2018REIA0245	Depuratore di Bosco	DEPURAZIONE	Scandiano	200.000

Tab.4 – Interventi pianificati ma non avviati

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0001	5.8.Uspf.90 - Potenziamento fognature Via Chierici e collegamento fognario e adeguamento Rio delle Muratte loc. Borzano	FOGNATURA	Albinea	0	0	0	3.552	0	3.552	100%	Intervento ultimato: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2014REIA0004	5.8.Uspf.91 - Realizzazione rete in loc. Casale	FOGNATURA	Baiso	0	0	0	32.325	0	32.325	100%	Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per ottenimento di permessi e servitù di passaggio
2014REIA0006	5.10.D15.1 5.10.D15.21 5.8.Uspf.111 - Agglomerato Boretto: potenziamento depuratore a 7500 AE	DEPURAZIONE	Boretto	0	0	0	55.954	0	55.954	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti: cantiere in corso per lavori di sistemazione dell'area e ristrutturazione del vecchio impianto
2014REIA0007	5.10.D15.12 5.10.D15.26 - Adeguamento della potenzialità del depuratore capoluogo (completamento 1° linea)	DEPURAZIONE	Brescello	700.000	0	700.000	6.424	0	6.424	-99%	Progettazione definitiva ultimata. Da definire con il Comune di Brescello iter di approvazione variazione urbanistica
2014REIA0008	5.10.D15.41 - Potenziamento impianto depurazione	DEPURAZIONE	Cadelbosco di Sopra	0	0	0	17.133	0	17.133	100%	Intervento ultimato. Coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2014REIA0010	5.8.Uspf.113 - Risanamento fognature capoluogo 1° stralcio	FOGNATURA	Campegine	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0012	5.8.Uspf.129 b - Razionalizzazione e risanamento rete fognaria in località Castello di Canossa	FOGNATURA	Canossa	0	0	0	0	0	0	0	
2014REIA0018	5.8.Uspf.94 - Ristrutturazione rete fognaria capoluogo 3° stralcio	FOGNATURA	Casalgrande	0	0	0	58	0	58	100%	Intervento sospeso: da definire con il Comune di Casalgrande se da fare. Si tratta dell'ultimo stralcio di potenziamento del reticolo del centro urbano per risolvere problemi di allagamenti. Realizzati gli stralci precedenti, non si sono più verificati problemi. L'importo di progetto è - 435.000: era previsto cofinanziamento da parte del Comune
2014REIA0019	Realizzazione di terzo pozzo S.Donnino	ACQUEDOTTO	Casalgrande	0	0	0	148.781	0	148.781	100%	Intervento ultimato: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti. In corso realizzazione impianto elettrico
2014REIA0021	5.3.36 - M.RE Barazzone 6 km DN 300 (gabellina)	ACQUEDOTTO	Casina	300.000	0	300.000	16.154	0	16.154	-94%	Progettazione conclusa, ottenute le autorizzazioni di Enti e privati ma in ritardo rispetto alla pianificazione: il cantiere partirà nella primavera 2021
2014REIA0023	5.8.Uspf.116 - Realizzazione di Nuova fossa imhoff Montebabbio (100AE)	DEPURAZIONE	Castellarano	0	0	0	155.934	0	155.934	100%	Fossa Imhoff e collettore fognario ultimati. Mancano lavori di sistemazione dell'area che si concluderanno nella primavera 2021
2014REIA0025	5.10.D15.23 - Adeguamento impianto di depurazione Rio Dorgola (2° linea acqua trattamento nutrienti ed adeguamento linea fanghi 1° stralcio)	DEPURAZIONE	Castelnuovo Monti	0	0	0	24.196	0	24.196	100%	Progettazione definitiva ultimata, in fase di ottenimento le autorizzazioni

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0026	5.10.D15.5 - Potenziamento Costa de Grassi: 2° linea	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	0	0	0	80.218	0	80.218	100%	Cantiere sospeso. In ritardo rispetto alla pianificazione per problemi geologici dovuti alla limitrofa frana quiescente che sembra essersi riattivata. Su richiesta del geologo è stato realizzato un piezometro per rilevare eventuali movimenti profondi. in attesa dell'esito del monitoraggio
2014REIA0028	5.10.D15.17 - Castelnovo ne' Monti - Rio Spirola secondario - Realizzazione nitrifiltr.+sist.esistente	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	0	0	0	219.445	0	219.445	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede l'ultimazione nella primavera 2021
2014REIA0030	5.10.D15.7 5.10.D15.14 - Meletole: Impianto di depurazione 1° e 2° Linea	DEPURAZIONE	Castelnovo di Sotto	0	0	0	87.780	0	87.780	100%	Coda di intervento pianificato per l'annualità 2016. Ad oggi intervento ultimato e impianto in esercizio. In corso alcune opere di completamento e la ristrutturazione della vecchia linea
2014REIA0031	5.8.Uspf.96 - Estendimento fognario in Via Alberici, Meletole	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0032	5.8.Uspf.117 - Estendimento fognario Via Peschiera	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	0	0	0	23.156	0	23.156	100%	Intervento concluso: realizzati i ripristini definitivi
2014REIA0033	5.8.Uspf.131 - Risanamento fognature capoluogo con interventi vari via Rivasì, via Marzabotto, via 1° Maggio, via Arduini, via Costituzione, via Spaggiari, via Grandi, Sottopasso Pianella, Via Girondola, via Guerra	FOGNATURA	Cavriago	0	0	0	21	0	21	100%	Intervento concluso: realizzati i ripristini definitivi
2014REIA0034	5.10.D15.24 - Cerreto Alpi: 400 AE biodischi	DEPURAZIONE	Collagna	0	0	0	3.295	0	3.295	100%	Progettazione in corso: individuata soluzione progettuale definitiva condivisa con il Comune di Ventasso e l'Ente Parco
2014REIA0036	5.8.Uspf.96 - Interventi pregressi Dinazzano Lemizzone 1° lotto	FOGNATURA	Correggio	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0039	5.8.Uspf.98 - Potenziamento rete fognaria capoluogo. 1° stralcio	FOGNATURA	Gualtieri	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0041	5.10.D15.19 - Impianto di depurazione Guastalla Nord: nitrifiltr.+denitrifiltr.	DEPURAZIONE	Guastalla	0	0	0	1.000	0	1.000	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0042	5.7.D11.3 - Madonna del Ficchetto: risoluzione criticità di deflusso	FOGNATURA	Guastalla	0	0	0	11.623	0	11.623	100%	Intervento ultimato: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2014REIA0043	5.8.Uspf.99 - Collegamento fognario loc. San Giacomo alla rete depurata	FOGNATURA	Guastalla	0	0	0	0	0	0	0%	

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0044	5.8.Uspf.134 - Sistemazione fognature Giarola Campo	FOGNATURA	Ligonchio	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0045	5.3.7 - Nuovo serbatoio Luzzara mc 2000	ACQUEDOTTO	Luzzara	0	0	0	1.603	0	1.603	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2014REIA0049	5.3.8 - Completamento centrale idrica	ACQUEDOTTO	Novellara	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0050	5.11.1.13 - San Bernardino: nuovo impianto biodischi 450 AE	DEPURAZIONE	Novellara	0	0	0	52.880	0	52.880	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2014REIA0051	5.7.D11.4 - Potenziamento reticolo fognario in Via Caravaggio (ex via Curie)	FOGNATURA	Novellara	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0052	5.8.Uspf.81 - Risanamento fognatura Via Nazario Sauro	FOGNATURA	Novellara	0	0	0	75.979	0	75.979	100%	Intervento ultimato: mancano ripristini definitivi
2014REIA0055	5.8.Uspf.102 - Potenziamento fognario Via Piave	FOGNATURA	Quattro Castella	0	0	0	77.282	0	77.282	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti. Ultimato impianto elettrico e ripristini definitivi. Impianto in esercizio
2014REIA0056	5.8.Uspf.83 5.8.Uspf.121 - Realizzazione collettore fognario in loc. Miscoso	FOGNATURA	Ramiseto	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0057	5.3.38 - Interconnessione acquedotti Reggio-Roncocesi: attraversamento Crostolo	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	0	0	0	19.568	0	19.568	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2014REIA0058	5.9.D13.1 - Riuso reflui Mancasale - Opere di completamento	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0061	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento digestori	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0063	U.s.p.f. - Estendimento della rete fognaria in via Beethoven da via Zamenhof a via Sidoli, nella frazione di Massenzatico	FOGNATURA	Reggio Emilia	0	0	0	151.009	0	151.009	100%	Cantiere ultimato: Realizzata fognatura e impianto di sollevamento. Manca completamento impianto elettrico
2014REIA0064	5.8.Uspf.123 + 5.5.D04.7 - Agglomerato Rame - Connessione dell'agglomerato al sistema depurato di Reggiolo	FOGNATURA	Reggiolo	0	0	0	2.175.487	0	2.175.487	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede l'ultimazione nella primavera 2021

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0065	5.10.D15.10 - Rio Saliceto: potenziamento impianto 6000 adeguamenti diversi - sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Rio Saliceto	0	0	0	26.012	0	26.012	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2014REIA0066	5.8.Uspf.85 - Potenziamento scaricatore di piena fognature del capoluogo.	FOGNATURA	Rio Saliceto	0	0	0	3.901	0	3.901	100%	Progettazione conclusa: l'intervento prevede l'adeguamento del canale di scolo in uscita dallo scolmatore principale del reticolo comunale con la posa di un condotto scatolare. Da realizzare in concomitanza ad una pista ciclabile da parte della Provincia
2014REIA0071	5.8.Uspf.125a - Realizzazione rete fognaria Via Roma Capoluogo Zona sportiva 1° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	0	0	0	223.664	0	223.664	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede l'ultimazione nella primavera 2021
2014REIA0072	5.8.Uspf.125b - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 2° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0073	5.8.Uspf.139 - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 3° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	182.740	0	182.740	0	0	0	-100%	Vedi punto precedente: è stato realizzato un unico progetto che ricomprende i 3 stralci previsti a piano
2014REIA0076	5.8.Uspf.105 - Estendimento fognario in loc. Chiozza	FOGNATURA	Scandiano	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0079	5.10.D15.29 - Potenziamento impianto 5000 AE N+D+sedimentatore II + ispessimento	DEPURAZIONE	Viano	50.000	0	50.000	555	0	555	-98%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la complessità di individuare un'adeguata soluzione progettuale per intervenire su un impianto in esercizio
2014REIA0080	5.10.D15.9 - Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	DEPURAZIONE	Viano	243.000	0	243.000	235.481	0	235.481	-3%	
2014REIA0081	5.8.Uspf.108 - Realizzazione collettore fognario in loc. Predale	FOGNATURA	Viano	0	0	0	141.965	0	141.965	100%	Cantiere ultimato: mancano ripristini definitivi e sistemazione dell'area
2014REIA0082	Costruzione di depuratore al servizio della frazione di Gazzano	DEPURAZIONE	Villaminuzzo	0	0	0	89.125	0	89.125	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede l'ultimazione nella primavera 2021
2014REIA0083	Costruzione reti di collettamento e depuratore al servizio della frazione di Carniana	FOGNATURA	Villaminuzzo	0	0	0	946	0	946	100%	Progettazione in corso: ottenimento autorizzazioni e servitù di passaggio in corso
2014REIA0085	5.4.7 - Adeguamento depuratori al D.gls 152/06 e delibere regionali - Trattamenti appropriati	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	0	0	0	0	0	0	0%	

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0086	5.4.8 - Piano fognario	FOGNATURA	Opere pluricomunali	300.000	0	300.000	315.781	0	315.781	5%	
2014REIA0087	5.2.25 - Estendimenti acqua in zone non servite. zone contaminate da arsenico Comuni di Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto	ACQUEDOTTO	Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	Nessuna richiesta di estendimento pervenuta per pozzi privati contaminati da arsenico
2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fogne nere o miste	FOGNATURA	Opere pluricomunali	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	Non sono pervenute richieste di intervento da parte dei Comuni o dai privati. Capitolo che prevede il cofinanziamento al 50% da parte dei privati
2014REIA0091	5.2.2. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. - 5.2.9. - 5.2.9. - 5.2.11. - 5.2.12. - 5.2.13 - Manutenzioni straordinarie acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	3.300.000	0	3.300.000	9.260.648	100.000	9.160.648	180%	Nel corso del 2020, sono principalmente aumentate le attività di rifacimento prese che, in caso di rottura, permettono di rinnovare completamente la derivazione dell'utente con nuova tubazione in triplo strato, operazione da preferire rispetto alla semplice riparazione. Ricompresi in questo capitolo anche quota parte degli interventi di rinnovamento delle reti ai fini della riduzione delle perdite (per ~ 496,077,10) o per concomitanza ad interventi di riqualificazione da parte dei Comuni (rifacimento pavimentazioni pregiate di piazze, marciapiedi, piste ciclabili..)
2014REIA0095	5.2.1 - Cartografia numerica acqua/fognature	TUTTI	Opere pluricomunali	330.000	0	330.000	322.164	0	322.164	-2%	
2015REIA0103	Risanamento fognario NASSETA/ACQUABONA	FOGNATURA	Collagna	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0057	Interconnessione acquedotti Reggio-Roncocesi: realizzazione condotta DN 800	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	1.000.000	0	1.000.000	1.083.481	0	1.083.481	8%	
2016REIA0058	Riuso reflui Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	0	0	0	0	802.281	-802.281	0%	
2016REIA0070	Rifacimento fognatura per acque nere in Via Luxemburg (ex via delle Valli, via Togliatti)	FOGNATURA	Rubiera	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0105	Estendimento rete fognaria in loc. Pieve Rossa, strada Provinciale Nord	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	0	0	0	3.143	0	3.143	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede l'ultimazione nella primavera 2021

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2016REIA0106	Criticità deflusso porzione urbana defluente sulla Fossetta II° lotto	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0107	Ristrutturazione rete fognaria in Via Don P. Borghi e limitrofe	FOGNATURA	Bibbiano	0	0	0	14.449	0	14.449	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2016REIA0108	Razionalizzazione sistema fognario in Via Marchesi	FOGNATURA	Boretto	0	0	0	623	0	623	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2016REIA0109	Agglomerato Busana: potenziamento impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Ventasso	0	0	0	53.996	0	53.996	100%	Progettazione in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per problematiche legate all'ottenimento di autorizzazione da parte di proprietà private limitrofe all'impianto esistente
2016REIA0110	Razionalizzazione sistema fognario in Via Zurco, Via Gabella, Via Torquato Tasso	FOGNATURA	Cadelbosco di Sopra	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0111	Nuova vasca di stoccaggio Caprara (2000 mc)	ACQUEDOTTO	Campegine	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la necessità di definire attraverso simulazioni idrauliche la capacità di stoccaggio necessaria. Effettuati sopralluoghi per fattibilità in area di tutela ambientale.
2016REIA0112	Potenziamento collettore Caprara-Meletole I°lotto	FOGNATURA	Campegine	300.000	0	300.000	287.481	0	287.481	-4%	
2016REIA0113	Depuratore di Valestra: realizzazione 2^ linea	DEPURAZIONE	Carpineti	0	0	0	23.730	0	23.730	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede l'ultimazione nel corso del 2021
2016REIA0114	Risoluzione criticità idraulica collettore di Salvaterra, loc. Villaggio Macina Dinazzano	FOGNATURA	Casalgrande	0	0	0	59.019	0	59.019	100%	Progettazione in corso: realizzati alcuni interventi urgenti per messa in sicurezza dell'area
2016REIA0115	Acquedotto di Salvaterra: potenziamento adduttrice tratto terminale DN 200	ACQUEDOTTO	Casalgrande	0	0	0	53.731	0	53.731	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2016REIA0116	Agglomerato Salvaterra: adeguamento potenzialità impianto a 27.000 - Realizzazione 4° sedimentatore e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	Casalgrande	0	0	0	104.637	0	104.637	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede l'ultimazione nel corso del 2021
2016REIA0117	Potenziamento impianto di depurazione Casina 2	DEPURAZIONE	Casina	0	0	0	43.518	0	43.518	100%	Progettazione in corso: in fase di ottenimento autorizzazioni

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2016REIA0118	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Casina	FOGNATURA	Casina	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0120	Rifacimento collettore fognario in Via De Gasperi, Via Fontanesi e Via Risorgimento in loc. Felina	FOGNATURA	Castelnovo Monti	0	0	0	316	0	316	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti, realizzati ripristini definitivi
2016REIA0121	Acquedotto Gabellina: adeguamento scarico acque controlavaggio Collagna	ACQUEDOTTO	Collagna	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0122	Potenziamento reticolo fognario in Via del Falegname	FOGNATURA	Correggio	0	0	0	38.568	0	38.568	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti, realizzati ripristini definitivi
2016REIA0125	Razionalizzazione sistema fognario in strada Barilla e limitrofe	FOGNATURA	Montecchio	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0126	Sostituzione adduttrice Novellara-Bettolino	ACQUEDOTTO	Novellara	10.000	5.000	5.000	283.174	0	283.174	2731%	Cantiere in corso: in ritardo rispetto al cronoprogramma approvato per le tempistiche di risoluzione delle interferenze con canali di bonifica in periodo irriguo
2016REIA0127	Eliminazione criticità di drenaggio area nord-est: Area Ex-Reggiane	FOGNATURA	Reggio Emilia	0	0	0	799.146	0	799.146	100%	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in annualità precedenti.
2016REIA0128	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento impiantistica	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	500.000	0	500.000	546.200	0	546.200	9%	
2016REIA0129	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	0	0	0	21.302	0	21.302	100%	Intervento da considerare unitamente al codice 2018REIA0231 - Adeguamento linea digestione anaerobica. E' stato realizzato un unico progetto da ~ 2.200.000,00. In corso di definizione le modalità di appalto dei lavori
2016REIA0130	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	0	0	0	15.860	0	15.860	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2016REIA0131	Ristrutturazione collettore fognario in Via Lungocrostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0132	Potenziamento collettore Villaggio Crostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	0	0	0	4.846	0	4.846	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2016REIA0133	Risoluzione criticità idraulica rete fognaria in loc. Pieve, Parco Buda	FOGNATURA	Reggio Emilia	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0134	Nuovo serbatoio Rubiera mc 2000	ACQUEDOTTO	Rubiera	800.000	0	800.000	48.186	0	48.186	-93%	Progettazione conclusa, rilasciato Permesso di costruire. In corso di definizione le modalità di appalto
2016REIA0135	Depuratore di Rubiera: sistemazione e potenziamento linea fanghi	DEPURAZIONE	Rubiera	0	0	0	1.304	0	1.304	100%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la complessità di individuare un'adeguata soluzione progettuale per intervenire su un impianto in esercizio
2016REIA0136	Depuratore di San Martino: potenziamento linea fanghi e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	San Martino in Rio	0	0	0	17.077	0	17.077	100%	Progettazione definitiva conclusa: in fase di ottenimento autorizzazioni
2016REIA0137	Rifacimento collettore di Arceto a monte dello scolmatore	FOGNATURA	Scandiano	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0138	Depuratore di Bosco: sistema di aerazione seconda linea	DEPURAZIONE	Scandiano	0	0	0	33.685	0	33.685	100%	Progettazione conclusa, in corso affidamento lavori. Verrà realizzato nel 2021
2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0140	Trattamenti Appropriati agglomerato <200 AE: realizzazione fossa imhoff a servizio della frazione di Pineto	DEPURAZIONE	Vetto d'enza	0	0	0	4.710	0	4.710	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2016REIA0141	Sostituzione reti idriche da serb. Faggiola a serb. M.Te Cerlino. 1° e 2° stralcio	FOGNATURA	Viano	0	0	0	230	0	230	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2016REIA0142	Trattamenti Appropriati: realizzazione depuratore a servizio della frazione di Sologno	DEPURAZIONE	Villaminozzo	0	0	0	16.761	0	16.761	100%	Progettazione definitiva conclusa: in fase di ottenimento autorizzazioni
2016REIA0144	Completamento rete fognaria in loc. Minozzo	FOGNATURA	Villaminozzo	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0145	Estendimento reti a carico di privati	TUTTI	Opere pluricomunali	0	0	0	142.684	97.700	44.984	100%	Consuntivo dei lavori realizzati nel corso del 2020. Trattandosi di richieste di privati non è stata inserita una pianificazione

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2017REIA0149	Potenziamento con spostamento dell'impianto di sollevamento fognario in Via G. di Vittorio	FOGNATURA	San Polo d'Enza	0	0	0	3.628	0	3.628	100%	Progettazione conclusa, in corso affidamento lavori. Verrà realizzato nel 2021
2017REIA0150	Rifacimento collettore fognario in Via Colletta, villaggio artigianale Crostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0151	Realizzazione collettore fognario a servizio zona industriale "Dugara"	FOGNATURA	Brescello	0	0	0	26.870	0	26.870	100%	Progettazione definitiva conclusa. L'importo delle opere ammonta a - 500.000. Da definire cofinanziamento con Comune e privati
2017REIA0153	Razionalizzazione sistema fognario in Via Bologna	FOGNATURA	Guastalla	0	0	0	1.806	0	1.806	100%	Progettazione in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione . La soluzione individuata e condivisa con il Comune è da rivedere per interferenza con la limitrofa ferrovia
2017REIA0154	Estensione rete acqua a servizio frazione di Fontana (utenze ex - AIMAG)	ACQUEDOTTO	Rubiera	0	0	0	1.003	0	1.003	100%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione del percorso della rete esistente AIMAG da dismettere. Effettuati sopralluoghi con i tecnici AIMAG per individuare tutte le utenze da ricollegare. Si potrà passare alla fase esecutiva dei lavori solo quando AIMAG avrà completato il collegamento del serbatoio pensile di Carpi e dismesso l'alimentazione esistente.
2017REIA0155	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Baiso	FOGNATURA	Baiso	0	0	0	2.839	0	2.839	100%	In corso lo studio in alcune località indicate come critiche dal Comune di Baiso: imhoff Scuole
2017REIA0156	Realizzazione collettore fognario zona industriale APEA	FOGNATURA	Boretto	0	0	0	7.759	0	7.759	100%	Progettazione definitiva conclusa. L'importo delle opere ammonta a - 900.000. Da definire cofinanziamento con Comune e privati
2017REIA0157	Acquedotto di Caprara:nuova adduttrice DN 300 da Autostrada A1 a Via Marconi	ACQUEDOTTO	Campegine	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0158	Realizzazione nuovo collettore fognario in Via De Amicis	FOGNATURA	Fabbrico	0	0	0	63.602	0	63.602	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2017REIA0159	Rifacimento fognature in concomitanza riqualificazione asse viario Corso Garibaldi-Viale Uberto I°	FOGNATURA	Reggio Emilia	0	0	0	19.250	0	19.250	100%	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in annualità precedenti.

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2017REIA0160	Realizzazione collettore fognario e impianto di sollevamento area Protezione Civile	FOGNATURA	Sant'Ilario d'Enza	0	0	0	7.541	0	7.541	100%	Progettazione esecutiva ultimata. La realizzazione dell'intervento va coordinata con le attività in corso per l'allestimento dell'area di Protezione Civile da parte del Comune di Sant'Ilario
2017REIA0161	Sostituzione rete idrica in Via della Canalina 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0162	Sostituzione rete idrica in Via Venturi	ACQUEDOTTO	Bibbiano	0	0	0	4.766	0	4.766	100%	Progettazione conclusa. Realizzazione posticipata su richiesta del Comune di Bibbiano per problemi legati alla gestione del traffico su Via Venturi in concomitanza a lavori sulla linea ferroviaria. In accordo con il Comune di Bibbiano l'intervento è pianificato per la primavera 2021
2017REIA0163	Realizzazione collegamento fognario per la dismissione Imhoff Cimitero	FOGNATURA	Ventasso	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0164	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Cereggio	DEPURAZIONE	Ventasso	0	0	0	25.063	0	25.063	100%	Progettazione definitiva conclusa. Acquisita area per realizzazione fossa Imhoff, manca una servitù per la quale non si è riusciti a raggiungere un accordo bonario con ala proprietà. D'accordo con il Comune si dovrà procedere con una servitù coattiva
2017REIA0165	Potenziamento impianto di depurazione di Canolo a 3.000 AE	DEPURAZIONE	Correggio	0	0	0	4.081	0	4.081	100%	E' stata svolta un'analisi costi/benefici per confrontare l'intervento di potenziamento dell'impianto con la possibilità di collettare i reflui al depuratore di Reggiolo, ciò comporta un importo di progetto molto più elevato di quanto previsto a piano. Occorre ripianificazione
2017REIA0166	Sostituzione rete idrica in Strada Macchione	ACQUEDOTTO	Novellara	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0167	Razionalizzazione sistema fognario in loc. Fellegara	FOGNATURA	Scandiano	0	0	0	2.180	0	2.180	100%	Progettazione definitiva conclusa. Intervento più complesso di quanto pianificato di importo - 700.000. Si procederà con l'esecutivo per il primo stralcio da - 200.000
2017REIA0168	Realizzazione reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	2.200.000	0	2.200.000	1.810.180	0	1.810.180	-17%	

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0169	ALLUVIONE LENTIGIONE - BRESCELLO 11/12/2017 - RIPRISTINO DANNI DEPURATORE	DEPURAZIONE	Brescello	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0170	ALLUVIONE LENTIGIONE - BRESCELLO 11/12/2017 - RIPRISTINO DANNI RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Brescello	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0171	"Contributi Progetto sperimentale Smart meter - comune Reggio di Emilia (rif. 2014REIA0091)"	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0172	"Contributi Progetto Smart meter - comune di Scandiano (rif 2014REIA0091)"	ACQUEDOTTO	Scandiano	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0173	"Contributi Realizzazione collettore fognario e sistemazione scarico nel Rio Moreno in Comune di Quattro Castella"	FOGNATURA	Quattro Castella	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0174	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.783.500	0	1.783.500	606.934	0	606.934	-65%	Avanzamento lavori di sostituzione contatori rallentato a causa emergenza sanitaria COVID-19
2018REIA0175	Sostituzione rete adduttrice Cà di Scatola-Canova	ACQUEDOTTO	Ventasso	0	0	0	9.816	0	9.816	100%	FONDI FSC: Cantiere in corso
2018REIA0176	Sostituzione rete acquedotto in Viale Resistenza	ACQUEDOTTO	Rubiera	0	0	0	90.714	0	90.714	100%	FONDI FSC: Cantiere in corso
2018REIA0177	Piano Fognario - Sistemazione scolmatore di piena in zona sportiva "il Poggio"	FOGNATURA	Albinea	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0178	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario tra via Malaguti - Via dei Gonzaga e Via Guido da Bagnolo- Via Gandhi	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0179	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario area industriale Via Panizzi-Via Galvani	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0180	Realizzazione nuova rete adduttrice Corniano- Malamassata	ACQUEDOTTO	Bibbiano	200.000	0	200.000	0	0	0	-100%	Progettazione in corso: importo stimato - 800.000, Importo previsto a Piano insufficiente. Da ripianificare
2018REIA0181	Estendimento rete acqua in Via Marchesi	ACQUEDOTTO	Boretto	0	0	0	1.596	0	1.596	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0182	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Tre Ponti tra Via Carrara e la linea ferroviaria in fragio all'abitato di Via Ghizzardi	FOGNATURA	Boretto	120.000	0	120.000	0	0	0	-100%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la necessità di definire la soluzione progettuale. Effettuati sopralluoghi con i tecnici del Comune per individuare correttamente le utenze interessate, da pianificare videoispezione per la verifica del reticolo esistente non corrispondente a quanto presente in cartografia
2018REIA0183	Sostituzione rete acqua adduttrice Boretto-Poviglio	ACQUEDOTTO	Boretto	300.000	0	300.000	40.104	0	40.104	-86%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per ottenimento servitù di passaggio
2018REIA0184	Estendimento rete acquedotto nella frazione di Lentigione nelle vie: Molino-Caselle, Del Porto, Viazza, Imperiale inferiore, Via Bernieri	ACQUEDOTTO	Brescello	0	0	0	9.745	0	9.745	100%	Progettazione definitiva conclusa per importo - 620.0000. Da definire eventuale cofinanziamento da parte dei privati e/o del Comune di Boretto
2018REIA0185	Depuratore di Villa Seta: riordino e revamping del comparto biologico	DEPURAZIONE	Cadelbosco di Sopra	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0186	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario misto in area industriale Madonnina	FOGNATURA	Cadelbosco di Sopra	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0188	Rifacimento impianto di sollevamento in loc. Ponte Testa	FOGNATURA	Campagnola	200.000	0	200.000	0	0	0	-100%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la complessità di individuare un'adeguata soluzione progettuale per intervenire su un impianto in esercizio e nel rispetto delle normative sui luoghi confinati
2018REIA0189	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 300-350 in loc. La Svolta - Cà Pietro	ACQUEDOTTO	Carpineti, Casina	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0190	Rifacimento tratto di rete fognaria in via Matteotti	FOGNATURA	Carpineti	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la necessità di definire la soluzione progettuale. Effettuati sopralluoghi per individuare correttamente i tratti di condotta interessati, da pianificare videoispezione per la verifica del reticolo esistente non corrispondente a quanto presente in cartografia
2018REIA0191	Depuratore di Cigarellino: potenziamento accumulo pretrattamento rifiuti liquidi (comma 3)	DEPURAZIONE	Carpineti	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0192	Piano Fognario - Intervento di messa in sicurezza fognatura in Via san Prospero	FOGNATURA	Carpineti	0	0	0	432	0	432	100%	Progettazione definitiva conclusa: in fase di ottenimento autorizzazioni

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0193	Sostituzione rete idrica in Via Statutaria	ACQUEDOTTO	Casalgrande	250.000	0	250.000	256.251	0	256.251	2%	
2018REIA0194	Sostituzione rete idrica in Via Case Secchia	ACQUEDOTTO	Casalgrande	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0195	Potenziamento impianto di San Valentino "Le Ville" e dismissione impianto san Valentino "Castello"	DEPURAZIONE	Casalgrande	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0196	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 150 in loc. Cortogno - La Stella	ACQUEDOTTO	Casina	0	0	0	316	0	316	100%	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nel 2021
2018REIA0197	Piano Fognario - Rifacimento condotta fognaria in Via Marconi	FOGNATURA	Casina	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0198	Piano Fognario - Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in Via Canalino	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	0	0	0	34.309	0	34.309	100%	Progettazione ultimata: si rende necessario separare la rete nera dal Canale di scolo in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. Ciò comporta investimenti più elevati di quanto pianificato - 500.000. Da definire il finanziamento dell'opera
2018REIA0199	Sostituzione rete idrica DN 500 in loc. Costarella, Croce	ACQUEDOTTO	Castelnovo Monti	0	0	0	182.710	0	182.710	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2018REIA0200	Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Matilde di Canossa	FOGNATURA	Castelnovo Monti	60.000	0	60.000	0	0	0	-100%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la necessità di definire la soluzione progettuale più idonea a realizzare scavi profondi in contesto urbano e viabilistico interessato dal transito di mezzi per il trasporto scolastico.
2018REIA0201	Piano Fognario - Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Rivasi Ovest	FOGNATURA	Cavriago	150.000	0	150.000	0	0	0	-100%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la necessità di definire la soluzione progettuale. Effettuati sopralluoghi per individuare correttamente i tratti di condotta interessati, da pianificare videoispezione per la verifica del reticolo esistente non corrispondente a quanto presente in cartografia
2018REIA0202	Piano Fognario - Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Arduini - Via della Conciliazione e parte di Via della Repubblica	FOGNATURA	Cavriago	0	0	0	0	0	0	0%	

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0203	Sostituzione rete idrica in Via Marzabotto	ACQUEDOTTO	Correggio	150.000	0	150.000	82.969	0	82.969	-44%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti. Manca ripristino definitivo
2018REIA0204	Sostituzione rete idrica in Via Gilberto	ACQUEDOTTO	Correggio	0	0	0	72.285	0	72.285	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti. Manca ripristino definitivo
2018REIA0205	Piano Fognario - potenziamento sistema scolante dell'area compresa tra Via Mandriolo Superiore, Via Campagnola e Piazzale I Agosto	FOGNATURA	Correggio	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0206	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario nella zona tra XXV Aprile e Via A. Moro	FOGNATURA	Fabbrico	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0207	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. Praticello	ACQUEDOTTO	Gattatico	0	0	0	3.657	0	3.657	100%	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nel 2021
2018REIA0208	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Fattori nel tratto tra Via Codisotto a sera e Via Allende	FOGNATURA	Gualtieri	200.000	0	200.000	0	0	0	-100%	Progettazione in corso: sulla base di un precedente studio idraulico, che prevedeva diversi interventi di potenziamento del reticolo urbano, sono in corso verifiche per definire le priorità di intervento e la fattibilità rispetto alle risorse economiche disponibili
2018REIA0209	Depuratore di Guastalla Sud: Potenziamento quadro elettrico e rifacimento ricircoli	DEPURAZIONE	Guastalla	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0210	Depuratore di Guastalla Nord: nuovo sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Guastalla	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0211	Piano Fognario - Potenziamento della linea fognaria in Via Viazzolo Lungo	FOGNATURA	Guastalla	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0212	Realizzazione nuovo impianto filtrazione GAC centrale idrica di Aiola	ACQUEDOTTO	Montecchio	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0213	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Galilei e Via Parri	FOGNATURA	Montecchio	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0214	Piano Fognario - adeguamento condotta fognaria in Via Montegrappa	FOGNATURA	Montecchio	118.298	0	118.298	0	0	0	-100%	Progetto di fattibilità in corso: da definire con il Comune le modalità di verifica degli allacci privati

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0215	Sostituzione adduttrice in Via Levata	ACQUEDOTTO	Novellara	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0216	Realizzazione collegamento adduttrice Via Levata - Centrale idrica Via Sturlona	ACQUEDOTTO	Novellara	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0217	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Bernardino - 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Novellara	0	0	0	15.616	0	15.616	100%	Intervento in ritardo rispetto alla pianificazione. Progettazione conclusa, problemi di ottenimento servitù per attraversamento di terreni privati. Da valutare servitù coattiva
2018REIA0218	Sostituzione rete acqua adduttrice Via Fermi - Via Zappellazzo	ACQUEDOTTO	Poviglio	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0219	Potenziamento adduttrice a monte centrale idrica di Volpara	ACQUEDOTTO	Quattro Castella	250.000	0	250.000	0	0	0	-100%	Effettuato studio di fattibilità: - 1.200.000. Importo a Piano insufficiente. Da ripianificare
2018REIA0220	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via del Casalino	FOGNATURA	Quattro Castella	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	Progetto di fattibilità in corso: da definire con il Comune le modalità di verifica degli allacci privati
2018REIA0221	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Don Milani	FOGNATURA	Quattro Castella	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0222	Sostituzione rete acqua adduttrice DN 600 in Sesso- Mancasale	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0223	Progettazione nuova rete acqua adduttrice in via Gorizia	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0224	Raddoppio collettore fognario in Viale Isonzo	FOGNATURA	Reggio Emilia	450.000	0	450.000	0	0	0	-100%	Progetto di fattibilità in corso: intervento complesso per l'attraversamento della circonvallazione cittadina
2018REIA0225	Sostituzione rete idrica in Via della Canalina 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	0	0	0	103.184	0	103.184	100%	Cantiere in corso: anticipato rispetto alla pianificazione per gestione della viabilità in accordo con il Comune di Reggio Emilia
2018REIA0226	Sostituzione rete idrica in Via F.lli Rosselli	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0227	Realizzazione nuovo pozzo centrale idrica di Roncocesi	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	200.000	0	200.000	0	0	0	-100%	In attesa di concessione alla perforazione del nuovo pozzo da parte di ARPAE SAC

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0228	Potenziamento impianto di pompaggio centrale idrica di Roncocesi	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	0	0	0	2.307	0	2.307	100%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la necessità di definire attraverso simulazioni idrauliche la potenzialità necessaria.
2018REIA0229	Razionalizzazione rete fognaria in Via del Partigiano	FOGNATURA	Reggio Emilia	0	0	0	871	0	871	100%	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione. Effettuati rilievi e videoispezioni per individuare la soluzione progettuale più idonea
2018REIA0230	Potenziamento rete fognaria in F.lli Rosselli	FOGNATURA	Reggio Emilia	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0231	Depuratore di Mancasale: adeguamento linea di digestione anaerobica	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	700.000	0	700.000	0	0	0	-100%	Progettazione esecutiva completata. Da considerare unitamente al codice 2016REIA0129: Adeguamenti tecnologici e rifacimento digestori. E' stato realizzato un unico progetto da ~ 2.200.000,00, In attesa di definizione delle modalità di appalto
2018REIA0232	Depuratore di Roncocesi: adeguamenti impiantistici diversi	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	300.000	0	300.000	0	0	0	-100%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la complessità di individuare un'adeguata soluzione progettuale per intervenire su un impianto in esercizio
2018REIA0233	Copertura vasca di equalizzazione e post ispessitori depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	0	0	0	118.038	0	118.038	100%	Cantiere in corso: completato il primo stralcio di copertura della vasca di equalizzazione, in corso il secondo stralcio di copertura dei post-ispessitori
2018REIA0234	Trattamento bottini e copertura caricamento fanghi	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	0	0	0	7.271	0	7.271	100%	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nel 2021
2018REIA0235	Adeguamento impianto di condizionamento fanghi e stoccaggio depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	400.000	0	400.000	36.233	0	36.233	-90%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la complessità di individuare un'adeguata soluzione progettuale per intervenire su un impianto in esercizio
2018REIA0236	Potenziamento impianto chimico-fisico depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	200.000	0	200.000	0	0	0	-100%	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione: in corso valutazioni sull'opportunità di realizzare l'impianto presso un depuratore più baricentrico

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0237	Raddoppio collettore fognario attraversamento canale Fiuma - tratto sollevamento Ponte testa - depuratore di Reggiolo	FOGNATURA	Reggiolo	250.000	0	250.000	0	0	0	-100%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la necessità di confrontare diverse modalità esecutive. Necessari approfondimenti geologici e geotecnici
2018REIA0238	Depuratore di Reggiolo nuovo: adeguamento, ripristino e collaudo linea fanghi	DEPURAZIONE	Reggiolo	150.000	0	150.000	1.460	0	1.460	-99%	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la complessità di individuare un'adeguata soluzione progettuale per intervenire su un impianto in esercizio
2018REIA0239	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario Area Sud centro urbano per problemi di insufficienza idraulica	FOGNATURA	Rio Saliceto	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0240	Piano Fognario - Estendimento rete fognaria nera in via Crocetta	FOGNATURA	Rolo	0	0	0	2.101	0	2.101	100%	Progettazione conclusa, in corso verifiche sugli scarichi privati in collaborazione con il Comune di Rolo
2018REIA0241	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Faustino	ACQUEDOTTO	Rubiera	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0243	Piano Fognario - Rifacimento collettore fognario in Via Primo Maggio	FOGNATURA	Sant'Ilario d'Enza	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0244	Rifacimento condotto scolmatore in Via delle Scuole	FOGNATURA	Scandiano	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0245	Depuratore di Bosco	DEPURAZIONE	Scandiano	200.000	0	200.000	0	0	0	-100%	Progettazione definitiva conclusa: in fase di ottenimento autorizzazioni
2018REIA0246	Piano Fognario - Realizzazione collettore fognario in Via del Serraglio	FOGNATURA	Scandiano	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0247	Delocalizzazione impianto di depurazione Valbona	DEPURAZIONE	Ventasso	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0248	Unificazione scarichi loc. Acquabona	DEPURAZIONE	Ventasso	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0249	Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Manenti e Via Fontanaccio	FOGNATURA	Vetto d'enza	0	0	0	0	0	0	0%	

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0250	Piano Fognario - Lavori di potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza della rete fognaria in loc. Vetto Capoluogo	FOGNATURA	Vetto d'enza	0	0	0	5.641	0	5.641	100%	Progettazione definitiva conclusa. Intervento più complesso di quanto pianificato di importo – 1.200.000. Si procederà con l'esecutivo per il primo stralcio da – 350.000
2018REIA0251	Collettamento loc. Bedogno/Case Zobbi su impianto Villaminozzo	DEPURAZIONE	Villaminozzo	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0252	Acquedotto Villa Minozzo: costruzione nuovo serbatoio in loc. Mulino di Tromba	ACQUEDOTTO	Villaminozzo	0	0	0	8.960	0	8.960	100%	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nel 2021
2018REIA0253	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	2.000.000	0	2.000.000	3.917.865	0	3.917.865	95%	Maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovuti a guasti e rotture su macchine e apparecchiature. Sono inoltre stati implementati sistemi di controllo avanzato dei comparti biologici su alcuni impianti di depurazione allo scopo di aumentare le performance sull'abbattimento di azoto e fosforo.
2018REIA0254	Manutenzione straordinaria fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali	1.400.000	0	1.400.000	3.251.122	0	3.251.122	132%	Maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria per: maggior numero di interventi a seguito di rotture causate da molti fenomeni temporaleschi di forte intensità; maggiori sostituzioni di reti ammalorate in concomitanza di lavori di riqualificazione strade/piazze da parte delle Amministrazioni comunali. Maggiori interventi di manutenzione straordinaria su impianti di sollevamento esistenti
2018REIA0255	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali	600.000	0	600.000	391.253	0	391.253	-34%	Minori necessità di interventi di manutenzione rispetto a quanto pianificato
2018REIA0256	Estendimenti acqua in zone non servite	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	100.000	0	100.000	146.428	0	146.428	46%	Questi interventi vengono attivati su richiesta di privati cittadini o Amministrazioni Comunali. Nel corso del 2020 è stata completata l'estensione della rete di acquedotto in Via Cadorna, Comune di Gattatico e realizzata l'estensione in Via Montegrappa in Comune di Quattro Castella di cui si prevede il completamento nel 2021.
2018REIA0257	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali	1.960.403	0	1.960.403	1.738.582	15.000	1.723.582	-11%	Minori investimenti trasversali rispetto al pianificato

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n. 4 del 01/04/2016, revisionato con delibera n. 10 del 19/12/2017 e n° 5 del 30/11/2018			CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0258	Nuovi Allacci	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.213.625	720.060	493.565	1.265.080	752.256	512.824	4%	
				Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investimenti di struttura	
IMPORTO TOTALE				24.521.566,00	725.060,00	23.796.506,00	32.147.369,77	1.767.237,62	30.380.132,15	135%	
IMPORTO TOTALE - Esclusi gli Investimenti di Struttura				22.561.163,00	725.060,00	21.836.103 €	30.408.788 €	1.752.238 €	28.656.550 €		



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia

Nico Giberti

Il segretario verbalizzante

Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 gennaio 2022

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
