

CLPR/2024/04 del 28 marzo 2024

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022**

IL COORDINATORE
F.to Gianluca Borghi

CLPR/2024/04

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2024** il giorno **28** del mese di **marzo** alle ore **14:00** si è riunito il Consiglio Locale di Parma, convocato con lettera Prot. 18/03/2024.0002990.U, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Gianluca Borghi. Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI PARMA				10
ALBARETO	Davide Riccoboni	Sindaco	Sì	0,5758
BARDI				0,5692
BEDONIA	Gianpaolo Serpagli	Sindaco	Sì	0,7699
BERCETO				0,5593
BORE				0,3246
BORGO VAL DI TARO				1,4068
BUSSETO				1,4245
CALESTANO				0,5742
COLLECCHIO	Roberto Dellavalle	Assessore, delegato	Sì	2,8389
COLORNO				1,8179
COMPIANO	Francesco Mariani	Sindaco	Sì	0,3942
CORNIGLIO	Giuseppe Del Sante	Sindaco	Sì	0,5175
FELINO				1,8579
FIDENZA	Franco Amigoni	Assessore, delegato	Sì	5,0655
FONTANELLATO	Corrado Modernelli	Consigliere, delegato	Sì	1,4639
FONTEVIVO				1,2124
FORNOVO DI TARO	Michela Zanetti	Sindaco	Sì	1,263
LANGHIRANO				2,1329
LESIGNANO DE' BAGNI				1,1117
MEDESANO				2,1257
MONCHIO DELLE CORTI				0,3557
MONTECHIARUGOLO				2,2112
NEVIANO DEGLI ARDUINI				0,8188
NOCETO				2,5636
PALANZANO	Ermes Boraschi	Sindaco	Sì	0,3939

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PARMA	Gianluca Borghi	Assessore, delegato	Sì	35,599
PELLEGRINO PAR.SE	Enrico Ferraroni	Consigliere, delegato	Sì	0,377
POLESINE - ZIBELLO				0,7607
ROCCABIANCA				0,7224
SALA BAGANZA	Norberto Vignali	Assessore, delegato	Sì	1,2519
SALSOMAGGIORE TERME	Michela Bonini	Assessore, delegato	Sì	3,7795
S. SECONDO PAR.SE	Francesco Ilardo	Vicesindaco, delegato	Sì	1,247
SISSA TRECASALI	Sara Tonini	Assessore, delegato	Sì	1,6113
SOLIGNANO	Thomas Villani	Assessore, delegato	Sì	0,5112
SORAGNA				1,0636
SORBOLO MEZZANI				2,4909
TERENZO				0,4124
TIZZANO VAL PARMA				0,5857
TORNOLO				0,3665
TORRILE				1,5884
TRAVERSETOLO				1,9056
VALMOZZOLA				0,2996
VARANO DE' MELEGARI				0,67
VARSI	Angelo Peracchi	Sindaco	Sì	0,4083

Presenti n. 17 quote 58,0679
Assenti n.28 quote 41,9321

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresses forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.4 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'Ambito;
- con deliberazione n.84 del Consiglio d'Ambito 21 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino tariffario di Parma, gestito da Montagna S.p.A.;
- con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d'Ambito è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito del bacino territoriale di Parma;
- con deliberazione n.14 del 03 maggio 2022 del Consiglio Locale di Parma è stata approvata la revisione del programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, del gestore Montagna 2000 S.p.A.;
- con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022, modificata dalla Delibera CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”;
- la deliberazione n. 64/2022, modificata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che:
 - entro il mese di maggio dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore Montagna 2000 S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all'annualità 2022 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;

- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2022, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;

rilevato che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2022;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022, come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti **palesi ed unanimi** resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 per il gestore Montagna 2000 S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 4 del 28 marzo 2024

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 28 marzo 2024

La Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale

Servizio Idrico Integrato
Gestore MONTAGNA 2000 S.p.A.
Sotto Ambito Parma
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2022

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo per l'annualità 2022 del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 04 del 15/01/2020, revisionato con la Deliberazione n. 14 del 03/05/2022, che il gestore Montagna 2000 ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 84/2022.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	CONS. VS PIAN.
GESTORE	1.145.728	1.336.591	190.863	117%
CONTRIBUTI FONDO PERDUTO	715.574	188.497	-527.077	26%
TOTALE	1.861.303	1.525.087	-336.216	82%

Tabella 1 - Confronto tra pianificato e rendicontato nel 2022 (esclusi gli investimenti di struttura)

Gli investimenti di struttura rendicontati per l'anno 2022 ammontano ad €. 4.964,00. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Montagna 2000, abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato attestandosi al 117% con riferimento a quelli direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è inferiore di quello pianificato e pari al 26%. Complessivamente la percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 82%.

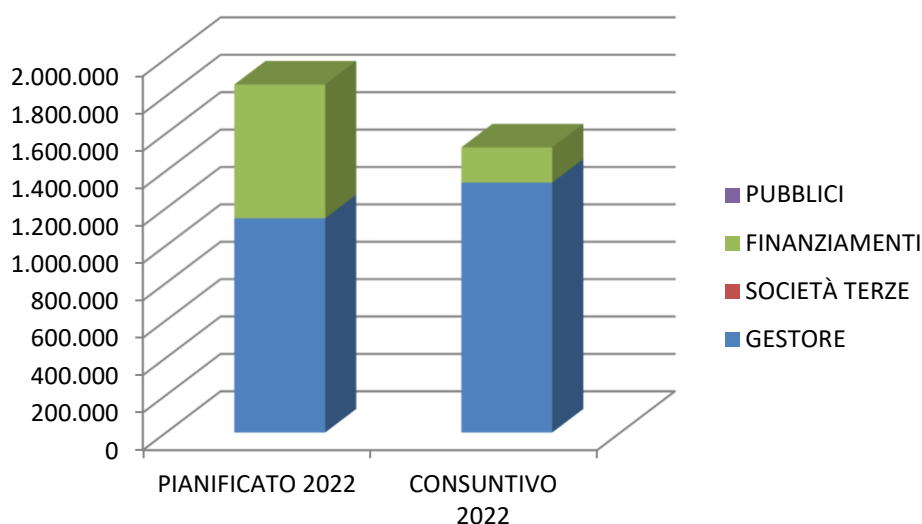


Figura 1 - Confronto tra pianificato e consuntivo 2022

I minori contributi incassati sono riferiti al mancato incasso dei contributi FSC e di quelli relativi all'emergenza idrica, per complessivi €. 633.574 pianificati, riferiti ai lavori di seguito elencati:

Codice	Titolo	Comuni	Importo progettuale
2018PRMA0108	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Farneto - FSC	Albareto	66.000
2018PRMA0109	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Faggio - FSC	Bardi	176.000
2018PRMA0110	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cagno di Gazzo -FSC	Bardi	181.500
2018PRMA0111	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Groppo Gora - FSC	Bardi	33.000
2018PRMA0112	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Gazzo - FSC	Bardi	176.000
2018PRMA0113	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Granere Vallecca - FSC	Bardi	290.000
2018PRMA0114	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cornolo - FSC	Bedonia	176.000
2018PRMA0115	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Roccamurata - FSC	Borgo Val di Taro	162.000
2018PRMA0116	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Citerna Case Bottini - FSC	Fornovo di Taro	110.000
2018PRMA0117	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Prinzerà Costa Piantonia Belvedere - FSC	Fornovo di Taro	110.000
2018PRMA0118	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Piazza - FSC	Fornovo di Taro	66.000
2018PRMA0119	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Filippi pozzo - FSC	Solignano	44.000
2018PRMA0120	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Manganini Lamberti - FSC	Varsi	93.500
2018PRMA0129	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto - FSC	Fornovo di Taro	60.000
2018PRMA0131	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto - FSC	Varano de' Melegari	30.000
2020PRMA0163	Sostituzione a adeguamento della rete idrica di distribuzione a servizio del centro storico di Pellegrino P.se Intervento in Via 1° Maggio - FSC	Pellegrino Parmense	70.000
2020PRMA0167	Rifacimento tratto condotte idriche dell'acquedotto di Monte Bosso a servizio delle località Ozzanello, La Fornace, Selva Smeralda, Case Cattani, Sivizzano e altre minori- FSC	Terenzo	243.000

2021PRMA0189	Interconnessione dell'acquedotto di Fopla con l'acquedotto di Monte Barigazzo in Loc. Costa di Fosio - Emergenza Idrica	Solignano	60.000
2021PRMA0190	Lavori sulla stazione di sollevamento di Campo del Gallo sull'acquedotto di Monte Barigazzo quale opera residuale a completamento degli interventi 2017 - Emergenza Idrica	Varsi	54.000
2021PRMA0191	Lavori residuali di interconnessione dell'acquedotto a servizio della località Brugnoli - Rugarlo a completamento degli interventi 2017 -Emergenza idrica	Bardi	25.000
2021PRMA0192	Interventi residuale sulla condotta insistente su frana in località Landino, acquedotto del capoluogo a completamento degli interventi 2017	Bardi	80.000
2021PRMA0193	Completamento dei lavori di interconnessione dell'acquedotto in località Belforte	Borgo Val di Taro	26.000
2022PRMA0200	Adeguamento alla delibera ARERA 218 del 2016 installazione contatori con telettura - FSC	Opere pluri-comunali	50.000
2023PRMA0201	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un nuovo pozzo e connessione alla rete esistente, in Loc. Castagnola	Bedonia	42.000
2023PRMA0202	Ripristino strutturale e funzionale del serbatoio "Lagacci", del relativo gruppo di rilancio acquedottistico e della condotta di mandata	Bardi, Bore	51.000
2023PRMA0203	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di nuovi pozzi Monte Bosso e nelle adiacenze pozzi Seccion	Terenzo	116.000
2023PRMA0204	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di nuovi pozzi a Poggio e Cà d'Arcangelo	Pellegrino Parmense	117.000
2023PRMA0205	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un nuovo pozzo a servizio dell'acquedotto di Fornovo, in loc. Ponte Bonazza	Fornovo di Taro	73.758
2023PRMA0206	Interventi di realizzazione di serbatoi da 5/10/20 mc a al fine di aumentare la disponibilità idropotabile	Opere pluri-comunali	60.000
2023PRMA0207	Interventi di rifornimento con autobotti al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile	Opere pluri-comunali	200.000
2023PRMA0208	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un pozzo per l'approvvigionamento idrico della Località Tintori	Solignano	94.000
2023PRMA0209	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di nuovi pozzi in località Tosca e Case Poncini a supporto dell'approvvigionamento idrico delle frazioni del Comune di Varsi	Varsi	180.000

Tabella 2- Interventi senza incasso contributo

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI


Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	CONS. VS PIAN.
ACQUEDOTTO	1290074	1063802	-226.272	82%
FOGNATURA	245000	177262	-67.738	72%
DEPURAZIONE	241228	250343	9.114	104%
ACQUE METEORICHE	5000	0	-5.000	0%
STRUTTURA	148424	4964	-143.460	3%
TUTTI	80000	33681	-46.319	42%
Totale complessivo	2009727	1530052	-479.675	76%

Tabella 3 - Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

Suddivisione per categoria di investimenti a pianificati

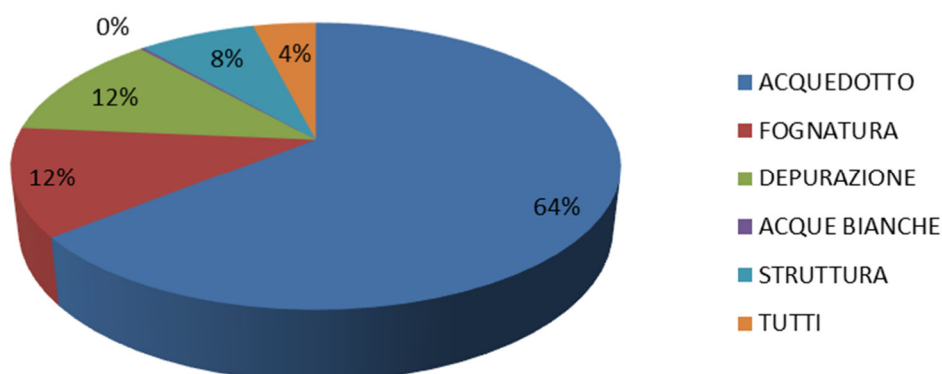

Suddivisione per categoria di investimenti consuntivati

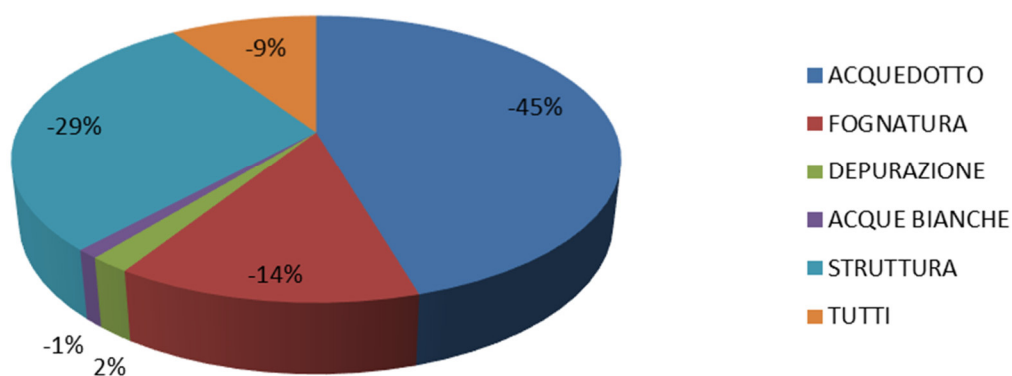


Figura 2-Suddivisione investimenti 2022 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	CONS. VS PIAN.
ACQUEDOTTO	150.000	263.068	113.068	175%
FOGNATURA	60.000	114.347	54.347	191%
DEPURAZIONE	200.000	152.022	-47.978	76%
ACQUE METEORICHE	5.000	0	-5.000	0%
TOTALE	415.000	529.437	114.437	128%

Tabella 4– Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia "acque meteoriche" ovvero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2022 è legato al fatto che non sono stati effettuati interventi.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

€.	N.	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	CONS. VS PIAN.
<i>Fino a 50.000</i>	47	217.228	153.231	-63.997,00	71%
<i>50.001-100.000</i>	39	520.340	436.192	-84.148,00	84%
<i>100.001-200.000</i>	28	604.735	276.358	-328.377,00	46%
<i>200.001-500.000</i>	12	104.000	104.910	910,00	101%
<i>500.001-1.000.000</i>	1	0	34.960	34.960,00	0%
<i>Manutenzioni e titoli cumulativi</i>	7	415.000	529.437	114.437,00	128%
TOTALE	134	1.861.303	1.525.088	-326.215,00	82%
<i>Investimenti di struttura</i>	1	148.424	4.964	-143.460,00	3%
TOTALE	135	2.009.727	1.530.052	-469.675,00	86%

Tabella 5– Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- Ritardi dovuti alla necessità di acquisire autorizzazioni, aree o servitù, per le quali si è necessario avviare il procedimento espropriativo;

- Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad altri già avviati;
- Necessità di revisione delle progettazioni;
- Ritardi causati dalla scarsa conoscenza della rete che hanno portato ad indagine aggiuntivi.

Per quanto concerne gli interventi per i quali vi sono difficoltà legate all'acquisizione di aree e/o servitù, Atersir si è resa disponibile ad avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/2006.

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 25

Numero di interventi rendicontati (importo lordo consuntivo diverso da zero) nel 2022: 52.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2022
<i>Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)</i>	13	225.000	0
<i>Interventi con avvio anticipato nel 2022 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)</i>	1	0	318.013
<i>Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%</i>	32	1.527.616	965.457
<i>Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%</i>	8	257.111	246.581

Tabella 6-Scostamenti tra il rendicontato e il pianificato

Si può notare come la maggior parte degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o - 20 %. Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

3. INTERVENTI NON AVVIATI

Di seguito l'elenco degli interventi non avviati nell'annualità 2022:

Codice	Titolo	Comuni	Importo pianificato 2022
2016PRMA0101	Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche	Opere pluricomunali	30.000
2018PRMA0109	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Faggio - FSC	Bardi	10.000
2018PRMA0110	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cagno di Gazzo -FSC	Bardi	10.000

2018PRMA0111	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Groppo Gora - FSC	Bardi	10.000
2018PRMA0112	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Gazzo - FSC	Bardi	10.000
2018PRMA0114	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cornolo - FSC	Bedonia	10.000
2018PRMA0115	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Roccamurata - FSC	Borgo Val di Taro	10.000
2018PRMA0119	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Filippi pozzo - FSC	Solignano	10.000
2018PRMA0136	Manutenzioni straordinarie acque bianche	Opere pluricomunali	5.000
2020PRMA0146	Rifacimento collettore fognario in Viale Europa e collettamento fognatura Rio Grande al depuratore del Capoluogo di Bedonia	Bedonia	70.000
2020PRMA0167	Rifacimento tratto condotte idriche dell'acquedotto di Monte Bosso a servizio delle località Ozzanello, La Fornace, Selva Smeralda, Case Cattani, Sivizzano e altre minori- FSC	Terenzo	20.000
2020PRMA0183	Adeguamento scolmatori fognari con monitoraggio delle portate e telecontrollo negli agglomerati di Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro, Bedonia e altri minori	Opere pluricomunali	5.000
2022PRMA0200	Adeguamento alla delibera ARERA 218 del 2016 installazione contatori con telettura - FSC	Opere pluricomunali	25.000

Tabella 7-Interventi non avviati

Gestore Montagna 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

Gestore Montagna 2000 S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma					Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA n. 4 del 15/01/2020, revisionato con Delibera n. 14 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	
2014PRMA0001	AL90A - Potenziamento capacità di stoccaggio serbatoio di accumulo in località Roncole di Gotra - 1° STRALCIO	ACQUEDOTTO	Albareto	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0009	3MD - Adeguamento impianto Saliceto (attualmente 1° Livello)	DEPURAZIONE	Bardi	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0015	BE115 -Nuovo impianto di trattamento reflui e collegamento alla fognatura esistente in loc. Alpe (175 A.E.)	DEPURAZIONE	Bedonia	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0027	BO131 - sostituzione e adeguamento tratti rete idrica in loc.Felloni, Castiglione,Pozzolo, Franchi , altri minori e ripristino sorgenti In loc. Pozzolo	ACQUEDOTTO	Bore	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0031	BVT101 - Potenziamento/rifacimento tratti acquedotto rurale delle Tre Fontane (ex PRIP 2011)	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	175.000	0	0	0	-53.281	53.281	0	0	0%	
2014PRMA0032	BVT102 - Completamento opere di presa acquedotto Tre Fontane e collegamento alla rete di adduzione	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0033	BVT103 - Rifacimento/estendimento collettore fognario nel Rio Varacola in loc. Costazza	FOGNATURA	Borgo Val di Taro	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0034	BVT104 - Rifacimento e messa a norma impianto di trattamento reflui in loc. Monticelli (100AE)	DEPURAZIONE	Borgo Val di Taro	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0037	BVT107 - Sistemazione reti di adduzione acquedotti	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2014PRMA0038	CO121 - Rifacimento/potenziamento tratti di rete di distribuzione di Sugremaro e Compiano Capoluogo	ACQUEDOTTO	Compiano	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0043	FDT146 - Variante alla condotta di pompaggio acquedotto del Capoluogo e alimentazione località Salita con consolidamento area serbatoi.	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0044	FDT147 - Lavori di ristrutturazione impianto sollevamento gallerie filtranti	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0045	FDT148 - Lavori di ristrutturazione depuratore del Capoluogo (II livello)	DEPURAZIONE	Fornovo di Taro	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0046	FDT149 - Lavori di ristrutturazione rete fognaria del Capoluogo	FOGNATURA	Fornovo di Taro	150.000	90.000	0	90.000	57.715	0	57.715	-32.285	-35%	In fase esecutiva si è riscontrata la necessità di effettuare il disboscamento selettivo dell'area compresa tra il piede del rilevato ferroviario e il parcheggio pubblico in misura significativamente maggiore rispetto alle previsioni di progetto, nonché la riprofilatura del canale in terra che attraversa l'area oggetto di disboscamento; tali maggiori opere hanno comportato il prolungamento delle tempistiche originariamente previste
2014PRMA0050	PP139 - Sostituzione ed adeguamento tratti rete idrica acquedotti Capoluogo, Ca' del Rengo ed altri minori	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0054	SOL159 - Ripristino sorgenti, sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotto Capoluogo, Fopla e loc. diverse	ACQUEDOTTO	Solignano	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0055	SOL160 - Lavori di ristrutturazione condotte idriche del Capoluogo	ACQUEDOTTO	Solignano	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0057	SOL162 - Lavori di miglioramento e potenziamento reti fognarie del Capoluogo	FOGNATURA	Solignano	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0060	TE65A-TE66F - Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi di Bardone	FOGNATURA	Terenzo	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2014PRMA0066	TO169 - Ristrutturazione vecchi allacciamenti utenze acquedotti in località varie	ACQUEDOTTO	Tornolo	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0070	VA72F- Lavori di costruzione rete fognaria ed impianto di trattamento reflui in loc. San Martino -La Borella (50AE), Maestri (35AE), Roncotasco (10AE) e rifacimento condotte in loc. diverse.	DEPURAZIONE	Valmazzola	137.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0074	VM134 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica e impianto di sollevamento acquedotti Capoluogo e Castagnola.	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0075	VM135 - Adeguamento e sostituzione tratti di rete idrica in Loc. Riviano, Monte Salso, Monti Alti e altre minori.	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	65.000	0	0	0	2.808	0	2.808	2.808	100%	Interventi di chiusura dei lavori avviati e rendicontati in annualità precedenti
2014PRMA0081	VAR80F-VAR82F - Lavori di costruzione impianto di trattamento reflui in loc. Lubbia di sopra e adeguamento collettori nel Capoluogo e in loc. Pontremoli - 1° STRALCIO	DEPURAZIONE	Varsi	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0084	RICA156 - Rilievi e cartografia	TUTTI	Opere pluricomunali	155.000	60.000	0	60.000	28.447	0	28.447	-31.553	-52%	Le attività di rilievo di campo sono state concentrate sulle situazioni di maggior interesse e criticità, compatibilmente alla mole di lavoro già in essere sull'area tecnica
2015PRMA0089	BSVV85A - Nuova captazione e condotta di adduzione rete idrica acquedotto ex Consorzio Monte Barigazzo loc.Monte Barigazzo Sternara	ACQUEDOTTO	Berceto, Solignano, Valmazzola, Varsi	90.000	0	0	0	70.317	0	70.317	70.317	100%	I lavori, iniziati negli anni precedenti, sono stati sospesi nell'inverno 2021 a causa delle condizioni meteorologiche e completati nel corso del 2022
2016PRMA0093	Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	465.000	24.000	0	24.000	30.101	0	30.101	6.101	25%	Nel 2022 è stato possibile completare un numero di installazioni significativamente superiori rispetto al pianificato

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2016PRMA0094	Rifacimento di un tratto di fognatura comunale danneggiata da frana a servizio dell'agglomerato di Rovina e altre reti minori dell'agglomerato Rovina e altri	ACQUEDOTTO	Bore	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRMA0097	Lavori di miglioramento e adeguamento acquedotti minori e reti di distribuzione	ACQUEDOTTO	Compiano	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRMA0098	Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200)	DEPURAZIONE	Compiano	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRMA0099	Completamento e messa in esercizio nuovo serbatoio idrico in loc. Case Tebaldi	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRMA0100	Lavori di miglioramento e potenziamento reti di adduzione e distribuzione degli acquedotti funzionali	ACQUEDOTTO	Solignano	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRMA0101	Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	350.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	-100%	Attività rinviate alle annualità successive. Tali attività sono state riprogrammate per permettere di individuare le migliori soluzioni e programmare con il dovuto anticipo le specifiche attività, la cui realizzazione è in buona parte vincolata dalle condizioni meteorologiche e dall'accessibilità dei luoghi (ambiente
2016PRMA0102	Messa a norma degli impianti elettrici e interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	200.000	160.000	0	160.000	35.945	0	35.945	-124.055	-77%	In relazione all'ingente mole di lavoro programmata, gli interventi di efficientamento sono stati concentrati sugli impianti con maggiori criticità e di maggiore interesse
2016PRMA0103	Sistemi di telecontrollo dei serbatoi, degli impianti di depurazione e delle reti idriche-fognarie	TUTTI	Opere pluricomunali	150.000	20.000	0	20.000	5.234	0	5.234	-14.766	-73%	Le procedure di progettazione e di affidamento hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate, con slittamento di parte delle attività al 2023. Tali attività sono state riprogrammate per permettere di individuare le soluzioni tecnologiche più idonee e sono state diluite nel tempo per permettere una gestione equilibrata con le attività di conduzione ordinaria di reti e impianti
2016PRMA0105	Costruzione fossa imhoff e collegamento scarichi autorizzati loc. Carniglia	DEPURAZIONE	Bedonia	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2018PRMA0108	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Farneto - FSC	ACQUEDOTTO	Albareto	66.000	0	10.000	10.000	6.250	0	6.250	-3.750	-37%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. Il ritardo nelle tempistiche esecutive è principalmente legato alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi)
2018PRMA0109	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Faggio - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	176.000	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. Il ritardo nelle tempistiche esecutive è principalmente legato alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi)
2018PRMA0110	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cogno di Gazzo - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	181.500	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. Il ritardo nelle tempistiche esecutive è principalmente legato alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi)
2018PRMA0111	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Groppo Gora - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	33.000	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. Il ritardo nelle tempistiche esecutive è principalmente legato alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi)
2018PRMA0112	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Gazzo - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	176.000	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. Il ritardo nelle tempistiche esecutive è principalmente legato alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi)
2018PRMA0113	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Granere Vallecca - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	290.000	0	10.000	10.000	5.255	0	5.255	-4.745	-47%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. Il ritardo nelle tempistiche esecutive è principalmente legato alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi)

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2018PRMA0114	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cornolo - FSC	ACQUEDOTTO	Bedonia	176.000	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. Il ritardo nelle tempistiche esecutive è principalmente legato alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi)
2018PRMA0115	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Roccamurata - FSC	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	162.000	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. Il ritardo nelle tempistiche esecutive è principalmente legato alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi)
2018PRMA0116	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Citeria Case Bottini - FSC	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	110.000	0	10.000	10.000	7.624	0	7.624	-2.376	-23%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. Il ritardo nelle tempistiche esecutive è principalmente legato alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi)
2018PRMA0117	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Prinzeria Costa Piantonia Belvedere - FSC	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	110.000	0	10.000	10.000	10.856	0	10.856	856	8%	
2018PRMA0118	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Piazza - FSC	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	66.000	0	10.000	10.000	9.176	0	9.176	-824	-8%	
2018PRMA0119	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Filippi pozzo - FSC	ACQUEDOTTO	Solignano	44.000	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. Il ritardo nelle tempistiche esecutive è principalmente legato alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi)
2018PRMA0120	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Manganini Lamberti - FSC	ACQUEDOTTO	Varsi	93.500	0	10.000	10.000	5.460	0	5.460	-4.540	-45%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. Il ritardo nelle tempistiche esecutive è principalmente legato alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi)

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2018PRMA0121	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Albareto	107.927	0	0	0	13.383	0	13.383	13.383	100%	I lavori, iniziati negli anni precedenti, sono stati completati nel corso del 2022
2018PRMA0123	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Bardi	100.000	0	0	0	83.821	0	83.821	83.821	100%	Interventi programmati per annualità precedenti ma realizzati nel 2022
2018PRMA0124	Rinnovo delle reti idriche nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Bedonia	100.000	0	0	0	-34.739	34.874	135	135	100%	Interventi di chiusura dei lavori avviati e rendicontati in annualità precedenti
2018PRMA0126	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	60.000	0	0	0	3.940	0	3.940	3.940	100%	Completati nel 2022 interventi avviati nelle annualità precedenti
2018PRMA0127	Progetto per la riduzione delle perdite delle reti di distribuzione mediante gestione e controllo delle pressioni e la distrettualizzazione delle reti	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari, Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro	180.000	0	0	0	1.560	0	1.560	1.560	100%	Gli investimenti imputati per il 2022 sono il completamento degli interventi completati negli anni precedenti
2018PRMA0128	BVT27A - Ripristino sorgenti potenziamento tratto reti acquedotti del Capoluogo e in loc. Arola - Monticelli	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PRMA0129	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto - FSC	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	60.000	12.500	12.500	25.000	2.080	0	2.080	-22.920	-91%	Interventi avviati a fine 2022 e attualmente in corso nell'annualità 2023. Il prolungamento delle tempistiche esecutive è stato principalmente legato alla limitata disponibilità degli appaltatori esterni incaricati della installazione idraulica dei misuratori e dei relativi collegamenti elettrici
2018PRMA0130	Rinnovo delle reti idriche nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	100.000	0	0	0	62.658	0	62.658	62.658	100%	Attività pianificata nel 2021 ma realizzate e concluse nel 2022
2018PRMA0131	Installazione misuratori non precedentemnte censiti e in punti nodali della rete acquedotto - FSC	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	30.000	12.500	12.500	25.000	2.080	0	2.080	-22.920	-91%	La pianificazione e organizzazione degli affidamenti (acquisto strumenti, opere idrauliche, opere elettriche, attività connesse al telecontrollo) hanno richiesto tempistiche più lunghe del previsto. Le attività di campo sono iniziate a gennaio 2023 e tutt'ora in corso

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2018PRMA0133	Manutenzione straordinaria acquedotti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		150.000	0	150.000	263.068	0	263.068	113.068	75%	Nel 2022 la scrivente ha intensificato le attività manutentive su reti e impianti al fine di prevenire e mitigare situazioni di criticità e rischi di emergenza idrica
2018PRMA0134	Manutenzioni straordinarie fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali		60.000	0	60.000	114.347	0	114.347	54.347	90%	L'attività manutentiva straordinaria sulle fognature a seguito di guasti o malfunzionamenti ha richiesto un'ingente mole di lavoro, quasi doppia rispetto al preventivato
2018PRMA0135	Manutenzione straordinaria depuratori	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000	152.022	0	152.022	-47.978	-23%	Le esigenze manutentive straordinarie sugli impianti di depurazione sono risultate inferiori al preventivato
2018PRMA0136	Manutenzioni straordinarie acque bianche	ACQUE BIANCHE	Opere pluricomunali		5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	-100%	Montagna 2000 non ha mai ricevuto dai Comuni le informazioni e indicazioni riguardanti la consistenza e stato delle infrastrutture in oggetto, e pertanto non è mai stata nelle condizioni di avviare il servizio
2018PRMA0137	* Lavori di rifacimento fognatura via Lungo Taro Imbriani	FOGNATURA	Borgo Val di Taro	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0139	Lavori di completamento fognatura di Albareto Capoluogo in loc. Tarancino e limitrofe (Agglomerato APR0036)	FOGNATURA	Albareto	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0140	Lavori di sistemazione e recupero funzionale serbatoi idrici e altri manufatti a servizio di Albareto Capoluogo, acquedotto Centro Croci e altri minori	ACQUEDOTTO	Albareto	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0141	3MD- Adeguamento impianto di trattamento Noveglia	DEPURAZIONE	Bardi	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0142	Interconnessione acquedotti frazionali nelle località Boccolo-Taverna, Monte della Madonna-Costageminiana, Rugario-Cavallare	ACQUEDOTTO	Bardi	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0143	Adeguamento e messa a norma di impianto elettrico e realizzazione di sistema di controllo torbidità acqua in località Cà Ratti	ACQUEDOTTO	Bardi	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2020PRMA0144	Realizzazione di nuovo sghiaiatore/dissabbiatore in testa all'impianto di depurazione di Bardi capoluogo	DEPURAZIONE	Bardi	45.000	0	0	0	39.359	0	39.359	39.359	100%	I lavori, iniziati negli anni precedenti, sono stati completati nel corso del 2022
2020PRMA0146	Rifacimento collettore fognario in Viale Europa e collettamento fognatura Rio Grande al depuratore del Capoluogo di Bedonia	FOGNATURA	Bedonia	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-70.000	-100%	I lavori sono stati posticipati al 2023 in relazione a problematiche di intervento della ditta affidataria e per evitare di creare disagi nei mesi invernali
2020PRMA0147	Lavori di messa in sicurezza e recupero funzionale opere di captazione sorgenti in loc. Monti altre prese a servizio degli acquedotti frazionali	ACQUEDOTTO	Bedonia	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0148	Lavori di adeguamento fase di sedimentazione del depuratore di Bedonia Capoluogo	DEPURAZIONE	Bedonia	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0149	Adeguamento agglomerati < 200 a.e. mediante realizzazione di impianti di trattamento appropriati sugli agglomerati minori o interconnessioni con quelli maggiori. (1° STRALCIO): Anzola A, Piane di Carniglia, Romezzano, Masanti di Sopra, altri minori	DEPURAZIONE	Bedonia	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0150	Adeguamento agglomerati < 200 a.e. mediante realizzazione di impianti di trattamento appropriati sugli agglomerati minori o interconnessioni con quelli maggiori: Zermani e altri minori	DEPURAZIONE	Bore	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0151	Rifacimento condotte idriche vetuste e/o intasate da depositi calcarei in località Franchi, Pozzolo, Fiori e altre località - FSC	ACQUEDOTTO	Bore	89.000	0	0	0	840	0	840	840	100%	Interventi di chiusura dei lavori avviati e rendicontati in annualità precedenti
2020PRMA0152	Interconnessione agglomerato di Monticelli (APR0157) con l'agglomerato di Borgo Val di Taro Capoluogo (APR0028) attraverso nuova condotta fognaria	DEPURAZIONE	Borgo Val di Taro	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0153	Rifacimento tratti di condotta di adduzione e scarichi di linea acquedotto di Nola-Frasso	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2020PRMA0154	Rifacimento rete distribuzione acquedoto Via De Gasperi, Via Abbazia, Via Campo Fortuna	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0155	Lavori di rifacimento reti acquedottistiche frazionali nelle località Porcigatone, Brunelli, San Vincenzo, Baselica, Tiedoli e altre minori	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0156	Lavori di rifacimento collettori fognari in Borgotaro Capoluogo, Ostia P.se, Belforte e altri agglomerati minori	FOGNATURA	Borgo Val di Taro	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0157	Realizzazione di nuovo sfioratore delle portate reflue eccedenti in Via Torresana con recapito al Rio Varacola	FOGNATURA	Borgo Val di Taro	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0158	Lavori di collegamento allacci del nuovo acquedotto nel Centro Storico di Borgotaro con dismissione del vecchio acquedotto	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0159	Rifacimento condotte di adduzione ai serbatoi di Isola e Breia	ACQUEDOTTO	Compiano	40.000	0	0	0	14.231	0	14.231	14.231	100%	Le attività idrauliche e di scavo sono state completate nel 2021; gli interventi contabilizzati nel 2022 riguardano ripristini e asfalti, eseguiti per necessità dopo un adeguato periodo di assestamento degli scavi
2020PRMA0160	Adeguamento impianto elettrico a servizio stazione di sollevamento acquedotto Tebaldi-Monte Croce	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0161	Rifacimento condotte idriche vetuste a servizio delle località Piazza e altre minori	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0162	PP140 - Sostituzione ed adeguamento impianto elettrico depuratore di Pellegrino Capoluogo	DEPURAZIONE	Pellegrino Parmense	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0163	Sostituzione a adeguamento della rete idrica di distribuzione a servizio del centro storico di Pellegrino P.se Intervento in Via 1° Maggio - FSC	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	70.000	5.000	5.000	10.000	22.955	0	22.955	12.955	129%	Significativo aumento dell'importo a seguito di prescrizioni molto stringenti da parte della provincia per il ripristino degli asfalti

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2020PRMA0164	Lavori di rifacimento collettori fognari in Pellegrino P.se Capoluogo e nelle località di Ceriatio, Lobbia, Berzieri, Santini	FOGNATURA	Pellegrino Parmense	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0165	Lavori di ampliamento/potenziamento depuratore di Rubbiano	DEPURAZIONE	Solignano	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0166	Lavori di rifacimento tratti di condotte fognarie nelle località Selva Grossa, Ca*Sana e Boschi Bardone	FOGNATURA	Terenzo	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0167	Rifacimento tratto condotte idriche dell'acquedotto di Monte Bosso a servizio delle località Ozzanello, La Fornace, Selva Smeralda, Case Cattani, Sivizzano e altre minori- FSC	ACQUEDOTTO	Terenzo	243.000	10.000	10.000	20.000	0	0	0	-20.000	-100%	Le procedure di progettazione e di affidamento hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate, con slittamento delle attività al 2023. Le attività di progettazione hanno richiesto la revisione degli importi originariamente previsti; la procedura di affidamento si è conclusa positivamente ma si sono registrate problematiche dell'avvio della cantierizzazione in relazione a ritardi dell'impresa affidataria
2020PRMA0168	Lavori di riqualificazione impianto di depurazione Case Lusardi a servizio di Tornolo Capoluogo	DEPURAZIONE	Tornolo	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0169	Sistemi di contabilizzazione acqua sugli allacciamenti utenze delle frazioni di Santa Maria del Taro, Casale, Tornolo Capoluogo, Tarsogno e zone limitrofe	ACQUEDOTTO	Tornolo	440.000	20.000	0	20.000	69.554	0	69.554	49.554	247%	Nel 2022 è stato possibile completare un numero di installazioni significativamente superiore rispetto al pianificato
2020PRMA0170	Lavori di riqualificazione collettore fognario di Santa Maria del Taro per la riduzione delle acque parassite	FOGNATURA	Tornolo	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0171	Rifacimento tratti di condotta idrica acquedotto Molino Sozzi-Campora, Lago Pesci-Roncotasco e Ossella	ACQUEDOTTO	Valmozzola	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0172	Rifacimento tratti di condotta idrica acquedotto Monte Barigazzo a servizio di Lenova, Oppiedolo, Bondi, Pieve di Gusaliggio e altre diramazioni	ACQUEDOTTO	Valmozzola	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2020PRMA0173	Lavori di sistemazione acquedotto e opere di presa a servizio della località Maneia a servizio dell'acquedotto di Vianino e altre località	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0174	Lavori collettamento reflui di Varano Capoluogo, di Piani di Riva e delle località limitrofe al depuratore di Rubbiano e contestuale dismissione del depuratore del capoluogo e sostituzione e adeguamento condotta fognaria di pompaggio tra Rio Bargolo e Rubbiano	DEPURAZIONE	Varano de' Melegari	1.000.000	0	0	0	24.960	0	24.960	24.960	100%	L'intervento è stato ridefinito nelle sue linee progettuali ed è stato oggetto di richiesta di finanziamento PNRR; i costi imputati riguardano le attività di progettazione ai fini della presentazione della domanda di finanziamento
2020PRMA0175	Sostituzione e adeguamento condotta fognaria di pompaggio tra Rio Bargolo e Rubbiano	FOGNATURA	Varano de' Melegari	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0176	Lavori di rifacimento tratto di condotta idrica in Piazza del Monumento e in Via Bassi nel Capoluogo	ACQUEDOTTO	Varsi	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0177	Nuovo sistema di controllo della torbidità sull'acquedotto della loc. Peracchi con impianto alimentato da pannelli fotovoltaici	ACQUEDOTTO	Varsi	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0178	Lavori di sostituzione e adeguamento tratto di rete idrica di acquedotto a servizio del Capoluogo di Varsi. Condotta di adduzione lungo S.P. del Mozzola	ACQUEDOTTO	Varsi	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0179	Lavori di rifacimento dei tronchi vetusti della rete di distribuzione del Monte Barigazzo a servizio del Capoluogo di Varsi nelle località Tosca e Scaffardi	ACQUEDOTTO	Varsi	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0180	Installazione di nuovi impianti di disinfezione per acqua potabile alimentati con energia elettrica per il miglioramento della qualità dell'acqua erogata	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	50.000	5.000	0	5.000	7.790	0	7.790	2.790	55%	Al fine di mantenere un'elevata qualità del servizio è stato necessario nel 2022 effettuare maggiori investimenti rispetto al preventivato
2020PRMA0181	"Ricerca nuove fonti di approvvigionamento idrico per impinguamento degli acquedotti. di Ponte Bonazza (Fornovo) Varsi, Solignano, Baganza-Secchione, MonteBosso, Pellegrino Parmense e altri comuni"	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	160.000	90.000	0	90.000	5.767	0	5.767	-84.233	-93%	Molti interventi programmati in questo codice sono slittati in codice specifici dell'ordinanza OCDPC 906/2022

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2020PRMA0182	Installazione nuovi misuratori dei Volumi in punti nodali della rete acquedotto per la determinazione delle perdite totali	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	55.000	35.000	0	35.000	26.849	0	26.849	-8.151	-23%	Le lavorazioni effettivamente realizzate sono state inferiori rispetto ai presuntivi di spesa
2020PRMA0183	Adeguamento scolmatori fognari con monitoraggio delle portate e telecontrollo negli agglomerati di Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro, Bedonia e altri minori	FOGNATURA	Opere pluricomunali	100.000	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	-100%	Le attività sono state riprogrammate per il 2023. Il censimento e rilievo delle infrastrutture (fondamentale per programmare i successivi interventi), spesso ubicate in zone di difficile accessibilità, ha richiesto tempistiche molto superiori alle previsioni, con correlati ritardi nelle attività successive
2020PRMA0184	Investimenti di struttura *	STRUTTURA			148.424	0	148.424	4.964	0	4.964	-143.460	-96%	Nel corso del 2022 non si sono resi necessari interventi di struttura aggiuntivi rispetto a quelli rendicontati
2020PRMA0185	Realizzazione di centralina idroelettrica da 99KW per recupero energetico su acquedotto Nola-Frasso, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	414.606	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0186	Realizzazione di centralina idroelettrica da 45KW per recupero energetico su acquedotto Frasso-Pineta, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0187	Installazione di impianto di gassificazione fanghi/cippato per la disidratazione dei fanghi con produzione di energia elettrica. Potenza 27 KW, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0188	Acquisizione, adeguamento e messa in funzione di 4 impianti fotovoltaici in Comune di Fornovo: Campo sportivo Riccò (KW 14,26), Serbatoio Casa Tebaldi (KW 10,81), Scuola Materna P.zza Libertà (KW 28,6), Condominio ACER Riccò (KW 13,57). Interventi finalizzati alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021PRMA0189	Interconnessione dell'acquedotto di Fopla con l'acquedotto di Monte Barigazzo in Loc. Costa di Fosio - Emergenza Idrica	ACQUEDOTTO	Solignano	60.000	0	60.000	60.000	2.144	0	2.144	-57.856	-96%	Lavori iniziati nel periodo finale nel 2022 e conclusi nel 2023. Ritardi esecutivi connessi a difficoltà tecniche riscontrate dall'impresa in fase realizzativa

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2021PRMA0190	Lavori sulla stazione di sollevamento di Campo del Gallo sull'acquedotto di Monte Barigazzo quale opera residuale a completamento degli interventi 2017 - Emergenza Idrica	ACQUEDOTTO	Varsi	54.000	0	54.000	54.000	1.930	0	1.930	-52.070	-96%	Lavori iniziati nel periodo finale nel 2022 e conclusi nel 2023. Ritardi esecutivi connessi a difficoltà tecniche riscontrate dall'impresa in fase realizzativa
2021PRMA0191	Lavori residuali di interconnessione dell'acquedotto a servizio della località Brugnoli - Rugarlo a completamento degli interventi 2017 -Emergenza idrica	ACQUEDOTTO	Bardi	25.000	0	25.000	25.000	18.373	0	18.373	-6.627	-26%	Lavori iniziati nel periodo finale nel 2022 e conclusi nel 2023. Ritardi esecutivi connessi a difficoltà tecniche riscontrate dall'impresa in fase realizzativa
2021PRMA0192	Interventi residuale sulla condotta insistente su frana in località Landino, acquedotto del capoluogo a completamento degli interventi 2017	ACQUEDOTTO	Bardi	80.000	0	80.000	80.000	7.852	0	7.852	-72.148	-90%	Lavori iniziati nel periodo finale nel 2022 e conclusi nel 2023. Ritardi esecutivi connessi a difficoltà tecniche riscontrate dall'impresa in fase realizzativa
2021PRMA0193	Completamento dei lavori di interconnessione dell'acquedotto in località Belforte	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	26.000	0	26.000	26.000	24.052	0	24.052	-1.948	-7%	
2021PRMA0194	Acquisizione acquedotti Re dei Ruscelli	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	252.713	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021PRMA0195	Lavori urgenti di rifacimento di tratto di scogliera in massi ciclopici cementati a protezione del depuratore acque reflue di Noveglia - Eventi metereologici 2019	DEPURAZIONE	Bardi	41.228	29.228	12.000	41.228	22.002	12.000	34.002	-7.226	-17%	
2021PRMA0196	Lavori urgenti di difesa spondale nel torrente Ceno in corrispondenza del ponte Rubbiano con realizzazione di scogliera in massi ciclopici a salvaguardia della carrabilità dell'area golenale e all'impianto di depurazione di Rubbiano Eventi metereologici 2019	ACQUEDOTTO	Solignano	70.000	0	70.000	70.000	-3.120	67.182	64.062	-5.938	-8%	
2021PRMA0197	Lavori di rifacimento di opera di presa acquedotto di Gotra - Eventi metereologici 2019	ACQUEDOTTO	Albareto	23.000	0	0	0	-21.159	21.159	0	0	0%	
2022PRMA0198	strumentazione attrezzatura acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	40.000	20.000	0	20.000	4.122	0	4.122	-15.878	-79%	Le esigenze di strumentazione del settore acquedotto sono state inferiori rispetto al preventivato

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2022PRMA0199	strumentazione attrezzatura fognatura depurazione	FOGNATURA	Opere pluricomunali	40.000	20.000	0	20.000	5.200	0	5.200	-14.800	-74%	Le esigenze di strumentazione del settore fognatura sono state inferiori rispetto al preventivato
2022PRMA0200	Adeguamento alla delibera ARERA 218 del 2016 installazione contatori con telettura - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	50.000	12.500	12.500	25.000	0	0	0	-25.000	-100%	Le procedure di progettazione e di affidamento hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate, con slittamento delle attività al 2023. La selezione della soluzione tecnologica di telettura più idonea in relazione alla complessità territoriale ha necessitato tempistiche superiori alle previsioni; conseguentemente anche l'affidamento e l'avvio delle attività hanno subito una dilazione dei tempi originariamente previsti
2023PRMA0201	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un nuovo pozzo e connessione alla rete esistente, in Loc. Castagnola	ACQUEDOTTO	Bedonia	42.000	0	10.000	10.000	4.022	0	4.022	-5.978	-59%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate. La predisposizione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni (ARPAE e Enti vari) ha richiesto impegni e tempi superiori alle previsioni, anche dovuti alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (realizzazione pozzo, posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi). Autorizzazione ottenuta in data 26/07/2023
2023PRMA0202	Ripristino strutturale e funzionale del serbatoio "Lagacci", del relativo gruppo di rilancio acquedottistico e della condotta di mandata	ACQUEDOTTO	Bardi, Bore	51.000	0	30.000	30.000	18.707	0	18.707	-11.293	-37%	Le opere idrauliche ed elettriche sono state completate nei tempi previsti; a causa di ritardi della ditta edile affidataria e del sopraggiungere della stagione invernale (in cui il serbatoio in oggetto non è più raggiungibile con mezzi di cantiere) i lavori edili sulla soletta di copertura del serbatoio sono stati posticipati al 2023
2023PRMA0203	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di nuovi pozzi Monte Bosso e nelle adiacenze pozzi Secchione	ACQUEDOTTO	Terenzo	116.000	0	16.000	16.000	3.094	0	3.094	-12.906	-80%	Le attività di progettazione e acquisizione permessi e autorizzazioni hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate, con lo slittamento delle attività di realizzazione nel 2023. La predisposizione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni (ARPAE e Enti vari) ha richiesto impegni e tempi superiori alle previsioni; l'iter autorizzativo parimenti si è prolungato oltre le aspettative. Autorizzazione ottenuta in data 06/04/2023 per il pozzo 2 (Monte Bosso) e in data 05/05/2023 per il pozzo 1 (Secchione)

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2023PRMA0204	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di nuovi pozzi a Poggio e Cà d'Arcangelo	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	117.000	0	10.000	10.000	2.740	0	2.740	-7.260	-72%	Le attività di progettazione e acquisizione permessi e autorizzazioni hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate, con lo slittamento delle attività nel 2023. La predisposizione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni (ARPAE e Enti vari) ha richiesto impegni e tempi superiori alle previsioni, oltre alla necessità di rivalutare le originarie previsioni di localizzazione dei nuovi pozzi, anche dovuti alla difficoltà di ottenimento dei permessi e nulla osta ad intervenire in aree private (realizzazione pozzi, posa di condotte idriche, elettriche e realizzazione manufatti connessi). Procedimento autorizzativo in corso
2023PRMA0205	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un nuovo pozzo a servizio dell'acquedotto di Fornovo, in loc. Ponte Bonazza	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	73.758	0	10.000	10.000	8.846	0	8.846	-1.154	-11%	
2023PRMA0206	Interventi di realizzazione di serbatoi da 5/10/20 mc a al fine di aumentare la disponibilità idropotabile	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	60.000	0	31.340	31.340	31.340	0	31.340	0	0%	
2023PRMA0207	Interventi di rifornimento con autobotti al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	200.000	0	58.543	58.543	64.248	0	64.248	5.705	9%	
2023PRMA0208	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un pozzo per l'approvvigionamento idrico della Località Tintori	ACQUEDOTTO	Solignano	94.000	0	10.000	10.000	4.022	0	4.022	-5.978	-59%	Le procedure di progettazione e affidamento di impianti e strumentazione hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate, con slittamento di parte delle attività al 2023
2023PRMA0209	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di nuovi pozzi in località Tosca e Case Poncini a supporto dell'approvvigionamento idrico delle frazioni del Comune di Varsi	ACQUEDOTTO	Varsi	180.000	0	30.192	30.192	39.744	0	39.744	9.552	31%	Maggiore spesa rispetto al preventivato in relazione alle condizioni ed esigenze manifestatesi nel corso delle perforazioni
2023PRMA0210	Studi di fattibilità a favore degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0	0%	
					Importo netto pianificato 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo lordo pianificato 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	PERCENTUALE INVESTIMENTI CONSUNTIVATI RISPETTO ALL'IMPORTO PIANIFICATO esclusi investimenti di struttura	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
				Importo Totale	1.294.152	715.574	2.009.727	1.341.555	188.497	1.530.052	-479.675		
				Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura	1.145.728	715.574	1.861.303	1.336.591	188.497	1.525.087	-336.215		82%

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Gianluca Borghi

Il segretario verbalizzante

F.to Marialuisa Campani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2024

Il Direttore
F.to Vito Belladonna
