

**CLFE/2017/14 del 13 dicembre 2017**

**CONSIGLIO LOCALE di FERRARA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo 2016.**

**IL COORDINATORE**  
F.to Andrea Marchi

## CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

**CLFE/2017/14**

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 10,30 presso la Sala Sala Torre San Paolo della Provincia di Ferrara, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettere PG/AT/2017/7944 del 7/12/2017.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI FERRARA			NO	10,0000
COMUNE DI ARGENTA	Marco Chiarini	Assessore delegato	SI	5.4468
COMUNE DI BERRA			NO	1.5574
COMUNE DI BONDENO	Marco Vincenzi	Assessore delegato	SI	3.8388
COMUNE DI CENTO			NO	8.3318
COMUNE DI CODIGORO			NO	3.2139
COMUNE DI COMACCHIO	Denis Fantinuoli	Assessore delegato	SI	5.5648
COMUNE DI COPPARO			NO	4.2744
COMUNE DI FERRARA	Caterina Ferri	Assessore delegato	SI	30.7476
COMUNE DI FISCAGLIA			NO	2.5563
COMUNE DI FORMIGNANA	Marco Ferrari	Assessore delegato	SI	1.0173
COMUNE DI GORO			NO	1.2675
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA			NO	1.0631
COMUNE DI LAGOSANTO			NO	1.5097
COMUNE DI MASI TORELLO			NO	0.9176
COMUNE DI MESOLA	Gianni Michele Padovan	Assessore delegato	SI	2.0111
COMUNE DI OSTELLATO	Andrea Marchi	Sindaco	SI	1.8537
COMUNE DI POGGIO RENATICO	Daniele Garuti	Sindaco	SI	2.5918
COMUNE DI PORTOMAGGIORE			NO	3.1672
COMUNE DI RO			NO	1.1422
COMUNE DI TERRE DEL RENO			NO	3.1723
COMUNE DI TRESIGALLO			NO	1.4202
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	Alessandro Berselli	Assessore delegato	SI	2.0778
COMUNE DI VOGHIERA	Chiara Cavicchi	Sindaco	SI	1.2565

Presenti n. 10	pari a quote	56,41
Assenti n. 14	pari a quote	43,59

Riconosciuta la validità della seduta Andrea Marchi, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo 2016.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato che:**

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

**considerato che:**

- con deliberazione n.6 del 16 dicembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n.6 del 14 giugno 2017 del Consiglio locale di Ferrara è stata approvata la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
  - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);

- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

**dato atto che:**

- il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso il software ARSI;

**rilevato che:**

- durante il 2016 non è stato proposto alcun nuovo intervento che necessiti di ratifica da parte del Consiglio locale ai sensi della delibera CAMB 75/2017;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2016 risultano essere sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate ammissibili;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ritenuto pertanto:**

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**a voti** resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 23 (quote 68,37), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

**DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore HERA S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

---

**Servizio Idrico Integrato  
Consuntivo investimenti annualità 2016  
Gestore: HERA s.p.a.  
Sottoambito: Ferrara**

27 ottobre 2017

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n. 6 del 16 Dicembre 2015, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI.

		PIANIFICATO 2016		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016	
HERA	Importo Lordo Pianificato dal soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 8.265.000		-€ 390.518	€ 7.874.482	Importo Lordo a Consuntivo del soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo a fondo perduto Pianificato [B]	€ 75.000		-€ 75.000	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	<b>Importo Netto Pianificato [A]-[B]</b>	<b>€ 8.190.000</b>		<b>-€ 315.518</b>	<b>€ 7.874.482</b>	<b>Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]</b>
CONTO TERZI	Importo Lordo Pianificato da soggetto investitore diverso da HERA [C]	€ 100.000		<b>-€ 27.962</b>	€ 72.038	Importo Lordo a Consuntivo da soggetto investitore diverso da HERA
TOTALE	Totale netto pianificato	€ 8.290.000		<b>-€ 343.480</b>	€ 7.946.520	Totale netto consuntivato

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2016 investimenti di poco inferiori, in termini economici e in proporzione all'ammontare complessivo, rispetto a quanto era stato preventivato; nel caso specifico, come si vede anche dalla tabella 2 non si può esattamente attribuire tale differenza ad una causa diretta, infatti gli interventi non avviati nel 2016 sono stati recuperati da quelli anticipati nel 2016 e tale differenza complessiva ( - € 343.480) è solo l'ammontare complessivo di tutti i singoli scostamenti che ci sono stati degli importi consuntivati rispetto agli importi programmati.

Vi è inoltre anche un intervento (importo complessivo pari a circa 100.000 euro) il cui soggetto finanziatore non è il gestore HERA, il quale si incarica solo dell'esecuzione dell'opera, ma ACOSEA Impianti e tali interventi vengono considerati come un vero e proprio lavoro "conto terzi".

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

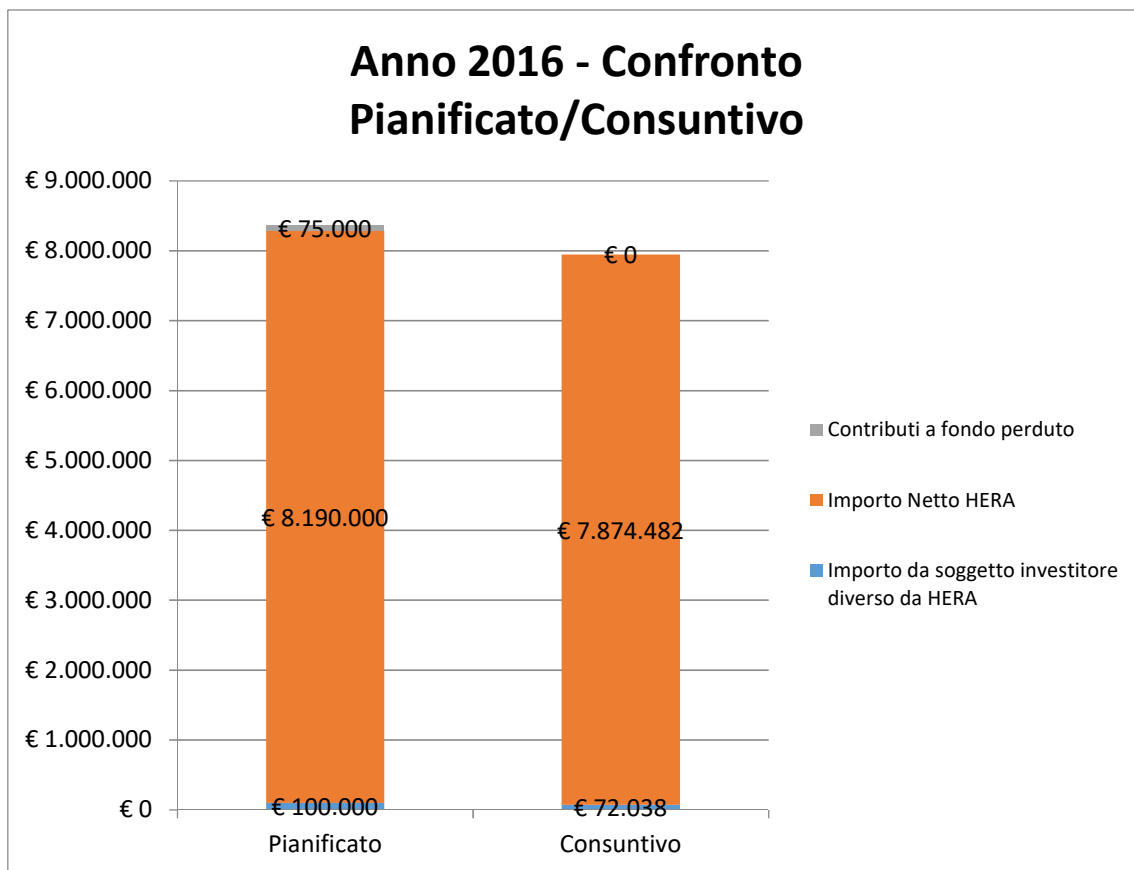


Fig.1 – Istogramma di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2016

#### RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva.

Numero di voci nel programma approvato per il 2016: 55

Numero di voci rendicontate nel 2016: 58



	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2016	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2016	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati o conclusi contabilmente nell'anno 2015 (% di scostamento pari al -100%)	6	€ 0	€ 73.000			
<i>di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente</i>	1	€ 0	€ 10.000	<i>GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA</i>		
Interventi con avvio anticipato nel 2016 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	9	€ 188.805	€ 0			
Interventi avviati nel 2016 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0			
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	36	€ 3.334.515	€ 3.978.000			
<i>di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 12/2017</i>	8	€ 209.753	€ 201.000	<i>GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA</i>		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	13	€ 4.423.200	€ 4.314.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo inferiore a quello preventivato (cfr. Tab 1) e non abbia del tutto avviato 6 interventi (per l'elenco si veda la Tabella 3) dei 55 programmati,

le verifiche effettuate sulle giustificazioni adottate dal gestore hanno ritenuto esaustive tutte le motivazioni che il gestore ha fornito.

Per il 62% delle voci previste in programma (36) gli importi previsti hanno registrato uno scostamento oltre il  $\pm 20\%$ , mentre per 13 interventi gli importi previsti dalla programmazione sono stati in linea di massima rispettati.

Il gestore ha inoltre avviato anticipatamente rispetto a quanto programmato 8 interventi previsti nella pianificazione d'ambito e nei programmi dell'ex ATO 6 e chiuso in ritardo, nel 2016, solo 1 intervento la cui chiusura era prevista nel 2015.

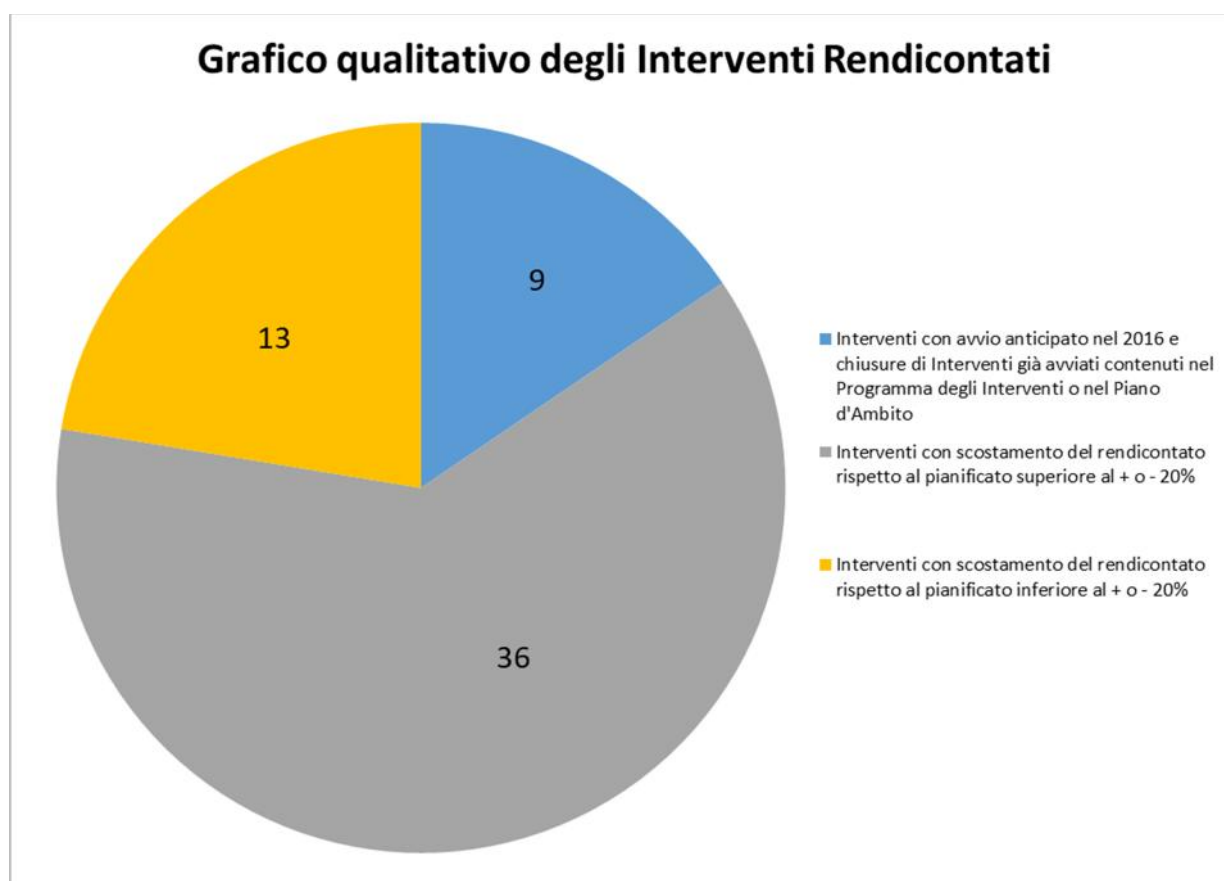


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2016 da Piano approvato
2014FEHA0018	NUOVO SOLL. PIAZZ. BONZAGNI-CENTO	FOGNATURA	Cento;	5.000
2014FEHA0023	COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO	FOGNATURA	Cento;	13.000
2014FEHA0028	RECUP. AREE SERB PENSILE SAN MARTINO	ACQUEDOTTO	Ferrara;	0
2014FEHA0070	MODELL. SISTEMA FOGNARIO FERRARA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	10.000
2014FEHA0073	COLLEG SCARICHI NON DEP DI QUARTIERE	FOGNATURA	Portomaggiore;	5.000
2015FEHA0006	RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO CANALAZZO	FOGNATURA	Cento;	40.000
			<b>TOTALE</b>	<b>73.000</b>

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0001	RINN.RETE ARGENTA-FILO-MENATE	ACQUEDOTTO	Argenta;	Gestore	465.000	335.000		335.000	38.823	0	38.823	-88%	RITARDO NELL'AVVIO LAVORI CAUSA TEMPISTICHE RELATIVE ALLA GARA (INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA ESECUTRICE), CHE VERRÀ RECUPERATO NEL 2017.
2014FEHA0002	BONIFICA VIA ANIME A SAN NICOLÒ-ASSE3	ACQUEDOTTO	Argenta;	Gestore	115.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0003	POTENZIAMENTO IN VIA ROSSINI-ASSE3	ACQUEDOTTO	Argenta;	Gestore	81.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0005	POT. ACQ FRAZIONE S.M. CODIFUME - 1° STR	ACQUEDOTTO	Argenta;	Gestore	400.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0006	ADEG. IMPIANTO DI LONGASTRINO	DEPURAZIONE	Argenta;	Gestore	440.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0007	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO	DEPURAZIONE	Argenta;	Gestore	300.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0008	NUOVO ATTRAV FERROV FOG AD ARGENTA	FOGNATURA	Argenta;	Gestore	565.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0009	DISM.IMP.BOCALONE-COLLETTAM.DEP.ARGENTANTA	FOGNATURA	Argenta;	Gestore	800.000	17.000		17.000	9.114	0	9.114	-46%	
2014FEHA0010	DISM.IMP.CONсандolo-COLLETT.DEP.ARGENTA	FOGNATURA	Argenta;	Gestore	400.000	30.000		30.000	12.965	0	12.965	-57%	
2014FEHA0011	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE SAN BIAGIO	FOGNATURA	Argenta;	Gestore	490.000	24.000		24.000	3.557	0	3.557	-85%	SLITTAMENTO PROGETTAZIONE IN ATTESA DEGLI ACCORDI PER LA SOLUZIONE PROGETTUALE CON CONSORZIO DELLA BONIFICA

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2015FEHA0001	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO BANDO ARGENTA	FOGNATURA	Argenta;	Gestore	6.000	0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0002	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA S.MARIA CODIFIUME	FOGNATURA	Argenta;	Gestore	320.000	85.000	85.000	18.281	0	18.281	-78%	RITARDI NELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'INIZIO DEI LAVORI (SERVITÙ)	
2015FEHA0003	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE BANDO	FOGNATURA	Argenta;	Gestore	260.000	90.000	90.000	39.034	0	39.034	-57%	RALLENTAMENTI IN RIFERIMENTO ALL'ITER AUTORIZZATIVO CHE HANNO INDOTTO AD UNA RIPARAMETRAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE NEGLI ANNI.	
2015FEHA0004	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.BIAGIO ARGENTA	FOGNATURA	Argenta;	Gestore	10.000	0	0	0	0	0			
2014FEHA0012	NUOVI POZZI E INCREMENTO CONCESSIONE CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno;	Gestore	160.000	15.000	15.000	1.264	0	1.264	-92%		
2014FEHA0013	COLLET SCARICHI V.PIROMI ALFIERI RENO	DEPURAZIONE	Bondeno;	Gestore	175.000	0	0	0	0	0			
2014FEHA0014	SCARICHI NON DEP L 152-VIA MATTEOTTI	FOGNATURA	Bondeno;	Gestore	90.000	10.000	10.000	30.887	0	30.887	209%	MAGGIORI ONERI LEGATI A GESTIONE INTERFERENZE CON RFI	
2015FEHA0005	SOSTITUZIONE POZZI GOLENALI STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno;	Gestore	130.000	65.000	65.000	82.215	0	82.215	26%		
2017FEHA0008	COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento,	Gestore	150.000	0	0	0	1.959	0	1.959	100%	NUOVO ID COME DA RICHIESTA PEC DEL 24/03/2017: NUOVO ID CHE NASCE DALLO SCORPORE DELL'ID 2014FEHA0020. L'INIZIALE INTERVENTO DENOMINATO "COLL. M. ALBERGATI-PILASTRELLO A BUONACOMPRA" E' STATO SUDDIVISO IN 2 STRALCI CHE FANNO RIFERIMENTO AD ADEGUAMENTI DI 2 AGGLOMERATI DI DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA (DIVERSAMENTE PRIORITARI SECONDO LE NUOVE TEMPISTICHE DETTATE DA DGR 201/2016).

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0015	REAL. NUOVO DEPURATORE DI BUONACOMPRA	DEPURAZIONE	Cento;	Gestore	708.000	50.000		50.000	12.854	0	12.854	-74%	RALLENTAMENTO PROGETTUALE CAUSA ITER AUTORIZZATIVO PARTICOLARMENTE LUNGO
2014FEHA0016	SISTEMA CASUMARO	DEPURAZIONE	Cento;	Gestore	900.000	530.000		530.000	98.744	0	98.744	-81%	RITARDI AVVIO CAUSA CRITICITÀ RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DELL'AREA ANCHE A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO BONARIO. NECESSARIA VERIFICA CIRCA LA POSSIBILITÀ DA PARTE DELLA PARTECIPANZA DI VENDERE IL TERRENO SENZA IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA (QUESTIONE INTERVENTUTA A GARA ESPLETATA)
2014FEHA0017	SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE-CENTO	FOGNATURA	Cento;	Gestore	246.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0018	NUOVO SOLL. PIAZZ. BONZAGNI-CENTO	FOGNATURA	Cento;	Gestore	300.000	5.000		5.000	0	0	0	-100%	RIPIANIFICAZIONE PER RIVALUTAZIONE PRIORITÀ. A SEGUITO DELL'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO ESEGUITI SULLA RETE DEI CANALI DI BONIFICA SI E' RESO NECESSARIO AGGIORNARE LO STUDIO IDRAULICO SULLA RETE FOGNARIA INTEGRANDO IL MODELLO IDRAULICO DELLA RETE FOGNARIA CON QUELLO DELLA RETE DEI CANALI DI BONIFICA. AL TERMINE DELL'AGGIORNAMENTO SARA' POSSIBILE CONFERMARE GLI INVESTIMENTI PREVISTI
2014FEHA0019	COLLETTAM. ALBERONE A DEP. BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento;	Gestore	595.000	74.000		74.000	24.613	0	24.613	-67%	SLITTAMENTO INIZIO LAVORI PER PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO (ATTESA VARIANTE URBANISTICA PER IL DEPURATORE)
2014FEHA0020	COLL. M. ALBERGATI-PILASTRELLO A BUONAC.	FOGNATURA	Cento;	Gestore	495.000	48.000		48.000	23.069	0	23.069	-52%	MINORI ONERI IN QUANTO L' INTERVENTO E' STATO OGGETTO DI RIVISITAZIONE PROGETTUALE E CONSEGUENTEMENTE SUDDIVISO IN 2 STRALCI CHE FANNO RIFERIMENTO AD ADEGUAMENTI DI 2 AGGLOMERATI DI DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA (DIVERSAMENTE PRIORITARI SECONDO LE NUOVE TEMPISTICHE DETTATE DA DGR 201/2016). IN QUESTO ID SI REALIZZA L'INTERVENTO DI COLLEGAMENTO PILASTRELLO A BUONACOMPRA. IL SECONDO TRALCIO SI
2014FEHA0021	COLLEG DI RENO C. A NUOVO DEP. CASUMARO	FOGNATURA	Cento;	Gestore	560.000	156.000		156.000	15.406	0	15.406	-90%	SLITTAMENTO INIZIO LAVORI PER PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO
2014FEHA0022	COLL.FOG DI VIA ROSSINI ALBERONE-CENTO	FOGNATURA	Cento;	Gestore	80.000	0		0	25.664	0	25.664	100%	CHIUSURA DEI LAVORI PREVISTA NEL 2015 MA REALIZZATA NEL 2016 CAUSA RITARDI NELL'ITER AUTORIZZATIVO.
2014FEHA0023	COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO	FOGNATURA	Cento;	Gestore	170.000	13.000		13.000	0	0	0	-100%	SLITTAMENTO A CAUSA DELLA RIPROGRAMMAZIONE DELL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE (ATTIVITA' DI REPERIMENTO DEI DATI IN INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE).
2015FEHA0006	RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO CANALAZZO	FOGNATURA	Cento;	Gestore	100.000	40.000		40.000	0	0	0	-100%	RITARDI NELL'INIZIO DEI LAVORI DOVUTI ALLA PRESENZA DI UN'INIZIATIVA URBANISTICA PRIVATA NELL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2017FEHA0001	COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA SOSTEGNO A CONA	FOGNATURA	Ferrara,	Gestore	200.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0024	MANUT.GIUNTI BACINILAGUNAGGIO E DRENAGGI	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	70.000	20.000		20.000	30.380	0	30.380	52%	
2014FEHA0025	POTENZ. RETE IDRICA VIA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	458.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0026	IMPLEMENT. AUTOMAZIONE PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	600.000	65.000		65.000	70.485	0	70.485	8%	
2014FEHA0027	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	322.000	4.000		4.000	2.186	0	2.186	-45%	
2014FEHA0028	RECUP. AREE SERB PENSILE SAN MARTINO	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	220.000	0	75000	-75.000	0	0	0	-100%	ALL'INTERNO DEL PORTALE REGIONALE "SFINGE" (PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI LEGATI ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012) LA REGIONE HA RIFIUTATO LA NOSTRA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO IN OGGETTO.
2014FEHA0029	NUOVI POZZI E INCREM.CONCES. P.LAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	315.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0030	RINN.RETE IDRICA V. SALINGUERRA FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	51.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0031	RINN.RETE DN250-VIA VIAZZA BOARA FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	130.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0032	BON. E MAGLIATURA RETI V.LADINO-V.FONDO	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	50.000	0		0	0	0	0		

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0033	RINN.DN160 VIA PALMIRANO-FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	53.000	50.000		50.000	454	0	454	-99%	SLITTAMENTO AL 2018 PER VINCOLI AUTORIZZATIVI
2014FEHA0034	RINN.RETE DN400 E DN250 VVIVALDI FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	60.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0035	REVAMPING IMP. OZONO PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	400.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0036	POT. RETE ACQ. VIA ERCOLE DE ROBERTI	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	65.000	0		0	35.321	0	35.321	100%	TRASCINAMENTO DAL 2015 MAGGIORI ONERI LEGATI ALLA POSA IN CENTRO STORICO
2014FEHA0037	ADEG E POTENZ DEP DI GAIBANELLA	DEPURAZIONE	Ferrara;	Gestore	909.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0038	ELIM DEP DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI	DEPURAZIONE	Ferrara;	Gestore	261.000	35.000		35.000	90.133	0	90.133	158%	L'INCREMENTO DELL'IMPORTO PROGETTUALE È LEGATO ALLE VARIANTI IN FASE DI REALIZZAZIONE PER UN TRATTO DI RETE LA CUI ESECUZIONE È STATA ANTICIPATA NEL 2016
2014FEHA0039	MANUT A DUE SEDIM SECONDARI DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara;	Gestore	150.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0040	REVAMPING DIGEST ANAEROB DEP GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara;	Gestore	2.668.000	63.000		63.000	28.877	0	28.877	-54%	L'IMPORTO DEL VECCHIO PIANO ERA STATO STIMATO PER LO SVUOTAMENTO DEI DIGESTORI ESISTENTI, PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI REVAMPING. LE VALUTAZIONI TECNICO ECONOMICHE HANNO FATTO PROPENDERE VERSO LA COSTRUZIONE DI NUOVI DIGESTORI, PERTANTO I COSTI DI SVUOTAMENTO SARANNO POSTICIPATI A FINE CANTIERE
2014FEHA0041	COLLEG A DEP DI V. VESCOVO E FORNO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	285.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0042	COLLEGAMENTO DI BOARA AL DEP DI FERRARA	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	980.000	0		0	24.549	0	24.549	100%	PARZIALE SLITTAMENTO AL 2016 DI COSTI PREVISTI NEL 2015 PER COMPLETAMENTO OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA RICHIESTE DAL SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E PER SOPPERIRE A MANCANZE DELLA DITTA ESECUTRICE (FALLITA). SONO STATI INOLTRE NECESSARI MAGGIORI OPERE LEGATE A INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE E OPERE INTEGRATIVE EMERSE IN FARE ESECUTIVA



ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FEHA0043	COLLEG.BAURA A IMP.CONTRAPÒ-ADEG.E POT.	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0044	COLLEG DI CORLO E MALBORG DI CORREGGIO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	725.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0045	COLLETT DI VIA CERVELLA VIA CAVO DUCALE	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	180.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0046	SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	653.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0047	MANUT IMP DI SOLL IN VIA COMACCHIO (S6)	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	200.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0048	COLLEG A POGGIO E ELIM IMP DI MONTALBANO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	2.533.000	20.000	20.000	20.000	26.191	0	26.191	31%	
2014FEHA0049	REVAMPING SOLLEVAMENTO VOLANO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	900.000	50.000	50.000	50.000	14.044	0	14.044	-72%	L'INTERVENTO È STATO SOSTANZIALMENTE COMPLETATO NEL 2015 ANTICIPANDO ANCHE UNA PARTE DEI LAVORI CHE ERANO STATI PREVENTIVAMENTE PROGRAMMATI PER IL 2016.
2014FEHA0050	ADEG. SISTEMA FOGNARIO IN VIA POLLINA	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	60.000	0	0	0	21.919	0	21.919	100%	MAGGIORI ONERI LEGATI A MODIFICA DEL TRACCIATO PREVISTO SU AREE PRIVATE
2014FEHA0051	SUBURBANA-POTENZ RETE FOGN VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	1.947.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0052	COLLEG. ZONA STAZIONE-CONA	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	830.000	25.000	25.000	25.000	21.593	0	21.593	-14%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0053	RINN RETE FOG VIA VOLANO FERRARA	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	50.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0054	POT. RETE FOG. VIA ERCOLE DE ROBERTI	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	90.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0055	REALIZ.CANAL.SCOLM. V.AEREOPORTO.FERRARA	FOGNATURA	Ferrara;	ACOSEA Impianti	405.000	0	0	0	67.907	0	67.907	100%	LO SCOSTAMENTO È DOVUTO A MAGGIORI SPESE SOSTENUTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO E NECESSITÀ DI MODIFICHE DELLE PENDENZE ARGINALI DI SCAVO PREVISTE DAL PROGETTO DEL CANALE. INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. ANCORA DA COMPLETARE L'ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALL'ENTE FINANZIATORE (ACOSEA)
2014FEHA0083	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	140.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0085	SOSTITUZIONE POZZO21 CON NUOVO POZZO 21A	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	90.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0088	POTENZIAMENTO SOLLEV. S10. V. FABBRI-V. EVA-V. ADAMO	FOGNATURA	Ferrara;	ACOSEA Impianti	155.000	0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0007	SOSTITUZIONE POZZO GOLENALE PONTE LAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	480.000	115.000	115.000	115.000	139.699	0	139.699	21%	A CAUSA DI UN CROLLO CHE HA INTERESSATO UN POZZO LIMITROFO ALL'AREA DI INTERVENTO, SI È PROCEDUTO ALLA PERFORAZIONE DI N.2 NUOVI POZZI.
2015FEHA0008	REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA VIA PENAVARA - SAN MARTINO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	237.000	217.000	217.000	217.000	250.407	0	250.407	15%	
2015FEHA0009	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MONESTIROLO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	200.000	0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0010	DISCONNESSIONE COLLETTORE FOGNARIO V. BOLOGNA E SCOLO MAMBRO	FOGNATURA	Ferrara;	ACOSEA Impianti	110.000	100.000	100.000	100.000	4.131	0	4.131	-96%	SLITTAMENTO INIZIO LAVORI PER PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2015FEHA0011	NUOVA ADDUTTRICE SUD - FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore	1.900.000	0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0012	COLLEGAMENTO V.CIPRESSINA E PANIGALLI-DENORE	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore	400.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0056	RINN. RETE V.ADRIATICO - MASI TORELLO	ACQUEDOTTO	Masi Torello;	Gestore	80.000	0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0013	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO MASI TORELLO	FOGNATURA	Masi Torello;	Gestore	5.000	5.000	5.000	5.000	5.709	0	5.709	14%	
2014FEHA0057	RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - FE-ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.115.535	0	1.115.535	6%	
2014FEHA0058	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FE - ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		650.000	650.000	650.000	704.921	0	704.921	8%	
2014FEHA0059	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - FE - ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		180.000	180.000	180.000	159.588	0	159.588	-11%	
2014FEHA0060	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		80.000	80.000	80.000	92.176	0	92.176	15%	
2014FEHA0061	RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - FE-ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.121.536	0	1.121.536	-3%	
2014FEHA0062	ADEG. ATTRAVERS. FERROVIARI - FE - ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore	600.000	100.000	100.000	100.000	45.393	0	45.393	-55%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITÀ. INTERVENTI IN CORSO.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0063	VERIF.E ADEG.SISMICI IMP.ACQ FE-ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore	3.500.000	375.000		375.000	344.280	0	344.280	-8%	
2014FEHA0064	DISTRETT. RETI ACQUA - FE ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore	350.000	0		0	1.831	0	1.831	100%	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPO; LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
2014FEHA0065	MANUT. STRA. IMP. DEP. - FE - ATO 6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomuna	Gestore		741.000		741.000	1.003.437	0	1.003.437	35%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0066	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - FE - ATO 6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomuna	Gestore		80.000		80.000	132.261	0	132.261	65%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0067	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-FE- ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore		400.000		400.000	618.280	0	618.280	55%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0068	MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - FE- ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore		208.000		208.000	205.077	0	205.077	-1%	
2014FEHA0069	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - FE-ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore		30.000		30.000	45.438	0	45.438	51%	
2014FEHA0070	MODELL. SISTEMA FOGNARIO FERRARA	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore	235.000	10.000		10.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO
2014FEHA0071	RILIEVO RETI FOGNARIE - FE - ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore	746.000	20.000		20.000	53.293	0	53.293	166%	MAGGIORI ONERI LEGATI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA DI RILIEVO SCOLMATORI RICHIESTI DAGLI ENTI NELL'AMBITO DELLE PRATICHE AUA DEGLI AGGLOMERATI FOGNARI
2014FEHA0082	SOST. CTR PARI CALIBRO - FE - ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		60.000		60.000	99.896	0	99.896	66%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI SOSTITUZIONE CONTATORI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0086	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -FE-ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore		250.000		250.000	337.559	0	337.559	35%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0087	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		50.000		50.000	132.991	0	132.991	166%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015FEHA0014	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.DEPURAZIONE-FE-ATO6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomuna	Gestore		27.000		27.000	48.209	0	48.209	79%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015FEHA0015	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.FOENARI-FE-ATO6	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore		72.000		72.000	76.577	0	76.577	6%	
2015FEHA0016	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore	2.000.000	100.000		100.000	7.278	0	7.278	-93%	RIPROGRAMMAZIONE DEGLI IMPORTI NEGLI ANNI NECESSARIA PER TENER CONTO DEI TEMPI AUTORIZZATIVI DI OGNI SINGOLO INTERVENTO
2014FEHA0072	POTENZIAMENTO IN VIA PONTE ROSSO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Poggio Renatico;	Gestore	128.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0073	COLLEG SCARICHI NON DEP DI QUARTIERE	FOGNATURA	Portomaggiore;	Gestore	500.000	5.000		5.000	0	0	0	-100%	GLI INTERVENTI SONO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. E' NECESSARIO STABILIRE, IN ACCORDO CON GLI ENTI, QUALE SOLUZIONE PROGETTUALE PERSEGUIRE, NONCHE' REPERIRE I DATI TECNICI RELATIVI ALLO STATO DI FATTO DEL SISTEMA.
2014FEHA0074	SCARICHI NON DEP DI RUNCO E COLL A GAMBU	FOGNATURA	Portomaggiore;	Gestore	289.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0075	RINN. RETE V.MATTEOTTI-S.AGOSTINO	ACQUEDOTTO	Sant'Agostino;	Gestore	51.000	0		0	0	0	0		
2014FEHA0076	COLLEG VIA MONTECASSINO E LIM A DOSSO	FOGNATURA	Sant'Agostino;	Gestore	600.000	233.000		233.000	255.317	0	255.317	10%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0084	MODELL. SISTEMA FOGNARIO SAN CARLO	FOGNATURA	Sant'Agostino;	Gestore	10.000	0	0	0	7.644	0	7.644	100%	MAGGIORI ONERI PER LE ATTIVITA' DI MODELLAZIONE ANCHE SUL SISTEMA FOGNARIO DI SANT'AGOSTINO. INTERVENTO CONCLUSO NEL 2016.
2014FEHA0089	POTENZIAMENTO RETE IDRICA - SANT'AGOSTINO	ACQUEDOTTO	Sant'Agostino;	ACOSEA Impianti	240.000	0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0017	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V MANZONI-PONTE TUBO CER	FOGNATURA	Sant'Agostino;	Gestore	160.000	50.000	50.000	50.000	6.017	0	6.017	-88%	RITARDI NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE DOVUTI A PARTICOLARE COMPLESSITÀ TECNICA E IDRAULICA DEL SISTEMA.
2014FEHA0077	POTENZ. IN VIA MANTOVA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore	77.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0078	POTENZIAMENTO RETE VIA RONDONA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore	121.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0079	POTENZIAMENTO A VIGARANO PIEVE-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore	54.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0080	COLLET VIGARANO PIEVE-DEP. FE I STRALCIO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore	515.000	0	0	0	2.011	0	2.011	100%	SCOSTAMENTI LEGATI AD ALCUNE OPERE DI FINITURA SUL SOLLEVAMENTO FOGNARIO.
2014FEHA0081	COLLET VIGARANO PIEVE-DEP.FE II STRALCIO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore	718.000	84.000	84.000	84.000	57.541	0	57.541	-31%	SLITTAMENTO INIZIO LAVORI PER ATTESA CONCLUSIONE FASE GARA DI AFFIDAMENTO.
2015FEHA0018	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO GUALDO	FOGNATURA	Voghiera;	Gestore	6.000	0	0	0	0	0	0		

8.365.000	75.000	8.290.000	7.946.520	0	7.946.520
-----------	--------	-----------	-----------	---	-----------



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 14 del 13.12.2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo 2016.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 13 dicembre 2017

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara

F.to Andrea Marchi

Il segretario verbalizzante

F.to Mario Ori

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 4 gennaio 2018
