

CLMO/2023/13 del 28/7/2023

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

IL COORDINATORE
f.to Giacomo Vincenzi

CLMO/2023/13

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0007019 del 19/07/2023, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Giacomo Vincenzi.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA di MODENA	Braglia Fabio	Presidente	no	
Bastiglia	Silvestri Francesca	Sindaco	no	
Bomporto	Andrea Berselli	Assessore	si	1,3622
Campogalliano	Messori Marcello	Assessore	si	1,1779
Camposanto	Vincenzi Giacomo	Assessore	si	0,5681
Carpi	Malvezzi Paolo	Assessore	si	8,4563
Castelfranco Emilia	Gargano Giovanni	Sindaco	si	3,9973
Castelnuovo Rangone	Ferrari Matteo	Assessore	no	
Castelvetro di Modena	Mezzaqui Giorgia	Assessore	no	
Cavezzo	Fabrizio Trevisi	Assessore	si	0,9986
Concordia sulla Secchia	Prandini Luca	Sindaco	si	1,1307
Fanano	Muzzarelli Stefano	Sindaco	no	
Finale Emilia	Poletti Claudio	Sindaco	si	1,9201
Fiorano Modenese	Branduzzi Davide	Assessore	si	2,1419
Fiumalbo	Nizzi Alessio	Sindaco	no	
Formigine	Bosi Giulia Martina	Assessore	si	4,1614
Frassinoro	Capelli Oreste	Sindaco	no	
Guiglia	Costantini Umberto	Assessore	no	
Lama Mocogno	Pasini Giovanni Battista	Sindaco	no	
Maranello	Marsigliante Elisabetta	Assessore	si	2,1871
Marano sul Panaro	Galli Giovanni	Sindaco	si	0,8049
Medolla	Paltrinieri Franca	Assessore	no	
Mirandola	Greco Alberto	Sindaco	no	
Modena	Alessandra Filippi	Assessore	si	21,5871
Montecreto	Bonucchi Leandro	Sindaco	no	
Montefiorino	Paladini Maurizio	Sindaco	no	
Montese	Deluca Matteo	Sindaco	no	
Nonantola	Baccolini Tiziana	Assessore	si	2,0403
Novi di Modena	Diacci Enrico	Sindaco	si	1,3424
Palagano	Braglia Fabio	Sindaco	no	
Pavullo nel Frignano	Venturelli Davide	Sindaco	no	
Pievepelago	Ferroni Corrado	Sindaco	no	
Polinago	Magnani Simona	Sindaco	si	0,3730
Prignano sulla Secchia	Fantini Mauro	Sindaco	si	0,6247

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
Ravarino	Rebecchi Maurizia	Sindaco	si	0,9090
Riolunato	Contri Daniela	Sindaco	no	
San Cesario sul Panaro	Zuffi Francesco	Sindaco	no	
San Felice sul Panaro	Bocchi Giorgio	Assessore	si	1,4248
San Possidonio	Casari Carlo	Sindaco	si	0,5912
San Prospero	Borghi Sauro	Sindaco	si	0,8815
Sassuolo	Liberi Ugo	Assessore	si	4,8642
Savignano sul Panaro	Barani Elisa	Assessore	si	1,2769
Serramazzoni	Bartolacelli Claudio	Sindaco	no	
Sestola	Magnani Fabio	Sindaco	no	
Soliera	Mazzoni Katia	Assessore	si	1,9696
Spilamberto	Costantini Umberto	Sindaco	si	1,6748
Vignola	Paragliola Anna	Assessore	si	3,1500
Zocca	Ropa Federico	Sindaco	no	

Presenti n. 26 quote 71,6160

Assenti n. 22 quote 28,3840

Riconosciuta la validità della seduta Giacomo Vincenzi, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n. 5 del 2 marzo 2020 il Consiglio locale di Modena ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore Hera Spa;
- con deliberazione n. 19 del 20 giugno 2022 il Consiglio locale di Modena ha approvato la revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2022-2023 del Gestore Hera s.p.a.;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);

- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2022 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2022 dalla struttura tecnica di ATERSIR è stato rilasciato un solo nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Modena, rintracciabili al protocollo dell'Agenzia;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati superiori di + 963.144,62 € rispetto a quanto previsto nell'annualità 2022 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al +4%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 13 del 28/7/2023

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to . Marialuisa Campani

Bologna, 28/7/2023

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N. 18 del 20 giugno 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
1	2022MOHA0018	NUOVO DEPURATORE BOSCO ALBERGATI	D	Castelfranco Emilia	Gestore	3.900.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	ID STRETTAMENTE COLLEGATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ID 2014MOHA0010 IN QUANTO NEL 2022, A VALLE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA', E' STATO DECISO IN ACCORDO CON IL COMUNE, COME SOLUZIONE OTTIMALE, DI REALIZZARE UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' MOLINO ALBERGATI A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI CAVAZZONA E MANZOLINO (OGGI RECAPITANTI AL DEP. ESISTENTE) CON UN CONSEGUENTE MINOR IMPATTO IN TERMINI DI POTENZIAMENTO PROPRIO DELL'IMPIANTO ESISTENTE (IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTA' DI ESPANDERE TALE DEPURATORE PER VINCOLI PRESISTENTI NELLE AREE LIMITROFE). NEL 2022 LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SONO PRSEGUITE TUTTE SULL'ID 2014MOHA0010
2	2014MOHA0008	Collettamento di Piastrello al depuratore di Gaggio	F	Castelfranco Emilia	Gestore	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
3	2015MOHA0001	POTENZIAMENTO DORSALE VIA MUZZA CORONA	A	Castelfranco Emilia	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
4	2017MOHA0010	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI GAGGIO	D	Castelfranco Emilia	Gestore	590.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
5	2014MOHA0009	Studio e collettamento a idoneo trattamento delle frazioni di Recovato e Rastellino	F	Castelfranco Emilia	Gestore	998.000,00 €	647.000,00 €	- €	- €	647.000,00 €	495.812,36 €	- €	- €	495.812,36 €	151.187,64 €	-23	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENA AL 31/10/2023 SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' AVANZAMENTO CONTABILE DEL CANTIERE.
6	2022MOHA0014	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCOLMATORI AGGLOMERATO CASTELFRANCO	F	Castelfranco Emilia	Gestore	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
7	2020MOHA0007	RISANAMENTO DEI COLLETTORI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA FFSS MI-BO	F	Castelfranco Emilia	Gestore	300.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' AD EFFETTUARE IL RISANAMENTO CON TECNOLOGIA NO-DIG A CAUSA DELLA GEOMETRIA DELLE TUBAZIONI ESISTENTI. SONO ANCORA IN CORSO APPROFONDIMENTI PROGETTUALI PER CAPIRE COME RISOLVERE LA PROBLEMATICHE.
8	2020MOHA0008	REVAMPING PRETRATTAMENTO DEL DEPURATORE DI CASTELFRANCO	D	Castelfranco Emilia	Gestore	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
9	2014MOHA0010	Potenziamento del depuratore centralizzato	D	Castelfranco Emilia	Gestore	1.360.000,00 €	62.000,00 €	- €	- €	62.000,00 €	80.607,63 €	- €	- €	80.607,63 €	18.607,63 €	30	
10	2014MOHA0011	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	F	Castelfranco Emilia	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
11	2014MOHA0006	Potenziamento del sistema di disidratazione fanghi del depuratore del Capoluogo.	D	Castelfranco Emilia	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
12	2014MOHA0003	Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia I STRALCIO	A	Castelfranco Emilia	Gestore	455.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
13	2014MOHA0012	Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia II STRALCIO	A	Castelfranco Emilia	Gestore	445.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
14	2014MOHA0004	Revamping campo pozzi Via Muzza Corona	A	Castelfranco Emilia	Gestore	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2014MOHA0007	POTENZIAMENTO DELL'ASSETTO FOGNARIO ATTO AD AUMENTARE LA CAPACITA' DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	F	Castelfranco Emilia	Gestore	2.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
16	2014MOHA0005	Realizzazione e monitoraggio piezometri per protezione dinamica campo pozzi di via Ioda	A	Castelfranco Emilia	Gestore	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
17	2020MOHA0009	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CASTELNUOVO RANGONE	F	Castelnuovo Rangone	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
18	2014MOHA0013	Collettamento alla rete di San Vito di Spilamberto dell'agglomerato Oratorio di Sant'Anna	F	Castelnuovo Rangone	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
19	2015MOHA0002	NUOVO COLLEGAMENTO RETI DI PORTILE -V. VIAZZA	A	Castelnuovo Rangone	Gestore	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
20	2014MOHA0016	Collegamento Castelnuovo Martiniana con Serbatoio pensile di Castelnuovo	A	Castelnuovo Rangone	Gestore	880.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	112.860,12 €	- €	- €	112.860,12 €	92.860,12 €	464	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DELLE ANNULLITA' PRECEDENTI
21	2015MOHA0003	POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA -CAPOLUOGO	A	Castelvetro di Modena	Gestore	250.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	110.000,00 €	53.339,14 €	- €	- €	53.339,14 €	56.660,86 €	-51	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA NEL 2022. SCOSTAMENTO LEGATO ALL' AVANZAMENTO DEL CANTIERE. PREVISTA ULTIMAZIONE DELL' OPERA NEL 2023 COME PREVISTO A POI
22	2014MOHA0021	Nuovo serbatoio Bergognina	A	Castelvetro di Modena	Gestore	435.000,00 €	232.000,00 €	- €	- €	232.000,00 €	7.082,56 €	- €	- €	7.082,56 €	224.917,44 €	-96	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO A PROBLEMATICHE CON L' IMPRESA CHE SI E' AGGIUDICATA LA GARA D'APPALTO. SI STA PROCEDENDO ALLA RESCSSIONE DEL CONTRATTO
23	2015MOHA0004	NUOVO COLLEG. SERB. GALLO - POGGIOLI	A	Castelvetro di Modena	Gestore	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
24	2014MOHA0028	Collettamento reflui di Levizzano al depuratore del capoluogo	F	Castelvetro di Modena	Gestore	310.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
25	2014MOHA0023	Nuovo pozzo Sant'Eusebio	A	Castelvetro di Modena	Gestore	317.000,00 €	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	2.057,80 €	- €	- €	2.057,80 €	21.942,20 €	-91	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL PERSISTERE DELLE PROBLEMATICHE CON I PROPRIETARI PER L' ACQUISIZIONE DELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA E CIO' HA FATTO RALLENTARE IL PROSEGUO DEL PROGETTO CHE ATTUALEMNT E RISULTA SOSPESO
26	2020MOHA0029	OPERE DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DEL RIO SPEZZANO IN LOCALITA' UBERSETTO (SECONDO STRALCIO)	F	Fiorano Modenese	Gestore	310.000,00 €	- €	124.000,00 €	- €	124.000,00 €	263,73 €	124.391,46 €	- €	124.127,73 €	263,73 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI INCASSATO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
27	2020MOHA0010	POTENZIAMENTO SISTEMA DI DEFLUSSO LOCALITA' UBERSETTO	F	Fiorano Modenese	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
28	2014MOHA0026	Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di Magreta	A	Formigine	Gestore	660.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
29	2015MOHA0006	NUOVO COLLEGAMENTO IMPIANTO TOMMASELLI - IMPIANTO S.GAETANO	A	Formigine	Gestore	550.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N. 18 del 20 giugno 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura							25.134.000,00	1.709.000,00	-	23.425.000,00	26.097.144,62	1.969.708,06	-	24.127.436,56			

Legenda: A = acquedotto D = depurazione
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti
ST=struttura

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2022
GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: MODENA**

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2022, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.5 del 2 marzo 2020, successivamente aggiornato con delibera n.18 del 20 giugno 2022, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	23.425.000,00 €	24.127.436,56 €	702.436,56 €	3%
SOCIETA' TERZE	- €	- €	- €	0%
FONDO PERDUTO	1.709.000,00 €	1.969.708,06 €	260.708,06 €	15%
TOTALE	25.134.000,00 €	26.097.144,62 €	963.144,62 €	4%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Gli investimenti di struttura per l'anno 2022 non sono ancora stati rendicontati (max. 2.020.583,00 € euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 4%.



Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si notano maggiori investimenti nel comparto acquedottistico rispetto al comparto fognario-depurativo sostanzialmente in linea con il programmato. Si registrano alcuni ritardi nelle fase di progettazione e per ridefinizione di alcune priorità a fronte di nuove esigenze.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	16.481.000,00 €	17.564.887,75 €	1.083.887,75 €	7%
DEPURAZIONE	2.858.000,00 €	2.929.557,73 €	71.557,73 €	3%
FOGNATURA	5.620.000,00 €	5.554.083,11 €	- 65.916,89 €	-1%
ACQUE BIANCHE	175.000,00 €	48.616,03 €	- 126.383,97 €	-72%
Totale	25.134.000,00 €	26.097.144,62 €	963.144,62 €	4%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

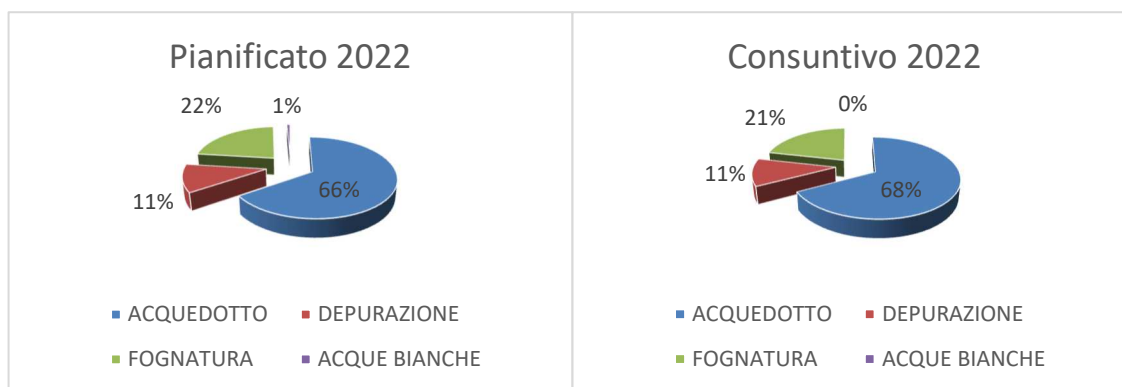


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2022 per servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA €	DIFF %
ACQUEDOTTO	10.490.000,00 €	12.549.734,02 €	2.059.734,02 €	19,64%
DEPURAZIONE	1.383.000,00 €	1.413.130,19 €	30.130,19 €	2,18%
FOGNATURA	1.230.000,00 €	2.330.796,50 €	1.100.796,50 €	89,50%
ACQUE BIANCHE	175.000,00 €	48.616,03 €	-126.383,97 €	72,22%
TOTALE	13.278.000,00 €	16.342.276,74 €	3.064.276,74 €	23,08%

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno. Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).

.CLASSI D'IMPORTO	NUMERO	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	64	15.119.000,00 €	15.449.597,65 €	330.597,65 €	2%
500.001- 1.000.000 €	15	2.912.000,00 €	2.119.883,00 €	792.117,00 €	-27%
1.000.001- 2.000.000 €	11	2.402.000,00 €	1.985.381,31 €	416.618,69 €	-17%
2.000.001- 5.000.000 €	4	201.000,00 €	107.275,90 €	93.724,10 €	-47%
Oltre 5.000.000 €	1	27.000,00 €	154.770,21 €	127.770,21 €	473%
Manutenzioni	8	4.473.000,00 €	6.280.236,55 €	1.807.236,55 €	40%
TOTALE	103	25.134.000,00 €	26.097.144,62 €	963.144,62 €	4%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.

- Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 92
- Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2022: 84.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2022
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%), cd "non avviati"	21	2.685.583,00 €	- 4.736,56 €
Interventi con un valore pianificato pari a 0 e un valore consuntivato diverso da 0 (+100%)	11	- €	1.121.802,02 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	59	17.824.000,00 €	18.535.569,56 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	96	6.645.000,00 €	6.444.509,60 €

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022
1	2022MOHA0018	NUOVO DEPURATORE BOSCO ALBERGATI	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia	Gestore	3.900.000,00 €	10.000,00 €
2	2020MOHA0007	RISANAMENTO DEI COLLETTORI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA FFSS MI-BO	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	300.000,00 €	50.000,00 €
3	2017MOHA0006	NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-SANTONA	ACQUEDOTTO	Lama Mocogno	Gestore	100.000,00 €	50.000,00 €
4	2017MOHA0014	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE PRADELLA	FOGNATURA	Modena	Gestore	205.000,00 €	20.000,00 €
5	2014MOHA0060	ADEGUAMENTO AL D.LGS.152 DELLA SEDIMENTAZIONE FINALE DEL DEPURATORE	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	838.000,00 €	9.000,00 €
6	2014MOHA0118	RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI SERBATOI PER LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE IN RETE IN AREE DI MONTAGNA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00 €	100.000,00 €
7	2020MOHA0004	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 4 MO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00 €
8	2020MOHA0003	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 4 MO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		5.000,00 €
9	2014MOHA0119	RIPRISTINO ASFALTI PER OPERE DI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		50.000,00 €
10	2022MOHA0012	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 4	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		50.000,00 €
11	2020MOHA0006	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 4 MO	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore		15.000,00 €
12	2017MOHA0011	ADEG.AGGLOMERATO DI PALAGANO MONTE	FOGNATURA	Palagano	Gestore	215.000,00 €	- €
13	2014MOHA0159	REALIZZAZIONE DI COLLETTORI E SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO A COSCOGNO	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	Gestore	563.000,00 €	20.000,00 €
14	2022MOHA0008	REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE AFFERENTE LO SCOLO COGORNO	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	Gestore	762.000,00 €	10.000,00 €
15	2014MOHA0179	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA A SERVIZIO DEGLI SCOLMATORI A FORTE IMPATTO SAS1-1 E SAS1-3	FOGNATURA	Sassuolo	Gestore	2.500.000,00 €	56.000,00 €
16	2020MOHA0022	ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLACQUEDOTTO NELLE VIE GANDHI E MANELLE NEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	Gestore	90.000,00 €	85.000,00 €
17	2014MOHA0192	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E TRATTAMENTO APPROPRIATO NELL'AGGLOMERATO DI VILLAGGIO CASELLETTE	FOGNATURA	Serramazzoni	Gestore	100.000,00 €	15.000,00 €
18	2014MOHA0190	REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO NELL'AGGLOMERATO DI LA BARBONA	FOGNATURA	Serramazzoni	Gestore	50.000,00 €	10.000,00 €
19	2017MOHA0015	NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO MONTARDONE	ACQUEDOTTO	Serramazzoni	Gestore	255.000,00 €	50.000,00 €
20	2014MOHA0205	REALIZZAZIONE NUOVO POMPAGGIO COCCOLA PER SANT'EUSEBIO	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	50.000,00 €	50.000,00 €

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Giacomo Vincenzi

Il segretario verbalizzante
F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Vito Belladonna

Bologna, 29 agosto 2023
