

CLMO/2022/25 del 23 novembre 2022

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2021 - Gestore Sorgeaqua s.r.l..**

LA COORDINATRICE

F.to Patrizia Sgarbi

CLMO/2022/25

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di novembre alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011497 del 15/11/2022, in seduta telematica. Assume la presidenza la Coordinatrice Patrizia Sgarbi.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA di MODENA	Lagazzi Iacopo	Presidente	si	10,0000
Bastiglia	Silvestri Francesca	Sindaco	si	0,6664
Bomporto	Andrea Berselli	Assessore	si	1,3622
Campogalliano	Messori Marcello	Assessore	si	1,1779
Camposanto	Zaniboni Monja	Sindaco	no	
Carpi	Righi Riccardo	Assessore	si	8,4563
Castelfranco Emilia	Gargano Giovanni	Sindaco	si	3,9973
Castelnuovo Rangone	Ferrari Matteo	Assessore	no	
Castelvetro di Modena	Amico Ernesto Maria	Assessore	si	1,4825
Cavezzo	Fabrizio Trevisi	Assessore	no	
Concordia sulla Secchia	Prandini Luca	Sindaco	si	1,1307
Fanano	Muzzarelli Stefano	Sindaco	no	
Finale Emilia	Poletti Claudio	Sindaco	no	
Fiorano Modenese	Branduzzi Davide	Assessore	si	2,1419
Fiumalbo	Nizzi Alessio	Sindaco	no	
Formigine	Bosi Giulia Martina	Assessore	si	4,1614
Frassinoro	Capelli Oreste	Sindaco	no	
Guiglia	Lagazzi Iacopo	Sindaco	si	0,6563
Lama Mocogno	Pasini Giovanni Battista	Sindaco	no	
Maranello	Marsigliante Elisabetta	Assessore	si	2,1871
Marano sul Panaro	Galli Giovanni	Sindaco	si	0,8049
Medolla	Patrizia Sgarbi	Assessore	si	0,9196
Mirandola	Greco Alberto	Sindaco	no	
Modena	Alessandra Filippi	Assessore	si	21,5871
Montecreto	Bonucchi Leandro	Sindaco	no	
Montefiorino	Paladini Maurizio	Sindaco	no	
Montese	Deluca Matteo	Sindaco	no	
Nonantola	Tiziana Baccolini	Assessore	si	2,0403
Novi di Modena	Fabbi Mauro	Assessore	si	1,3424
Palagano	Braglia Fabio	Sindaco	no	
Pavullo nel Frignano	Claudia Piacentini	Assessore	si	2,2696
Pievepelago	Ferroni Corrado	Sindaco	no	
Polinago	Tomei Gian Domenico	Sindaco	no	
Prignano sulla Secchia	Fantini Mauro	Sindaco	no	
Ravarino	Rebecchi Maurizia	Sindaco	si	0,9090

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
Riolunato	Contri Daniela	Sindaco	no	
San Cesario sul Panaro	Zuffi Francesco	Sindaco	no	
San Felice sul Panaro	Bocchi Giorgio	Assessore	si	1,4248
San Possidonio	Fregni Giulio	Assessore	si	0,5912
San Prospero	Borghi Sauro	Sindaco	no	
Sassuolo	Liberi Ugo	Assessore	si	4,8642
Savignano sul Panaro	Barani Elisa	Assessore	si	1,2769
Serramazzoni	Bartolacelli Claudio	Sindaco	no	
Sestola	Magnani Fabio	Sindaco	no	
Soliera	Mazzoni Katia	Assessore	si	1,9696
Spilamberto	Costantini Umberto	Sindaco	si	1,6748
Vignola	Paragliola Anna	Assessore	si	3,1500
Zocca	Ropa Federico	Sindaco	no	
Totale				82,2444

Presenti n. 26 quote 82,2444

Assenti n. 22 quote 17,7556

Riconosciuta la validità della seduta la dott.ssa. Patrizia Sgarbi, in qualità di Coordinatrice del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2021 - Gestore Sorgeaqua s.r.l.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n. 6 del 2 marzo 2020 il Consiglio locale di Modena ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore Sorgeaqua s.r.l.;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore Sorgeaqua s.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2021 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2021 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta ai sensi della deliberazione C.A.M.B. n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Modena, e pertanto non sono presenti interventi che necessitino di ratifica da parte del Consiglio locale;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati superiore di 638.982,61 € rispetto a quanto previsto nell'annualità 2021 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al +52%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.26**, quote 82,2444, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua s.r.l. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 25 del 23 novembre 2022

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2021 - Gestore Sorgeacqua s.r.l..**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 23 novembre 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2021**

GESTORE: SORGEAQUA s.r.l.

BACINO PROVINCIALE DI: BOLOGNA e MODENA

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.6 del 2 marzo 2020, che il gestore SORGEAQUA s.r.l. ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF%
GESTORE	944.500,00 €	1.722.183,11 €	777.683,11 €	82%
SOCIETA' TERZE	- €	- €	- €	0%
FONDO PERDUTO	289.500,00 €	150.799,50 €	-138.700,50 €	-48%
TOTALE	1.234.000,00 €	1.872.982,61 €	638.982,61 €	52%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Gli investimenti di struttura per l'anno 2021 rendicontati ammontano a 94.675,13 euro (max. 20.000 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti superiore rispetto al pianificato per circa il 52% .

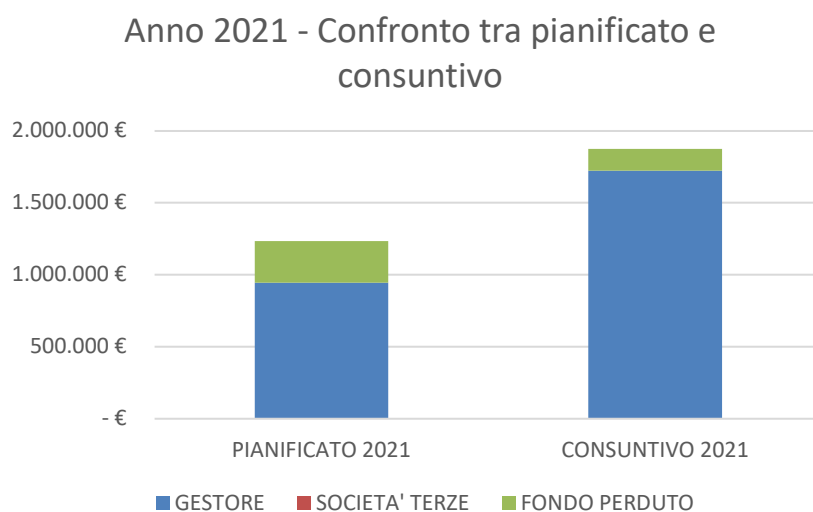


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota maggiori investimenti nel comparto acquedottistico rispetto al comparto fognario-depurativo. Si registrano maggiori investimenti rispetto al pianificato soprattutto a seguito di maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Non si rilevano ritardi particolari sugli interventi; l'unico intervento non avviato è un intervento oggetto di rimodulazione nel programma di finanziamento FSC 2014-2020 che è stato cancellato e le risorse trasferite sull'intervento di rinnovo delle reti su tutti i comuni gestiti.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	849.000,00 €	1.387.671,15 €	538.671,15 €	63%
DEPURAZIONE	320.000,00 €	347.445,91 €	27.445,91 €	9%
FOGNATURA	65.000,00 €	136.849,71 €	71.849,71 €	111%
TUTTI		1.015,84 €	1.015,84 €	0%
Totale	1.234.000,00 €	1.872.982,61 €	638.982,61 €	52%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

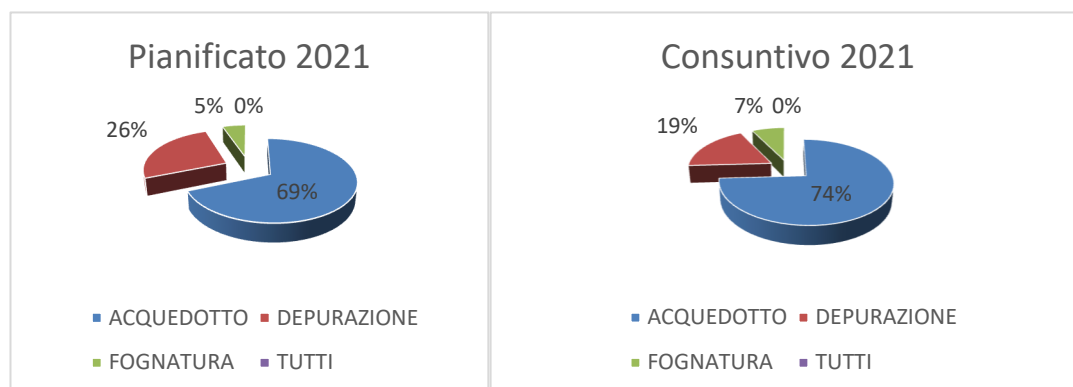


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2021 per servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	285.000,00 €	396.258,46 €	111.258,46 €	39,04%
FOGNATURA	65.000,00 €	136.849,71 €	71.849,71 €	110,54%
DEPURAZIONE	50.000,00 €	102.281,34 €	52.281,34 €	104,56%
TOTALE	400.000,00 €	635.389,51 €	235.389,51 €	58,85%

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno. Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).

.Classi d'importo	Numero	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	20	834.000,00 €	1.237.593,10 €	403.593,10 €	48%
500.001- 1.000.000 €	-	- €	- €	- €	0%
1.000.001- 2.000.000 €	-	- €	- €	- €	0%
2.000.001- 5.000.000 €	-	- €	- €	- €	0%
Oltre 5.000.000 €	-	- €	- €	- €	0%
Manutenzioni	7	400.000,00 €	635.389,51 €	235.389,51 €	59%
TOTALE	27	1.234.000,00 €	1.872.982,61 €	638.982,61 €	52%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.

- Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 34
- Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2021: 51.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)	1	239.000,00 €	- €
Interventi con avvio anticipato nel 2021 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)	3	- €	556.789,17 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	31	964.000,00 €	1.687.665,19 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	21	290.000,00 €	279.992,55 €

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021
1	2017BOSA0001	Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli - FSC SCHEDA 33	A	Crevalcore	Gestore	280.000,00	239.000,00

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N. 6 del 2 marzo 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		Colonna4
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	
1	2014BOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	A	Crevalcore	Gestore	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	50.285,82 €	- €	- €	50.285,82 €	9.714,18 €	-16	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2	2014BOSA0002	Rifacimento allacci utenza	A	Crevalcore	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	85.719,26 €	- €	- €	85.719,26 €	- 65.719,26 €	328	maggiore necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
3	2014BOSA0003	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Crevalcore	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	44.054,21 €	- €	- €	44.054,21 €	- 29.054,21 €	193	maggiore necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
4	2014BOSA0004	Sostituzione contatori d'utenza	A	Crevalcore	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	29.243,13 €	- €	- €	29.243,13 €	- 14.243,13 €	94	maggiore necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
5	2014BOSA0005	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Crevalcore	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	15.976,52 €	- €	- €	15.976,52 €	- 5.976,52 €	59	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
6	2014BOSA0006	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	26.765,64 €	- €	- €	26.765,64 €	- 16.765,64 €	167	maggiore necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
7	2014BOSA0007	Rifacimento allacci di utenza	A	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	35.529,80 €	- €	- €	35.529,80 €	- 20.529,80 €	136	maggiore necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
8	2014BOSA0008	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	14.371,54 €	- €	- €	14.371,54 €	- 4.371,54 €	43	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
9	2014BOSA0009	Sostituzione contatori di utenza	A	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	8.536,63 €	- €	- €	8.536,63 €	1.463,37 €	-14	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
10	2014BOSA0010	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	A	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	43.936,78 €	4.224,00 €	- €	39.712,78 €	- 3.936,78 €	9	
11	2014BOSA0011	Adeguamento scarichi fognari (2 stralci funzionali)	F	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
12	2014BOSA0012	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	A	Crevalcore	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
13	2014MOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	A	Finale Emilia	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	20.405,38 €	- €	- €	20.405,38 €	29.594,62 €	-59	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
14	2014MOSA0002	Rifacimento allacci di utenza	A	Finale Emilia	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	81.913,56 €	- €	- €	81.913,56 €	- 61.913,56 €	309	maggiore necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
15	2014MOSA0003	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Finale Emilia	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	31.772,26 €	- €	- €	31.772,26 €	- 21.772,26 €	217	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
16	2014MOSA0004	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Finale Emilia	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	18.165,13 €	- €	- €	18.165,13 €	- 3.165,13 €	21	
17	2014MOSA0005	Sostituzione contatori di utenza	A	Finale Emilia	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	55.000,66 €	- €	- €	55.000,66 €	- 35.000,66 €	175	maggiore necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
18	2014MOSA0008	Rifacimento allacci di utenza	A	Nonantola	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	51.548,53 €	- €	- €	51.548,53 €	- 31.548,53 €	157	maggiore necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
19	2014MOSA0009	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Nonantola	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	31.011,44 €	6.450,00 €	- €	24.561,44 €	- 16.011,44 €	106	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
20	2014MOSA0010	Sostituzione contatori di utenza	A	Nonantola	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	17.163,33 €	- €	- €	17.163,33 €	2.836,67 €	-14	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
21	2014MOSA0011	Realizzazione rete fognaria e depuratore a servizio dell'agglomerato di Campazzo, di Case Ponte Fossa e della zona di via Giorgina	D	Nonantola	Gestore	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	15.160,95 €	- €	- €	15.160,95 €	54.839,05 €	-78	realizzazione ultimo stralcio rinviato al 1° trim. 2023
22	2014MOSA0012	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	A	Nonantola	Gestore	- €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	27.751,09 €	1.425,00 €	- €	26.326,09 €	12.248,91 €	-30	minor necessità di manutenzioni rilevata in fase esecutiva
23	2014MOSA0013	Collegamento rete fognaria di Gazzate col depuratore del capoluogo	F	Nonantola	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
24	2014MOSA0014	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Nonantola	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	34.001,24 €	- €	- €	34.001,24 €	- 24.001,24 €	240	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
25	2014MOSA0015	Rifacimento allacci di utenza	A	Ravarino	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	40.662,70 €	- €	- €	40.662,70 €	- 25.662,70 €	171	maggiore necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
26	2014MOSA0016	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Ravarino	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	16.853,29 €	- €	- €	16.853,29 €	- 6.853,29 €	68	maggiore necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
27	2014MOSA0017	Sostituzione contatori di utenza	A	Ravarino	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	8.768,67 €	- €	- €	8.768,67 €	1.231,33 €	-12	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
28	2014MOSA0018	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Ravarino	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	6.159,78 €	- €	- €	6.159,78 €	3.840,22 €	-38	minor necessità di manutenzioni rilevata in fase esecutiva
29	2014MOSA0019	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	A	Ravarino	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	6.118,35 €	- €	- €	6.118,35 €	23.881,65 €	-79	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
30	2014MOSA0020	Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	30.832,13 €	- €	- €	30.832,13 €	- 832,13 €	2	
31	2014MOSA0021	Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	216.928,91 €	- €	- €	216.928,91 €	- 181.928,91 €	519	maggiore lavorazioni impreviste per rotture su condotte adduttrici
32	2014MOSA0022	Nuovi allacci all'utenza	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	120.469,19 €	103.700,50 €	- €	16.768,69 €	- 469,19 €	0	
33	2014MOSA0023	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	A	Finale Emilia	Gestore	1.350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
34	2014MOSA0024	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	A	Nonantola	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
35	2014MOSA0025	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	A	Ravarino	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
36	2016BOSA0001	Adeguamento depuratore di Bevilacqua	D	Crevalcore	Gestore	372.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	1.507,80 €	- €	- €	1.507,80 €	198.492,20 €	-99	intervento posticipato al 2022
37	2017BOSA0001	Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli - FSC SCHEDA 33	A	Crevalcore	Gestore	280.000,00 €	239.000,00 €	169.500,00 €	- €	69.500,00 €	- €	- €	- €	- €	239.000,00 €		id cancellato e rimodulato su id 2019MOSA0001
38	2018MOSA0001	Nuovo gestionale per monitoraggio e raccolta dati di qualità tecnica	TT	Opere Pluricomunali	Gestore	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.015,84 €	- €	- €	1.015,84 €	1.015,84 €		0
39	2018MOSA0002	Sostituzione contatori di processo	A	Opere Pluricomunali	Gestore	65.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	186,48 €	- €	- €	186,48 €	9.813,52 €		intervento concluso nel corso del 2020
40	2018MOSA0003	Investimenti di struttura	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	94.675,13 €	- €	- €	94.675,13 €	74.675,13 €		conclusione redazione SIT reti SII ed acquisto strumentazione per rilevazione perdite idriche
41	2019MOSA0001	Sostituzione di reti idriche nei comuni gestiti da Sorgeacqua	A	Opere Pluricomunali	Gestore	423.700,00 €	- €	- €	- €	- €	327.277,51 €	35.000,00 €	- €	292.277,51 €	327.277,51 €		interventi di sostituzione reti realizzati con contributo del fondo FSC e precedentemente previsti con ID specifici per Comune (ex 2014MOSA0001, 2014MOSA0012, 2014BOSA0010)
42	2020BOSA0001	Adeguamento funzionale depuratore capoluogo	D	Sant'Agata Bolognese	Gestore	460.000,00 €	- €	- €	- €	- €	228.495,82 €	- €	- €	228.495,82 €	228.495,82 €		conclusione intervento posticipata dal 2020 al 2021
43	2020BOSA0002	Ristrutturazione serbatoio pensile di Sant'Agata B.se	A	Sant'Agata Bolognese	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
44	2020MOSA0001	Ristrutturazione centrale acquedottistica di Finale Emilia	A	Finale Emilia	Gestore	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
45	2020MOSA0002	Ristrutturazione serbatoio pensile di via Respighi Nonantola	A	Nonantola	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
46	2020MOSA0003	Adeguamento distretti di rete	A	Opere Pluricomunali	Gestore	40.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	88.569,38 €	- €	- €	88.569,38 €	73.569,38 €		maggiore necessità di lavorazioni rilevata in fase esecutiva
47	2020MOSA0004	Adeguamento sistema di telecontrollo	A	Opere Pluricomunali	Gestore	55.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	40.823,86 €	- €	- €	40.823,86 €	25.823,86 €		maggiore necessità di lavorazioni rilevata in fase esecutiva
48	2020MOSA0005	Ristrutturazione serbatoio pensile di Crevalcore	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
49	2020MOSA0006	Ristrutturazione serbatoio pensile di Ravarino	A	Ravarino	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
50	2020MOSA0007	Adeguamento funzionale depuratore capoluogo	D	Ravarino	Gestore	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N. 6 del 2 marzo 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Colonna4
51	2020MOSA0008	Adeguamento funzionale depuratore Casoni	D	Ravarino	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
52	2022MOSA0001	Perforazione nuovo pozzo 16 e chiusura pozzo 5, Castelfranco Emilia	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
Totale							1.254.000,00 €	289.500,00 €	- €	964.500,00 €	1.967.657,74 €	150.799,50 €	- €	1.816.858,24 €	250.430,30 €		

	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	1.254.000,00	289.500,00	-	964.500,00	1.967.657,74	150.799,50	-	1.816.858,24	151,8%
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	1.234.000,00	289.500,00	-	944.500,00	1.872.982,61	150.799,50	-	1.722.183,11	

Legenda: A = acquedotto D = depurazione
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti
ST=struttura

Approvato e sottoscritto

La Coordinatrice
F.to Patrizia Sgarbi

Il segretario verbalizzante
F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 maggio 2023
