

CLMO/2021/2 del 26 aprile 2021

**CONSIGLIO LOCALE DI MODENA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019  
per il gestore HERA s.p.a..**

IL COORDINATORE  
F.to Enrico Diacci

CLMO/2021/2

**CONSIGLIO LOCALE DI MODENA**

L'anno **2021** il giorno 26 del mese di aprile alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio Locale di Modena, convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0003847 del 20/04/2021, in seduta telematica.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA	Tomei Gian Domenico	Presidente	SI	10,0000
BASTIGLIA				0,6622
BOMPORTO	Mandrioli Marcello	Assessore	SI	1,3444
CAMPOGALLIANO	Messori Marcello	Assessore	SI	1,1971
CAMPOSANTO	Zaniboni Monja	Sindaco	SI	0,5660
CARPI	Righi Riccardo	Assessore	SI	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Gargano Giovanni	Sindaco	SI	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE	Solignani Stefano	Assessore	SI	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA	Amico Maria Ernesto	Assessore	SI	1,4922
CAVEZZO	Trevisi Fabrizio	Assessore	SI	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA	Prandini Luca	Sindaco	SI	1,2507
FANANO				0,5491
FINALE EMILIA				2,0474
FIORANO MODENESE	Branduzzi Davide	Assessore	SI	2,1929
FIUMALBO				0,3455
FORMIGINE	Bosi Martini Giulia	Assessore	SI	4,1680
FRASSINORO				0,4274
GUIGLIA	Lagazzi Iacopo	Sindaco	SI	0,6638
LAMA MOCOGNO	Pasini Giovanni	Sindaco	SI	0,5274
MARANELLO	Marsigliante Elisabetta	Assessore	SI	2,1548
MARANO SUL PANARO				0,7569
MEDOLLA	Calciolari Alberto	Sindaco	SI	0,9382

MIRANDOLA				3,0215
MODENA	Filippi Alessandra	Assessore	SI	21,3515
MONTECRETO				0,3096
MONTEFIORINO				0,4576
MONTESE	DeLuca Matteo	Sindaco	SI	0,5880
NONANTOLA				1,9843
NOVI DI MODENA	Diacci Enrico	Sindaco	SI	1,4874
PALAGANO				0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Muzzarelli Gian Luca	Assessore	SI	2,2228
PIEVEPELAGO				0,4562
POLINAGO	Tomei Gian Domenico	Sindaco	SI	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA	Fantini Mauro	Sindaco	SI	0,6371
RAVARINO				0,9197
RIOLUNATO	Rocchi Giordano	Assessore	SI	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Pancaldi Fabrizio	Assessore	SI	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Bocchi Giorgio	Assessore	SI	1,4938
S.POSSIDONIO	Casari Carlo	Sindaco	SI	0,6192
S.PROSPERO				0,8814
SASSUOLO	Liberi Ugo	Assessore	SI	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO	Barani Elisa	Assessore	SI	1,2871
SERRAMAZZONI	Gorrieri Daniele	Assessore	SI	1,1381
SESTOLA				0,4988
SOLIERA	Mazzoni Katia	Assessore	SI	1,9704
SPILAMBERTO	Costantini Umberto	Sindaco	SI	1,6242
VIGNOLA	Paragliola Anna	ViceSindaco	SI	3,0669
ZOCCA				0,7682

Presenti n. 32 pari a quote 85,445 Assenti n. 16 pari a quote 14,555

Riconosciuta la validità della seduta Enrico Diacci in qualità di Coordinatore assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019 per il gestore HERA s.p.a..**

**Visti:**

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

**premesse che:**

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d’Ambito l’approvazione del Piano d’Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d’Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

**considerato che:**

- con deliberazione n. 11 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;
- con deliberazione n. 49 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n.6 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
  - o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
  - o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

**dato atto** che il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;

**rilevato** che:

- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2019 risultano superiori a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate tutte ammissibili;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ritenuto** pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che il verbale della seduta è depositato agli atti;

con **voti** resi nelle forme di legge

**favorevoli** Comuni (32) per quote pari a 85,445,

**contrari** Comuni (0),

**astenuti** Comune (0),

## **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019**

**GESTORE: HERA S.P.A.  
BACINO TARIFFARIO: MODENA**

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.12 del 3 Dicembre 2015, aggiornato poi con Delibera del Consiglio Locale di Modena n. 7 del 21 Luglio 2017, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
GESTORE HERA	€ 17.344.000	€ 17.831.134	€ 487.134	3%
INVESTITORI TERZI	€ 0	€ 0	€ 0	
FONDO PERDUTO	€ 455.000	€ 882.331	€ 427.331	94%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.799.000</b>	<b>€ 18.713.465</b>	<b>€ 914.465</b>	<b>5%</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2019 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa un 5 %, all'interno del quale però pesa per circa una metà anche l'incasso di maggiori contributi rispetto quelli programmati.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

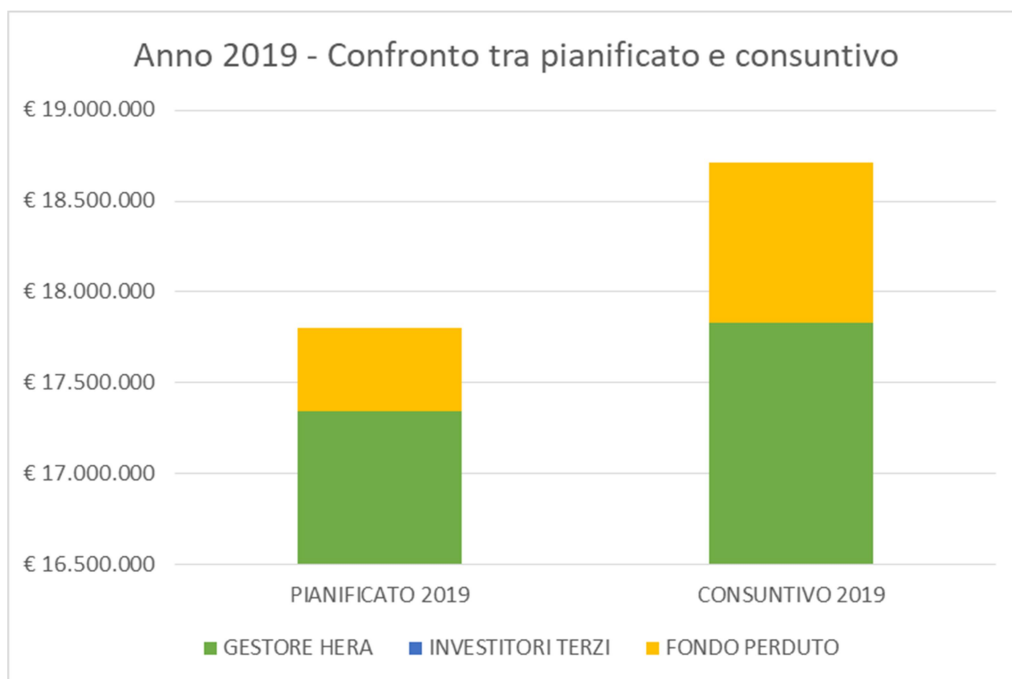


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

## ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota come la maggior parte degli interventi sono nel comparto acquedotto, all'interno del quale il gestore in termini di percentuale ha investito il 12% in più di quanto programmato.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
ACQUEDOTTO	€ 11.808.000	€ 13.228.884	€ 1.420.884	12%
DEPURAZIONE	€ 2.277.000	€ 2.345.788	€ 68.788	3%
FOGNATURA	€ 3.714.000	€ 3.138.792	-€ 575.208	-15%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.799.000</b>	<b>€ 18.713.465</b>	<b>€ 914.465</b>	<b>5%</b>

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella di seguito riportata sintetizza invece lo scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato.

COD	TIPOLOGIA	Numero	Importo Lordo Pianificato nel 2019 [€]	Importo Lordo a consuntivo nel 2019 [€]
1a	Interventi <b>non avviati</b> (% di scostamento pari al -100%)	33	€ 1.815.000	-€ 724
1b	Interventi <b>non avviati</b> dalle scorse annualità (con importo pianificato pari a zero nel 2019)	0	€ 0	€ 0
2a	Interventi con <b>avvio anticipato</b> nel 2019 (già presenti nel POI o nel Piano d'Ambito)	23	€ 0	€ 1.697.836
2b	<b>Chiusure di Interventi</b> già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	8	€ 0	€ 724.548
3	Interventi avviati nel 2019 che <b>non erano contenuti nel Piano d'Ambito</b> - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0
4	Interventi con <b>scostamento</b> del rendicontato rispetto al pianificato <b>superiore al + o - 20%</b>	39	€ 9.086.000	€ 9.131.984
5	Interventi con <b>scostamento</b> del rendicontato rispetto al pianificato <b>inferiore al + o - 20%</b>	5	€ 6.898.000	€ 7.159.820
	<b>TOTALE</b>	<b>108</b>	<b>€ 17.799.000</b>	<b>€ 18.713.465</b>

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato



Dalla tabella risulta quanto segue:

- Il gestore nel 2019 non ha avviato 33 interventi che invece erano stati programmati e per essi ha addotto delle motivazioni che sono riportate all'interno dell'allegato 1 al presente documento;
- il gestore ha rendicontato nel 2019 un totale di 75 interventi (categorie 2a, 2b, 4 e 5);
- vi sono n.ro 23 interventi con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a) che economicamente fanno un po' da pari con quelli che invece il gestore non ha avviato (1a) e ci sono invece 8 interventi (2b) che rappresentano delle "code" di interventi già terminati e per i quali quindi il gestore in sede di programmazione non aveva imputato alcuna somma.

Inoltre si può notare come rispetto ai 75 interventi che il gestore ha rendicontato, il 52 % di questi (39 interventi) abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno (4).

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi.

	<b>PIANIFICATO 2019</b>	<b>CONSUNTIVO 2019</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFFERENZA %</b>
< 500.000	€ 1.549.000	€ 1.744.258	€ 195.258	13%
500k - 1.000k	€ 1.657.000	€ 1.491.139	-€ 165.861	-10%
1.000k - 2.000k	€ 1.945.000	€ 510.540	-€ 1.434.460	-74%
2.000k - 5.000k	€ 750.000	€ 191.957	-€ 558.043	-74%
>5.000k	€ 50.000	€ 0	-€ 50.000	-100%
MANUTENZIONI	€ 11.848.000	€ 14.775.571	€ 2.927.571	25%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.799.000</b>	<b>€ 18.713.465</b>	<b>€ 914.465</b>	<b>5%</b>

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Si nota che i maggiori scostamenti sono riconducibili a interventi con fascia di importo progettuale medio alta, ovvero superiore a 1 milione di euro, molto probabilmente perché trattandosi di interventi che hanno una certa complessità è anche più probabile che siano soggetti a numerosi permessi che quindi ne comportano ritardi che in fase di programmazione annuale è difficile prevedere.

Altro dato che si può osservare è che gli importi consuntivati sulle voci cumulative di manutenzioni straordinarie compensano in buona parte gli altri ritardi attribuibili ai singoli interventi specifici.



## ALLEGATO 1

HERA SpA  
Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Modena

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA MODENA ANNO 2019					
							PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTAMENTO
2014MOHA0028	Realizzazione di trattamento appropriato agli agglomerati Fontanalucce	FOGNATURA	ATO4 - MO	736.000,00	Gestore	Frassinoro	0,00	0		0,00	10.359,02	0		10.359,02	100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AI RITARDI DOVUTI A ITER AUTORIZZATIVO PARTICOLARMENTE LUNGO (AVVIATO A MARZO 2017 CON APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN ATERSIR A MAGGIO 2019). LA NUOVA NUOVA PIANIFICAZIONE RISULTA COERENTE CON LE SCADENZE DELLA DGR 201/2016
2014MOHA0029	Realizzazione di trattamento appropriato Case Cerbiani	FOGNATURA	ATO4 - MO	142.000,00	Gestore	Frassinoro	15.000,00	0		15.000,00	0,00	0		0,00	-100	AGGLOMERATO < 200 AE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA POSTICIPATA IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019. LA NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24
2014MOHA0033	Magliature con Rosola	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	200.000,00	Gestore	Guiglia	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2014MOHA0030	AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI GUIGLIA LAM	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	1.125.000,00	Gestore	Guiglia	100.000,00	0		100.000,00	76.345,55	0		76.345,55	-23	SCOSTAMENTO 2019 CAUSATO DALLA PRESENZA DI UNA FAGLIA NELLA POSIZIONE INDIVIDUATA PER L' IMPIANTO. SI E' DOVUTA CERCARE, CON IL SUPPORTO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UNA POSIZIONE ALTERNATIVA. E' SEGUITO UN LUNGO PERCORSO DI CONDIVISIONE CHE HA PORTATO PERO' ALLA NECESSITA' DI AVVIARE UN ITER ESPROPRIATIVO (TUTT' ORA IN CORSO)
2014MOHA0031	Nuovo sollevamento località Cà Baldini e collegamento Casa Togno e B	FOGNATURA	ATO4 - MO	60.000,00	Gestore	Guiglia	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2014MOHA0032	COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI MONTEORSELLO AL DEPUR	FOGNATURA	ATO4 - MO	330.000,00	Gestore	Guiglia	0,00	0		0,00	31.882,91	0		31.882,91	100	INTERVENTO TERMINATO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENTE ALLO SLITTAMENTO DELL' INIZIO DELL' INTERVENTO GIA' MOTIVATO NELLA NOTA DELL' ANNUALITA' 2017
2018MOHA0001	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA MICHELANGELO	FOGNATURA	ATO4 - MO	160.000,00	Gestore	Guiglia	80.000,00	70000		10.000,00	17.643,47	0		17.643,47	-77	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO AL FATTO CHE NON E' STATO ANCORA POSSIBILE CONCLUDERE L'ITER DI PERFEZIONAMENTO DELLA COMPRAVENDITA DELL'AREA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. TERMINATA LA PROGETTAZIONE PER ENTRAMBI GLI STRALCI DELL'INTERVENTO
2015MOHA0008	RADDOPPIO DORSALE DRAGONE DA CAPOLUOGO A C.MONTESE	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	400.000,00	Gestore	Lama Mocogno	100.000,00	0		100.000,00	0,00	0		0,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO NON PIU' NECESSARIO POICHE' RISOLTO DA ID 2014MOHA0152. L' INTERVENTO ERA FINALIZZATO AD AUMENTARE LA CAPACITA' DI TRASPORTO DALLA CONDOTTA IN ARRIVO DAL CIMONE VERSO COLLE MONTESE. SUCCESSIVAMENTE A QUESTA INIZIALE IPOTESI, SI E' RICONTRATO DURANTE L' EVENTO SICCIOSITO DEL 2017 CHE LA DISPONIBILITA' IDRICA DEL CIMONE NON ERA SUFFICIENTE, PERTANTO L' INTERVENTO DI RADDOPPIO DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO SAREBBE STATO VANIFICATO DALLA SCARSITA' DI RISORSA DI MONTE PROPRIO NEI PERIODI DI MAGGIOR BISOGNO. SI E' PERTANTO OPTATO PER UNA DIVERSA SOLUZIONE TCNICA, OVVERO IL POTENZIAMENTO DEL POMPAGGIO DALLA CENTRALE DELLO SCOLTENNA (ID 2014MOHA0152) CON CONSEGUENTE ALIMENTAZIONE DA VALLE VERSO MONTE
2017MOHA0005	POTENZIAMENTO IMPIANTO TOLLE	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	70.000,00	Gestore	Lama Mocogno	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2017MOHA0006	NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-SANTONA	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	100.000,00	Gestore	Lama Mocogno	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2014MOHA0035	Realizzazione trattamento appropriato località Barigazzo	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	315.000,00	Gestore	Lama Mocogno	50.000,00	0		50.000,00	974,34	0		974,34	-98	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO AL FATTO CHE NON SI E' ANCORA RISOLTA LA PROBLEMATICA, GIA' EVIDENZIATA DAL 2016, RELATIVA ALLE DIFFICOLTA' NEL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONCESSORI PER LE OPERE PREVISTE IN AREA PRIVATA
2014MOHA0034	Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200	FOGNATURA	ATO4 - MO	90.000,00	Gestore	Lama Mocogno	50.000,00	0		50.000,00	0,00	0		0,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L'ID RISULTA TERMINATO (NON PIU' PRESENTE NEL NUOVO POI 2020-24) IN QUANTO GLI INTERVENTI NECESSARI SONO STATI REALIZZATI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI
2014MOHA0036	ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI DI MONTECENERE NORD E DI M	FOGNATURA	ATO4 - MO	1.016.000,00	Gestore	Lama Mocogno	50.000,00	0		50.000,00	44.214,32	0		44.214,32	-11	
2014MOHA0037	Collettamento dell'agglomerato di Borra - Sanatorio al depuratore di B	FOGNATURA	ATO4 - MO	150.000,00	Gestore	Lama Mocogno	10.000,00	0		10.000,00	0,00	0		0,00	-100	AGGLOMERATO MINORE DI 200 AE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO E' STATA POSTICIPATA IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019. LA NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24
2017MOHA0008	ADEGUAMENTO SERBATOIO VIA FIRENZE	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	70.000,00	Gestore	Maranello	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2017MOHA0016	Studio e riconversione del depuratore di Pozza come vasca di trattame	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	220.000,00	Gestore	Maranello	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2014MOHA0038	Collegamento rete fognaria della località La Svolta di S. Venanzio alla co	FOGNATURA	ATO4 - MO	150.000,00	Gestore	Maranello	10.000,00	0		10.000,00	0,00	0		0,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO ERA UN INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE E NON INTERVENTO LEGATO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA 201/2016 (L'AGGLOMERATO E' INFERIORE AI 200 AE E L'INTERVENTO AVEVA LA FINALITA' DI DISMETTERE UN PICCOLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COLLEGARLO ALLA RETE DI MARANELLO; E COMUNQUE E' PRESENTE IMPIANTO DI DEPURAZIONE). IL PROGETTO SI ERA COMUNQUE INTERROTTO PER IMPOSSIBILITA' NELL'OTTENIMENTO DELLE SERVITU' DI PASSAGGIO
2014MOHA0039	Raccolta e trattamento reflui in località Fogliano (versante Ovest)	FOGNATURA	ATO4 - MO	170.000,00	Gestore	Maranello	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2014MOHA0040	Collegamento al depuratore di Sassuolo della rete al servizio del quartie	FOGNATURA	ATO4 - MO	30.000,00	Gestore	Maranello	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2014MOHA0042	sistemazione rete con alimentazione da ottimizzazione	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	100.000,00	Gestore	Marano sul Panaro	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2015MOHA0009	CLASSIFICAZIONE A FINI POTABILI ACQUA PANARO	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	30.000,00	Gestore	Marano sul Panaro	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2020MOHA0013	INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA:RILANCIO CASONA	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	150.000,00	Gestore	Marano sul Panaro	0,00	0		0,00	3.394,18	0		3.394,18	100	NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL PIANO 2020-23 E CHE PERTANTO NON PRESENTA PIANIFICAZIONE 2019. SOSTENUTI NEL CORSO DEL 2019 I PRIMI COSTI PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE
2014MOHA0041	Rifacimento collettore Comune di Marano al depuratore di Vignola	FOGNATURA	ATO4 - MO	100.000,00	Gestore	Marano sul Panaro	0,00	0		0,00	18.621,24	0		18.621,24	100	LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO ALLO SLITTAMENTO DELLE PASSATE ANNUALITA' GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DELL'ANNO DI COMPETENZA. INOLTRE E' STATO RIVISTO L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO IN QUANTO NEL POI 2015-17 ERA STATO INDICATO IL COSTO DELLA PROGETTAZIONE
2014MOHA0043	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	1.170.000,00	Gestore	Modena	30.000,00	0		30.000,00	86.765,74	0		86.765,74	189	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE DEL COMUNE DI MODENA. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPO. LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE A POI E' CONSEGUENTEMENTE DI LARGA MASSIMA
2014MOHA0044	RINN.RETE AC - CORSO DUOMO	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	180.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2014MOHA0045	RINN.RETE - PARCO UCCELLIERA	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	150.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2014MOHA0046	RINN. RETE AC - VIA SASSI	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	40.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	
2014MOHA0047	Implementazione acquedotto Usi Plurimi a servizio Polo Estrattivo di M	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	333.700,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0	

## ALLEGATO 1

HERA SpA  
Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Modena

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA MODENA ANNO 2019						
							PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019
2014MOHA0048	Costruzione di un impianto di potabilizzazione della risorsa emunta dal	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	5.000.000,00	Gestore	Modena	50.000,00	0		50.000,00	0,00	0		0,00	-50.000,00	-100	INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO NON RITENUTO AD OGGI NECESSARIO. SI TRATTA DI UN INTERVENTO INFRASTRUTTURALE DI LUNGO PERIODO. NEL NUOVO POI 2020-24 E' STATA RIPROGRAMMATA UNA PRIMA VALUTAZIONE DI MASSIMA A PARTIRE DAL 2023
2014MOHA0059	Nuova dorsale da Collegarola a Martiniana	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	1.350.000,00	Gestore	Modena	650.000,00	350000		300.000,00	2.465,05	0		2.465,05	-647.534,95	-99	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2020 COME DA NUOVO POI 2020-2024 IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI INDIVIDUARE LA MIGLIOR SOLUZIONE PROGETTUALE, ESSENDO L'INTERVENTO FINALIZZATO A RENDERE IL SISTEMA IDRICO MAGGIORMENTE RESILIENTE. AD OGGI NON SONO EVIDENTI COMUNQUE PARTICOLARI CRITICITA' TALI DA RENDERE COGENTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
2014MOHA0220	Contatori multibusiness	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	660.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2017MOHA0001	Revamping impianto di Collegarola	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	200.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOHA0049	Modena Capoluogo: Potenziamento dissabbiatore e sistema di trattam	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	1.300.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	67.053,77	0		67.053,77	67.053,77	100	COME INDICATO NELLE NOTE 2018, NEL 2019 SONO STATE TERMINATE ATTIVITA' INIZIALMENTE PREVISTE PER LE ANNUALITA' PRECEDENTI ED E' STATA SOSTITUITA LA GRIGLIATURA DI UNA DELLE DUE VASCHE PER IL TRATTAMENTO BOTTINI. TERMINATE QUESTE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ESISTENTE, NELLE PROSSIME ANNUALITA' SI INTERVERRA' PER IL POTENZIAMENTO DEL COMPARTO DI TRATTAMENTO BOTTINI CON LA SUA EVENTUALE RICOLLOCAZIONE ALL' INTERNO DELL'AREA IMPIANTISTICA, COME PIANIFICATO NEL NUOVO POI 2020-24
2014MOHA0054	Realizzazione nuovo sistema di supervisione impianto di depurazione di	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	370.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	186,75	0		186,75	186,75	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE RESIDUALI ATTIVITA' CONTABILI
2014MOHA0058	Adeguamento linea fanghi depuratore Capoluogo (silos, centrifughe, di	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	1.707.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	178.522,68	0		178.522,68	178.522,68	100	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA CONCLUSIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE AI RITARDI FATTI REGISTRARE NEL 2016 IN FASE PROGETTUALE E NEL 2017 IN FASE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI UNA QUOTA PARTE DEI LAVORI, GIA' MOTIVATI NELLE NOTE DEGLI ANNI PRECEDENTI
2014MOHA0060	Adeguamento al D. Lgs. 152 della sedimentazione finale del Depuratore	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	838.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOHA0062	Sistemazione della Disinfezione nel Depuratore di San Damaso	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	90.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOHA0050	Opere di collettamento delle reti fognarie dell'agglomerato di Paganine	FOGNATURA	ATO4 - MO	345.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOHA0051	Tre Olmi: Risanamento ambientale sistema scolante zona Tre Olmi, Fier	FOGNATURA	ATO4 - MO	1.072.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOHA0052	Adeguamento rete di drenaggio Modena Est	FOGNATURA	ATO4 - MO	861.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	438.709,54	0		438.709,54	438.709,54	100	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA, CON PREVISTA CONCLUSIONE LAVORI NEL 2020. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ANNUALITA' 2016-2017 PER LE MOTIVAZIONI GIA' ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA'
2014MOHA0053	Collettore zona Via Sassi da Guicciardini a Don Minzoni	FOGNATURA	ATO4 - MO	651.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	1.753,87	0		1.753,87	1.753,87	100	ONERI LEGATI ALL' ATTIVITA' DI RILIEVO CONDOTTA CONGIUNTAMENTE ALL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SUL CANALE PRADELLA (ID 2017MOHA0014).
2014MOHA0055	ADEGUAMENTO NORMATIVA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA RETE MODENA	FOGNATURA	ATO4 - MO	9.200.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOHA0056	Intervento di riequilibrio idraulico del sistema fognario del quartiere Sa	FOGNATURA	ATO4 - MO	330.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOHA0057	Scolmo canale bianco nel canale dei Montanari da Via tabacchi	FOGNATURA	ATO4 - MO	430.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOHA0061	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	ATO4 - MO	266.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	6.229,47	0		6.229,47	6.229,47	100	COME GIA' EVIDENZIATO QUESTO ID RISULTA DI DIFFICILE PIANIFICAZIONE PER LA COMPLESSITA' INTRINSECA DELLA PROBLEMATICA CHE VA DA AFFRONTARE, CHE RICHIEDE UN AVANZAMENTO A STEP SUCCESSIVI SULLA BASE DELLE EVIDENZE VIA VIA EMERSE. PERTANTO NON ESISTE UNA CORRISPONDENZA TRA LA PIANIFICAZIONE INIZIALMENTE INSERITA A POI 2015-19 E LE ATTIVITA' DI STUDIO EFFETTIVAMENTE SVOLTE. NEL 2018 E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE DI UN SECONDO SISTEMA DI MONITORAGGIO PER COPRIRE L'INTERA RETE FOGNARIA LE CUI ATTIVITA' SONO STATE SOSPESSE NEL 2019 PER DIFFICOLTA' CONTRATTUALI CON I FORNITORI CHE SI OCCUPANO DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE. L' ATTIVITA' VERRA' RIPRESA NEL 2020. NEL NUOVO POI 2020-24 E' STATA RIALLINEATA LA COMPLESSIVA PIANIFICAZIONE DI QUESTO ID IN RELAZIONE ALL'AVANZAMENTO SOPRA DESCRITTO
2014MOHA0063	Estendimento fognatura alle aree Cargill, Neutron, Monteré?	FOGNATURA	ATO4 - MO	90.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOHA0225	Risanamento collettore di levante	FOGNATURA	ATO4 - MO	420.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOHA0226	Installazione nuovo collettore di alimentazione per il sollevamento con	FOGNATURA	ATO4 - MO	450.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
2015MOHA0010	ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE VIA D'AVIA	FOGNATURA	ATO4 - MO	250.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	14.939,16	0		14.939,16	14.939,16	100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE A QUANTO GIA' EVIDENZIATO NELLE NOTE DEL 2018, OVVERO LA PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'INTERVENTO E LA RELATIVA CRITICITA' NELL'INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE PROGETTUALE, CHE HA DETERMINATO UN COMPLESSIVO SLITTAMENTO DELL'OPERA. NEL 2019 E' STATA CONCLUSA LA FASE DI PROGETTAZIONE
2017MOHA0014	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE PRADELLA	FOGNATURA	ATO4 - MO	205.000,00	Gestore	Modena	0,00	0		0,00	6.829,51	0		6.829,51	6.829,51	100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE, COME INDICATO NELL'ANNUALITA' PRECEDENTE, SONO ANCORA IN CORSO APPROFONDIMENTI CON I TECNICI COMUNALI PER CAPIRE LO STATO PATRIMONIALE DELL'INFRASTRUTTURA. DALLE ANALISI PRELIMINARI L'INTERVENTO PRESENTA DELLE COMPLESSITA' LEGATE AL FATTO CHE L'INFRASTRUTTURA SI SVILUPPA QUASI INTERAMENTE ALL'INTERNO DI AREA PRIVATA E HA SUBITO MODIFICHE CATASTALI NEL TEMPO. SOLUZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA NON ANCORA IDENTIFICATA. NEL 2020 VERRANNO ESEGUITE INDAGINI STRUTTURALI SUL MANUFATTO ESISTENTE
2014MOHA0064	Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato d	FOGNATURA	ATO4 - MO	180.000,00	Gestore	Montecreto	70.000,00	0		70.000,00	0,00	0		0,00	-70.000,00	-100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO RIGUARDA L'ADEGUAMENTO SCARICHI PER AGGLOMERATO INFERIORE AI 200 AE POSTICIPATO IN COERENZA CON LE TEMPSTICHE PREVISTE DALLA DGR 201/2016 E 569/2019, LA NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24
2014MOHA0065	Rinnove reti acqua e fognatura via Fontana, Via Marconi, via Vaccari	FOGNATURA	ATO4 - MO	75.000,00	Gestore	Montecreto	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	











## ALLEGATO 1

HERA SpA  
Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Modena

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA MODENA ANNO 2019					
							PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTAMENTO
2014MOHA0213	Realizzazione serbatoio di accumulo nella centrale di Fogazzaro	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	210.000,00	Gestore	Vignola	10.000,00	0		10.000,00	0,00	0	0,00	-10.000,00	-100	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN QUANTO AL MOMENTO NON PRIORITARIO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MA PROPEDEUTICO AD UNA MAGGIORE RESILIENZA DEL SISTEMA SUL LUNGO PERIODO
2015MOHA0024	NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	980.000,00	Gestore	Vignola	50.000,00	0		50.000,00	0,00	0	0,00	-50.000,00	-100	INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO AD OGGI NON RISULTA PIU' NECESSARIO IN RELAZIONE ALL'ATTUALE ASSETTO ACQUEDOTTISTICO DELL'AREA PEDEMONTANA. POICHE' SI TRATTA DI UN INTERVENTO INFRASTRUTTURALE CHE POTREBBE AVERE COMUNQUE UNA VALENZA DI LUNGO PERIODO E' STATO MANTENUTO L'ID ANCHE NEL NUOVO POI 2020-24 MA CON IPOTESI DI SVILUPPO FUORI ARCO-PIANO
2018MOHA0002	Rinnovo rete idrica di distribuzione e allacciamenti via Doccia - FSC sche	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	60.000,00	Gestore	Vignola	10.000,00	5000		5.000,00	0,00	0	0,00	-10.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ARCO PIANO
2018MOHA0003	Rinnovo rete idrica di distribuzione e allacciamenti Santa Maria Rotonda	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	180.000,00	Gestore	Vignola	30.000,00	15000		15.000,00	0,00	0	0,00	-30.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ARCO PIANO
2020MOHA0026	INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: OTTIMIZZAZIONE ROSOLA I STR	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	270.000,00	Gestore	Vignola	0,00	0		0,00	321.841,87	0	321.841,87	321.841,87	100	NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL PIANO 2020-23 E CHE PERTANTO NON PRESENTA PIANIFICAZIONE 2019. INTERVENTO INTERAMENTE REALIZZATO NEL 2019 IN QUANTO STRATEGICO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO IN RELAZIONE AL COLLEGAMENTO DEI SISTEMI IDRICI PANARO E SECCHIA
2014MOHA0215	Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	300.000,00	Gestore	Vignola	0,00	0		0,00	709,76	0	709,76	709,76	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE RESIDUALI ATTIVITA' CONTABILI
2014MOHA0224	Potenziamento areazione depuratore, sistemazione impianto elettrico	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	300.000,00	Gestore	Vignola	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
2014MOHA0214	Adeguamento collettore fognario via Vittorio Veneto	FOGNATURA	ATO4 - MO	315.000,00	Gestore	Vignola	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
2014MOHA0216	Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati vari a Zocca	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	850.000,00	Gestore	Zocca	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
2017MOHA0018	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO VERUCCHIA	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	200.000,00	Gestore	Zocca	50.000,00	0		50.000,00	460,11	0	460,11	-49.539,89	-99	LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AD UN DIVERSO SVILUPPO TEMPORALE DELL'INTERVENTO RISPETTO AL PIANIFICATO MA NEL RISPETTO DELLE TEMPSTICHE REALIZZATIVE FISSATE DALLA DGR201/2016 E DGR569/2019. L'IMPORTO 2019 E' RELATIVO AD ATTIVITA' PRELIMINARI. AVVIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NEL 2020
2017MOHA0019	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' RAME	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	200.000,00	Gestore	Zocca	50.000,00	0		50.000,00	0,00	0	0,00	-50.000,00	-100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE ALLO SLITTAMENTO INIZIALE DEL PROGETTO, COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DELL' ANNUALITA' 2017. NEL 2018 E' STATA SVOLTA LA PROGETTAZIONE, MENTRE NEL 2019 E' INIZIATO L' ITER AUTORIZZATIVO CHE PRESENTA UN RALLENTAMENTO RISPETTO A QUANTO IPOTIZZATO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA' NEL TROVARE L' ACCORDO CON I PRIVATI
2014MOHA0217	ADEGUAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI MONTEOMBRARO CAMPAZZ	FOGNATURA	ATO4 - MO	160.000,00	Gestore	Zocca	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
2017MOHA0017	ADEG. AGGLOM. MONTE CORONE CASA NADINO	FOGNATURA	ATO4 - MO	2.150.000,00	Gestore	Zocca	280.000,00	0		280.000,00	96.364,15	0	96.364,15	-183.635,85	-65	LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO A QUANTO GIA' ADDOTTO NELLE NOTA DEL 2018 E RISULTA COERENTE CON LA NUOVA PIANIFICAZIONE APPROVAT A POI 2020-24. ALLA FINE DEL 2018 E' STATO AVVIATO L' ITER DI CONDIVISIONE DEL PROGETTO CON L' AMMINISTRAZIONE E CON LA CITTADINANZA CHE HA PORTATO A SPOSTARE LA POSIZIONE DELL' IMPIANTO E SUCCESSIVAMENTE A UNA LUNGA TRATTATIVA CON LA PROPRIETA' CHE HA PORTATO ANCHE A UNA PARZIALE RIPROGETTAZIONE. SI E' QUINDI LAVORATO SULLA PRELIMINARE CONDIVISIONE DEL PROGETTO AL FINE DI EVITARE DINIEGHI IN FASE AUTORIZZATIVA E PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. QUESTO HA RICHIESTO UN PARTICOLARE INVESTIMENTO IN TERMINI TEMPORALI.
<b>TOTALE</b>							<b>17.799.000</b>	<b>455.000</b>		<b>17.344.000</b>	<b>18.713.465</b>	<b>882.331</b>	<b>17.831.134</b>	<b>914.465</b>		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 2 del 26 aprile 2021

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019 per il gestore HERA s.p.a..**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore  
Responsabile ad interim  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 26 aprile 2021



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena  
F.to Enrico Diacci

Il segretario verbalizzante  
F.to Pier Luigi Maschietto

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 12 luglio 2021
