

CLMO/2018/4 del 18 marzo 2019

CONSIGLIO LOCALE DI MODENA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione del consuntivo degli investimenti 2017
per il gestore HERA S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Caterina Bagni

CLMO/2019/4

CONSIGLIO LOCALE DI MODENA

L'anno **2019** il giorno 18 del mese di marzo alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/2019/0001882 del 14/03/2019.

Assume la presidenza la Coordinatrice del Consiglio Locale che chiama Elisa Di Francesca, funzionaria di ATERSIR, ad assisterla in qualità di segretario verbalizzante.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA			NO	0,6622
BOMPORTO			NO	1,3444
CAMPOGALLIANO			NO	1,1971
CAMPOSANTO			NO	0,5660
CARPI	Tosi Simone	Assessore	SI'	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Reggianini Stefano	Sindaco	SI'	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE			NO	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA			NO	1,4922
CAVEZZO			NO	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA	Dario Caprara	Assessore	SI'	1,2507
FANANO			NO	0,5491
FINALE EMILIA			NO	2,0474
FIORANO MODENESE			NO	2,1929
FIUMALBO			NO	0,3455
FORMIGINE			NO	4,1680
FRASSINORO			NO	0,4274
GUIGLIA			NO	0,6638
LAMA MOCOCCO			NO	0,5274
MARANELLO	Mariaelena Mililli	Assessore	SI'	2,1548
MARANO SUL PANARO	Elio Dani	Assessore	SI'	0,7569
MEDOLLA	Patrizia Sgarbi	Assessore	SI'	0,9382
MIRANDOLA	Maino Benatti	Sindaco	SI'	3,0215
MODENA	Alessandra Filippi	Assessore	SI'	21,3515
MONTECRETO			NO	0,3096
MONTEFIORINO			NO	0,4576
MONTESE			NO	0,5880
NONANTOLA	Stefania Grenzi	Assessore	SI'	1,9843
NOVI DI MODENA	Enrico Diacci	Sindaco	SI'	1,4874
PALAGANO			NO	0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO			NO	2,2228
PIEVEPELAGO	Corrado Ferroni	Sindaco	SI'	0,4562
POLINAGO			NO	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA			NO	0,6371
RAVARINO			NO	0,9197
RIOLUNATO			NO	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Gianfranco Gozzoli	Sindaco	SI'	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Giovanni Giovannelli	Vice-Sindaco	SI'	1,4938
S.POSSIDONIO			NO	0,6192
S.PROSPERO			NO	0,8814
SASSUOLO			NO	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO	Caroli Germano	Sindaco	SI'	1,2871

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
SERRAMAZZONI			NO	1,1381
SESTOLA			NO	0,4988
SOLIERA	Bagni Caterina	Assessore	SI'	1,9704
SPILAMBERTO	Fabrizio Nardini	Assessore	SI'	1,6242
VIGNOLA	Angelo Pasini	Vice-Sindaco	SI'	3,0669
ZOCCA			NO	0,7682
PROVINCIA DI MODENA			NO	10,0000

Presenti n. 17 pari a quote 55,8253

Assenti n. 31 pari a quote 44,1747

Riconosciuta la validità della seduta, la Coordinatrice invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione del consuntivo degli investimenti 2017 per il gestore HERA S.p.A.

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

premesse che:

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

considerato che:

- con deliberazione n. 11 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 49 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
- con deliberazione n.6 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;

- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2017 risultano in linea con quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate tutte ammissibili;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 17 (quote 55,8253), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 per il gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2017
Gestore: HERA s.p.a.
Sottoambito: Modena**

1 marzo 2019

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.11 del 3 Dicembre 2015, aggiornato con Delibera del Consiglio locale di Modena n. 6 del 21 Luglio 2017, che il gestore HERA ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI.

PIANIFICATO 2017		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 12.957.000	-€ 8.533	€ 12.948.467	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contribuito Pianificato [B]	€ 0	€ 24.590	€ 24.590	Importo Contribuito a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 12.957.000	-€ 33.123	€ 12.923.877	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2017 investimenti perfettamente in linea rispetto a quanto era stato preventivato; nel caso specifico, dal momento che non vi erano contributi programmati ma alcuni contributi sono comunque stati incassati, a livello di investimenti lordi il gestore ha rendicontato € 8.533 in meno rispetto a quanto preventivato.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

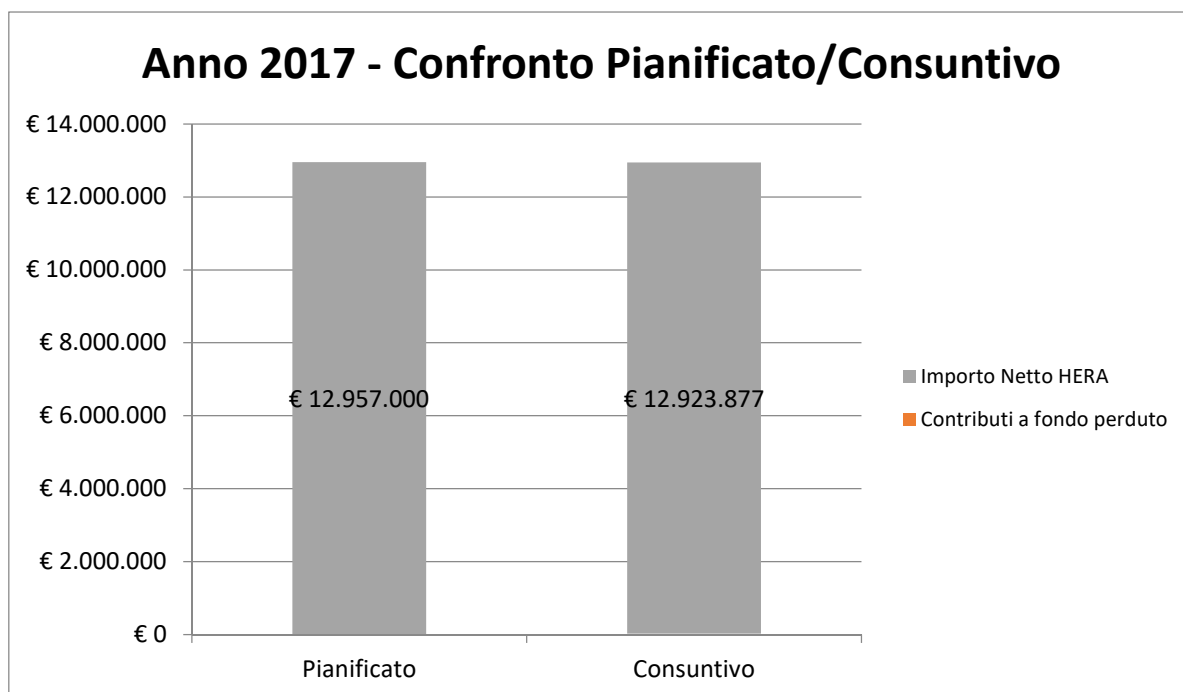


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata ritenuta esaustiva.

Numero di interventi programmati nel 2017: 86

Numero di interventi rendicontati nel 2017: 75

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati o conclusi contabilmente nell'anno 2016 (% di scostamento pari al -100%)	23	€ 0	€ 845.000			
<i>di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente</i>	1	€ 0	€ 50.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	11	€ 888.713	€ 0			
Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0			
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	52	€ 6.462.221	€ 6.697.000			
<i>di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 12/2017</i>	14	€ 225.838	€ 270.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	12	€ 5.597.533	€ 5.415.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo circa pari a quello preventivato (cfr. Tab 1) non ha avviato, nel 2017, 23 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3) per un totale di 845.000 euro; in compenso però il gestore ha avviato anticipatamente 11 interventi rispetto a quanto programmato per un totale di 888.713 euro. Inoltre si può notare come rispetto ai 75 interventi che il gestore ha rendicontato, il 68% di questi (52 interventi) hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno anche se l'ammontare complessivo di quanto rendicontato (€ 6.462.221) è quasi pari a quanto era stato preventivato (€ 6.697.000) a dimostrazione che comunque gli scostamenti si sono bilanciati bene tra loro; per tutti gli scostamenti che si sono verificati e per i quali sono state richieste al gestore motivazioni queste sono state fornite e sono state considerate esaustive.

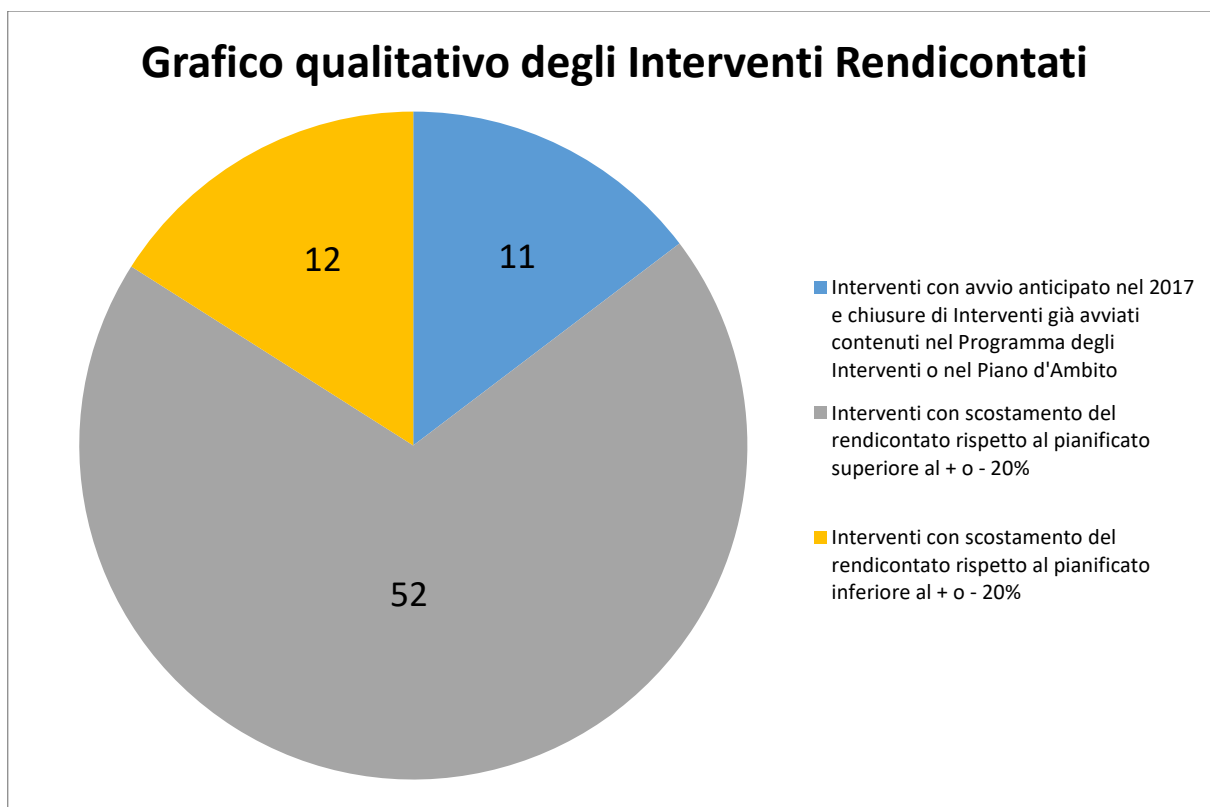


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2017 da Piano approvato
2014MOHA0013	Collettamento alla rete di San Vito di Spilamberto dell'agglomerato Oratorio di Sant'Anna	FOGNATURA	Castelnuovo Rangone	10.000
2014MOHA0018	Sistema di trattamento appropriato negli agglomerati Cà Montanari	FOGNATURA	Castelvetro di Modena	40.000
2014MOHA0023	Nuovo pozzo Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena	5.000
2014MOHA0031	Nuovo sollevamento localit? C? Baldini e collegamento Casa Togno e Bivio Serravalle a impianto Guiglia Lama.	DEPURAZIONE	Guiglia	30.000
2014MOHA0034	Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 AE (Piane di Mocogno Caserma)	FOGNATURA	Lama Mocogno	50.000
2014MOHA0061	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Modena	50.000
2014MOHA0066	Realizzazione sistema di trattamento appropriato agglomerati vari a Montefiorino	FOGNATURA	Montefiorino	10.000
2014MOHA0120	Adeguamento attraversamenti ferroviari	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	30.000
2014MOHA0154	Realizzazione di collettori e sistemi di trattamento appropriato in agglomerati di piccole dimensioni (Pian di Scuola, C? Bosi - polo produttivo, Olina, C? d'Olina, Scalella, Bivio di Renno, Monzone Casa Piombini, Camatta, Casa Bellei)	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	10.000
2014MOHA0159	Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato a Coscogno	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	10.000
2014MOHA0179	Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio degli scolmatori a forte impatto SAS1-1 e SAS1-3	FOGNATURA	Sassuolo	10.000
2014MOHA0184	Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per alimentare Vignola	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	30.000
2014MOHA0198	Sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro Nord	ACQUEDOTTO	Spilamberto	20.000

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2017 da Piano approvato
2014MOHA0216	Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati vari a Zocca	DEPURAZIONE	Zocca	50.000
2015MOHA0005	POTENZIAMENTO RETE V.FOSSA	ACQUEDOTTO	Formigine	150.000
2015MOHA0018	NUOVO COLLEGAMENTO RETE CASA GALLO-GUAITAROLA	ACQUEDOTTO	Prignano sulla Secchia	150.000
2015MOHA0021	STUDIO ACQUE PARASSITE E INTERVENTI	FOGNATURA	San Cesario sul Panaro	50.000
2017MOHA0010	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI GAGGIO	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia	10.000
2017MOHA0012	DEP S.CESARIO SP_SOSTITUZIONE AREAIONE	DEPURAZIONE	San Cesario sul Panaro	50.000
2017MOHA0014	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE PRADELLA	FOGNATURA	Modena	50.000
2017MOHA0017	ADEG. AGGLOM. MONTE CORONE CASA NADINO	FOGNATURA	Zocca	20.000
2017MOHA0018	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO VERUCCHIA	DEPURAZIONE	Zocca	5.000
2017MOHA0019	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' RAME	DEPURAZIONE	Zocca	5.000
			TOTALE	845.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati o terminati contabilmente nell'anno 2016 (Percentuale di scostamento pari a -100%)

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti annualità 2017 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	DOMANDE
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento		
2014MOHA0001	Manutenzione straordinaria serbatoio via Loda	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	200.000,00	0	0	0	35.047,53	0	35.047,53	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO DELL'ANNO 2017 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEGLI ANNI PRECEDENTI, NEL RISPETTO COMPLESSIVO DELL'IMPORTO PROGETTO	
2014MOHA0002	Collettamento alla rete del capoluogo degli scarichi non trattati di Via Guido Reni Est, Via Guido Reni Ovest, Zona Artigianale - Via Ligabue	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	790.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0003	Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia I STRALCIO	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	382.000,00	270.000,00	0	270.000,00	4.813,23	0	4.813,23	-98%	PROLUNGAMENTO DELLA FASE DI PROGETTAZIONE CAUSATO DALLA NECESSITA' DI INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA ALL'OPPOSIZIONE DI ALCUNE PROPRIETA' INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE.	
2014MOHA0004	Revamping campo pozzi Via Muzza Corona	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	120.000,00	40.000,00	0	40.000,00	16.454,37	0	16.454,37	-59%	SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E ALLA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO CON CASTELFRANCO, PREVISTA NEL 2018	
2014MOHA0005	Realizzazione e monitoraggio piezometri per protezione dinamica campo pozzi di via loda	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	160.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0006	Potenziamento del sistema di disidratazione fanghi del depuratore del Capoluogo.	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0007	POTENZIAMENTO DELL'ASSETTO FOGNARIO ATTO AD AUMENTARE LA CAPACITA' DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0008	Collettamento di Pilastrello al depuratore di Gaggio	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	170.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0009	Studio e collettamento a idoneo trattamento delle frazioni di Recovato e Rastellino	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	600.000,00	15.000,00	0	15.000,00	7.895,62	0	7.895,62	-47%		
2014MOHA0010	Potenziamento del depuratore centralizzato	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia	Gestore	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0011	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore		10.000,00	0	10.000,00	150.429,00	0	150.429,00	1404%	MAGGIORI ONERI DOVUTI ALLE PRESCRIZIONI DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA SULL'INTERVENTO DI SEPARAZIONE DALLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE SCOLO GATTO.	
2014MOHA0012	Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	445.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0227	Collettamento di Riolo al depuratore di Castelfranco - I Lotto	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	470.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0229	Collettamento di Riolo al dpuratore di Castelfranco II Lotto	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	555.000,00	90.000,00	0	90.000,00	172.193,54	0	172.193,54	91%	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO NEL 2017. CHIUSURA CONTABILE (ES SERVITU') PREVISTA NEL 2018. MAGGIORI ONERI LEGATI A GESTIONE DELLA VIABILITA', ESECUZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI E DELLE TUBAZIONI IN ATTRAVERSAMENTO AL CANALE DI RIOLO (NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE), ESECUZIONE DEGLI SCAVI E RIEMPIMENTI.	
2015MOHA0001	POTENZIAMENTO DORSALE V. MUZZA CORONA	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	220.000,00	0	0	0	38.152,98	0	38.152,98	100%	SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL'ANNO PRECEDENTE. AVVIATO CANTIERE NEL 2017 CON INTERVENTO DI TELEGUIDATA SOTTO LA STRADA DI COMPETENZA ANAS; NEL 2018 PREVISTA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.	
2016MOHA0001	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI GAGGIO	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2017MOHA0010	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI GAGGIO	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia	Gestore	160.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-100%	MODESTO SLITTAMENTO DELL' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE SECONDO PRIORITA' 201	
2017MOHA0020	RISANAMENTO AMBIENTALE DELLO SCOLO FINALETTO E ADEGUAMENTO SCARICHI	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	150.000,00	40000	0	40000	72.226,07	24.590,16	47.635,91	81%	MODIFICATA PIANIFICAZIONE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 06-11-2017. RICHIESTA HERA DEL 27-09-2017 PROT. 93338, VS PROT. AT/2017/6067. LO SCOSTAMENTO 2017 E' LEGATO AD UN MAGGIOR AVANZAMENTO DEL CANTIERE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, CON ANTICIPAZIONE DI ALCUNI COSTI PREVISTI PER IL 2018, ANCHE IN RELAZIONE ALL'URGENZA MANIFESTATA DAL COMUNE CHE STA OPERANDO LA RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE. NEL 2017 E' STATO ANCHE INCASSATO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EROGATO DEL COMUNE PREVISTO NEL 2018. COMPLETAMENTO LAVORI NEL 2018 COME DA PIANIFICAZIONE	COME MAI SCOSTAMENTO?
2014MOHA0013	Collettamento alla rete di San Vito di Spilamberto dell'agglomerato Oratorio di Sant'Anna	FOGNATURA	Castelnuovo Rangone	Gestore	150.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-100%	LA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA ADEGUATA SULLA BASE DELLA RIDEFINIZIONE DEGLI AGGLOMERATI E DELLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO, DEFINITA DAL DECRETO 201/2016 RER.	
2014MOHA0014	RINN.RETE-V.VANDELLI MONTALE	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone	Gestore	70.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0015	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone	Gestore	75.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0016	Collegamento Castelnuovo Martiniana con Serbatoio pensile di Castelnuovo	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone	Gestore	560.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0017	Collegamento condotta Cavidole con San Donnino Settecani	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone	Gestore	560.000,00	0	0	0	11.620,90	0	11.620,90	100%	COSTI 2017 RELATIVI AL PERFEZIONAMENTO DELLE SERVITU' COME GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DEL 2016. INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO E CONDOTTA IN ESERCIZIO.	
2014MOHA0222	Estendimento della rete di acquedotto in Via Case Bruciate fino al torrente Tiepido	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone	Gestore	115.000,00	0	0	0	0	0	0			
2015MOHA0002	NUOVO COLLEGAMENTO RETI DI PORTILE -V. VIAZZA	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone	Gestore	120.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0018	Sistema di trattamento appropriato negli agglomerati Ca' Montanari	FOGNATURA	Castelvetro di Modena	Gestore	90.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO SU ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI CA' MONTANARI. IMPORTO 2017 NON NECESSARIO	
2014MOHA0019	RINN RETE H2O V.X MODENA	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0			

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti annualità 2017 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivo e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	DOMANDE
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento		
2014MOHA0020	RINN.RETE-SOLIGNANO N.	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena	Gestore	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0021	Nuovo serbatoio Bergognina	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena	Gestore	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0022	Collettamento alla rete fognaria di Castelvetro della zona comparto ceramiche Rio Maldello a Solignano	FOGNATURA	Castelvetro di Modena	Gestore	200.000,00	0	0	0	16.717,36	0	16.717,36	100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2017. LO SCOSTAMENTO 2017 E' LEGATO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI E RISULTA COERENTE CON QUANTO GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DEGLI ANNI 2015-2016	
2014MOHA0023	Nuovo pozzo Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena	Gestore	100.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	-100%	RIPIANIFICATO AVVIO PROGETTAZIONE IN UN'OTTICA DI PRIORITA' IN BASE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE GESTIONALI	
2014MOHA00228	Collettamento reflui di Levizzano al depuratore del capoluogo	FOGNATURA	Castelvetro di Modena	Gestore	310.000,00	0	0	0	0	0	0			
2015MOHA0003	POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA - CAPOLUOGO	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena	Gestore	180.000,00	0	0	0	0	0	0			
2015MOHA0004	NUOVO COLLEG. SERB. GALLO - POGGIOLI	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena	Gestore	200.000,00	0	0	0,00	0	0	0			
2014MOHA00230	Revamping impianto Ponte Fossa	ACQUEDOTTO	Fiorano Modenese	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0024	RINN. RETE AC - VSPEZZANI	ACQUEDOTTO	Formigine	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0025	Risanamento canale di Formigine sotto C? Longa di Casalbo	FOGNATURA	Formigine	Gestore	95.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0026	Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di Magreta	ACQUEDOTTO	Formigine	Gestore	660.000,00	150.000,00	0	150.000,00	164.669,00	0	164.669,00	10%		
2015MOHA0005	POTENZIAMENTO RETE V.FOSSA	ACQUEDOTTO	Formigine	Gestore	180.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0	-100%	CONCLUSO NEL 2016 IL PRIMO STRALCIO. DA VALUTARE LA NECESSITA' DI REALIZZARE ANCHE IL II STRALCIO, INIZIALMENTE PREVISTO NEL 2017	
2015MOHA0006	NUOVO COLLEGAMENTO IMPIANTO TOMMASELLI - IMPIANTO S.GAETANO	ACQUEDOTTO	Formigine	Gestore	550.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0027	Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 AE (Pian di Venano)	FOGNATURA	Frassinoro	Gestore	125.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0028	Realizzazione di trattamento appropriato agli agglomerati Fontanaluccia, Piandelagotti	FOGNATURA	Frassinoro	Gestore	650.000,00	100.000,00	0	100.000,00	3.344,93	0	3.344,93	-97%	RITARDI PROGETTUALI IN AGGIUNTA AD ITER AUTORIZZATIVO PARTICOLARMENTE LUNGO (AVVIATO A MARZO 2017 E NON ANCORA CONCLUSO: PRATICA INIZIALMENTE RESPINTA DA ATERSIR, POI RITORNATA IN ATERSIR CAUSA IMPOSSIBILITÀ DI AVVIARE LA VARIANTE URBANISTICA IN COMUNE)	
2014MOHA0029	Realizzazione di trattamento appropriato Case Cerbiani	FOGNATURA	Frassinoro	Gestore	142.000,00	0	0	0	0	0	0			
2015MOHA0007	INTERCONNESSIONE FRAZ. RICCOVOLTO A SISTEMA DRAGONE	ACQUEDOTTO	Frassinoro	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
2017MOHA0003	INTERCON. FRAZ. SASSATELLA A SIST.DRAGONE	ACQUEDOTTO	Frassinoro	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
2017MOHA0004	INTERCONNESSIONE FRAZ. ROMANORO A SISTEMA DRAGONE	ACQUEDOTTO	Frassinoro	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0030	AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI GUIGLIA LAMA	DEPURAZIONE	Guiglia	Gestore	670.000,00	15.000,00	0	15.000,00	1.519,28	0	1.519,28	-90%		
2014MOHA0031	Nuovo sollevamento localit? C? Baldini e collegamento Casa Togni e Bivio Serravalle a impianto Guiglia Lama.	DEPURAZIONE	Guiglia	Gestore	60.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	-100%	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 02-02-2018. RICHIESTA HERA DEL 30/01/2018 PROT. 10143, VS PROT. AT/2018/576 DEL 30/01/2018	
2014MOHA0032	COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI MONTEORSELLO AL DEPURATORE DI SAN GEMINIANO	DEPURAZIONE	Guiglia	Gestore	190.000,00	55.000,00	0	55.000,00	14.884,21	0	14.884,21	-73%	RITARDI DOVUTI ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI (SERVITU').	
2014MOHA0033	Magliature con Rosola	ACQUEDOTTO	Guiglia	Gestore	200.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0034	Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 AE (Piane di Mocogno Caserma)	FOGNATURA	Lama Mocogno	Gestore	90.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	LA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA ADEGUATA SULLA BASE DELLA RIDEFINIZIONE DEGLI AGGLOMERATI E DELLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO, DEFINITA DAL DECRETO 201/2016 RER.	
2014MOHA0035	Realizzazione trattamento appropriato localit? Barigazzo	DEPURAZIONE	Lama Mocogno	Gestore	315.000,00	20.000,00	0	20.000,00	3.354,53	0	3.354,53	-83%		
2014MOHA0036	ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI DI MONTECENERE NORD E DI MONTECENERE-CASA ZAGAGLIA	FOGNATURA	Lama Mocogno	Gestore	470.000,00	10.000,00	0	10.000,00	3.740,63	0	3.740,63	-63%		
2014MOHA0037	Collettamento dell'agglomerato di Borra - Sanatorio al depuratore di Borra	FOGNATURA	Lama Mocogno	Gestore	150.000,00	0	0	0	0	0	0			
2015MOHA0008	RADDOPPIO DORSALE DRAGONE DA CAPOLUOGO A C.MONTESE	ACQUEDOTTO	Lama Mocogno	Gestore	400.000,00	0	0	0	0	0	0			
2017MOHA0005	POTENZIAMENTO IMPIANTO TOLLE	ACQUEDOTTO	Lama Mocogno	Gestore	70.000,00	0	0	0	0	0	0			
2017MOHA0006	NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-SANTONA	ACQUEDOTTO	Lama Mocogno	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0038	Collegamento rete fognaria della localit? La Svolta di S. Venanzio alla condotta di Via Fondo val Grizzaga con eliminazione dell'omonimo impianto di trattamento	FOGNATURA	Maranello	Gestore	150.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0039	Raccolta e trattamento reflui in localit? Fogliano (versante Ovest)	FOGNATURA	Maranello	Gestore	170.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0040	Collegamento al depuratore di Sassuolo della rete al servizio del quartiere di Via Sicilia e Via Grizzaga	FOGNATURA	Maranello	Gestore	30.000,00	0	0	0	0	0	0			
2017MOHA0008	ADEGUAMENTO SERBATOIO VIA FIRENZE	ACQUEDOTTO	Maranello	Gestore	70.000,00	0	0	0	0	0	0			
2017MOHA0016	Studio e riconversione del depuratore di Pozza come vasca di trattamento acque di prima pioggia.	DEPURAZIONE	Maranello	Gestore	220.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0041	Rifacimento collettore Comune di Marano al depuratore di Vignola	FOGNATURA	Marano sul Panaro	Gestore	20.000,00	10.000,00	0	10.000,00	7.962,21	0	7.962,21	-20%		

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti annualità 2017 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	DOMANDE
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento		
2014MOHA0042	sistemazione rete con alimentazione da ottimizzazione	ACQUEDOTTO	Marano sul Panaro	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0009	CLASSIFICAZIONE A FINI POTABILI ACQUA PANARO	ACQUEDOTTO	Marano sul Panaro	Gestore	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0043	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	1.170.000,00	30.000,00	0	30.000,00	37.295,81	0	37.295,81	24%		
2014MOHA0044	RINN.RETE AC - CORSO DUOMO	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	180.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0045	RINN.RETE - PARCO UCCELLIERA	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	150.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0046	RINN. RETE AC - VIA SASSI	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	40.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0047	Implementazione acquedotto Usi Plurimi a servizio Polo Estrattivo di Marzaglia. - ID PREGRESSO	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	333.700,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0048	Costruzione di un impianto di potabilizzazione della risorsa emunta dal sistema acquedottistico agroindustriale del Secchia a servizio delle centrali AIMAG e HERA	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0049	Modena Capoluogo: Potenziamento dissabbiatore e sistema di trattamento liquami da fosse Imhoff	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	1.000.000,00	100.000,00	0	100.000,00	80.112,98	0	80.112,98	-20%		
2014MOHA0050	Opere di collettamento delle reti fognarie dell'agglomerato di Paganine al depuratore di Modena	FOGNATURA	Modena	Gestore	345.000,00	10.000,00	0	10.000,00	166.021,91	0	166.021,91	1560%	MAGGIORI ONERI 2017 DOVUTI ALLO SLITTAMENTO DELL'INIZIO DEI LAVORI E ALLA PARTICOLARE COMPLESSITA' DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE IN SPAZIO CONFINATO (ONERI PER LA SICUREZZA). LAVORO CONCLUSO.	
2014MOHA0051	Tre Olmi: Risanamento ambientale sistema scolante zona Tre Olmi, Fiera, via Castaldi - Progetto in due stralci di cui uno a parziale carico di TAV.	FOGNATURA	Modena	Gestore	1.072.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0052	Adeguamento rete di drenaggio Modena Est	FOGNATURA	Modena	Gestore	808.385,10	340.000,00	0	340.000,00	38.675,07	0	38.675,07	-89%	SLITTAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA A CAUSA DELLA NECESSITA' DI EFFETTUARE UN PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI TERRENI IN DESTRA IDRAULICA DEL CAVO CAZZOLA, INIZIATO NEL FEBBRAIO 2018 E ATTUALMENTE CONCLUSO MEDIANTE TRASMISSIONE AD ATERSIR DEL PROGETTO COMPLETO PER LA CONCLUSIONE DELL'ITER AUTORIZZATIVO IL 21 GIUGNO 2018	
2014MOHA0053	Collettore zona Via Sassi da Guicciardini a Don Minzoni	FOGNATURA	Modena	Gestore	600.000,00	0	0	0	6.917,47	0	6.917,47	100%	ONERI LEGATI ALL'ATTIVITA' DI RILIEVO CONDOTTA CONGIUNTAMENTE ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SUL CANALE PRADELLA (ID 2017MOHA0014).	
2014MOHA0054	Realizzazione nuovo sistema di supervisione impianto di depurazione di Modena	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	300.000,00	20.000,00	0	20.000,00	28.974,42	0	28.974,42	45%		
2014MOHA0055	ADEGUAMENTO NORMATIVA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA RETE MODENA	FOGNATURA	Modena	Gestore	60.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0056	Intervento di riequilibrio idraulico del sistema fognario del quartiere Sacca mediante la disconnessione della Fossa Quartezza dal Cavo Soratore	FOGNATURA	Modena	Gestore	330.000,00	100.000,00	0	100.000,00	1.940,02	0	1.940,02	-98%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2016. CHIUSURA CONTABILE NEL 2017. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO CHE I LAVORI ERANO STATI ANTICIPATI NEL 2016 COME GIA' COMUNICATO NELLA NOTA 2016.	
2014MOHA0057	Scolmo canale bianco nel canale dei Montanari da Via tabacchi	FOGNATURA	Modena	Gestore	430.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0058	Adeguamento linea fanghi depuratore Capoluogo (silos, centrifughe, digestori, ispessitori)	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	1.660.000,00	570.000,00	0	570.000,00	365.998,06	0	365.998,06	-36%	INTERVENTO IN CORSO, RITARDI LEGATI AI TEMPI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI UNA QUOTA PARTE DEI LAVORI.	
2014MOHA0059	Nuova dorsale da Collegarola a Martiniana	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0060	Adeguamento al D.Lgs.152 della sedimentazione finale del Depuratore	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	800.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0061	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Modena	Gestore	130.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO SOSPESO PER NECESSITA' DI INDIVIDUARE IL SISTEMA OTTIMALE PER IL MONITORAGGIO DELLE PORTATE DI RETE.	
2014MOHA0062	Sistemazione della Disinfezione nel Depuratore di San Damaso	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	90.000,00	0	0	0	55.331,41	0	55.331,41	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVVIO RITARDATO NEL 2015, GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DEL 2015.	
2014MOHA0063	Estendimento fognatura alle aree Cargill, Neutron, Montere	FOGNATURA	Modena	Gestore	90.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0220	Contatori multibusiness	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	660.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0225	Risanamento collettore di levante	FOGNATURA	Modena	Gestore	420.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0226	Installazione nuovo collettore di alimentazione per il sollevamento con elettropompe del depuratore	FOGNATURA	Modena	Gestore	450.000,00	0	0	0	0	0	0			
2015MOHA0010	ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE VIA D'AVIA	FOGNATURA	Modena	Gestore	250.000,00	100.000,00	0	100.000,00	5.166,29	0	5.166,29	-95%	RITARDI NELL'ATTIVITA' DI RILIEVO E PROGETTAZIONE PER LA PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'INTERVENTO.	
2017MOHA0001	Revamping impianto di Collegarola	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	200.000,00	0	0	0	0	0	0			
2017MOHA0014	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE PRADELLA	FOGNATURA	Modena	Gestore	100.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	DALLE ANALISI PRELIMINARI L'INTERVENTO PRESENTA DELLE COMPLESSITA' LEGATE AL FATTO CHE L'INFRASTRUTTURA SI SVILUPPA QUASI INTERAMENTE ALL'INTERNO DI AREA PRIVATA E HA SUBITO MODIFICHE CATASTALI NEL TEMPO. SONO IN CORSO APPROFONDIMENTI CON I TECNICI COMUNALI PER CAPIRE LO STATO PATRIMONIALE DELL'INFRASTRUTTURA.	
2014MOHA0064	Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Montecreto-Il Ciocco o collettamento al depuratore di Montecreto	FOGNATURA	Montecreto	Gestore	180.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0065	Rinnove reti acqua e fognatura via Fontana, Via Marconi, via Vaccari	FOGNATURA	Montecreto	Gestore	75.000,00	0	0	0	0	0	0			

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti annualità 2017 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	DOMANDE
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento		
2014MOHA0066	Realizzazione sistema di trattamento appropriato agglomerati vari a Montefiorino	FOGNATURA	Montefiorino	Gestore	1.350.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-100%	LA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA ADEGUATA SULLA BASE DELLA RIDEFINIZIONE DEGLI AGGLOMERATI E DELLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO, DEFINITA DAL DECRETO 201/2016 RER.	
2014MOHA0067	Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati >200 ab/eq in località: Casola - Pianezzo, Farneta Cimitero)	FOGNATURA	Montefiorino	Gestore	436.000,00	174.000,00	0	174.000,00	8.418,94	0	8.418,94	-95%	RIPIANIFICATO NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE FISSATE DALLA DGR 201/2016	
2014MOHA0068	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0069	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0070	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0071	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 8	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0072	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0073	Realizzazione e manutenzione straordinaria impianti di telecomando e telecontrollo SII	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.220.000,00	270.000,00	0	270.000,00	126.322,82	0	126.322,82	-53%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO COMPENSATI DA MAGGIORI INTERVENTI LEGATI ALL'EMERGENZA IDRICA (ID 2018MOHA0008).	
2014MOHA0074	Sostituzione pompe sorgente Nadia	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	150.000,00	0	0	0	35.751,18	0	35.751,18	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO DOVUTO A PARTE DELLE ATTIVITA' ANTICIPATE NEL 2016.	
2014MOHA0075	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0076	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0077	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0078	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 7	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0079	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0080	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0081	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0082	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0083	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0084	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0085	Collegamento Dragone da Madonna dei Baldaccini a Monte Ravaglia	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	300.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0086	Interventi di ripristino/pavimentazioni stradali a seguito di interventi manutentivi reti idriche.	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.100.000,00	150.000,00	0	150.000,00	301.215,05	0	301.215,05	101%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.	
2014MOHA0087	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0088	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0089	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0090	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 1	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0091	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0092	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0093	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0094	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0095	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 2	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0096	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0097	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0098	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti), con priorit? di intervento per il mantenimento della qualit? dell'acqua alle captazioni e la potabilizzazione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0099	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0100	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 3	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0101	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0102	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0			

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti annualità 2017 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	DOMANDE
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento		
2014MOHA0103	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0104	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0105	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 4	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0106	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0107	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0108	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti), con priorit? di intervento per il mantenimento della qualit? dell'acqua alle captazioni e la potabilizzazione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0109	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0110	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 5	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0111	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0112	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0113	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0114	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0115	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 9	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0116	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0117	modello matematico acquiferi modenesi	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	40.000,00		0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0118	Razionalizzazione e adeguamento dei serbatoi per la regolazione della pressione in rete in aree di montagna	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	900.000,00		100.000,00	0	100.000,00	38.657,02	0	38.657,02	-61%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO CON ATTIVITA' ANNUALI LEGATE AL FABBISOGNO. INTERVENTI IN CORSO.
2014MOHA0119	Ripristino asfalti per opere di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			50.000,00	0	50.000,00	88.013,26	0	88.013,26	76%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0120	Adeguamento attraversamenti ferroviari	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA'. NON MANIFESTATESI NECESSITA' NEL 2017
2014MOHA0121	Rilievo reti fognarie	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			20.000,00	0	20.000,00	32.446,43	0	32.446,43	62%	
2014MOHA0122	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0123	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0124	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0125	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0126	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0127	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0128	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0129	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0130	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0131	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0132	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0133	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0134	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0135	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0136	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0137	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0138	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0139	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore			0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0140	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			2.675.000,00	0	2.675.000,00	2.748.801,48	0	2.748.801,48	3%	
2014MOHA0141	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore			1.150.000,00	0	1.150.000,00	1.737.642,18	0	1.737.642,18	51%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti annualità 2017 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	DOMANDE
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento		
2014MOHA0142	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		1.300.000,00	0	1.300.000,00	1.348.372,63	0	1.348.345,06	4%		
2014MOHA0143	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		200.000,00	0	200.000,00	368.426,14	0	368.426,14	84%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.	
2014MOHA0144	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		850.000,00	0	850.000,00	912.616,48	0	912.616,48	7%		
2014MOHA0145	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		150.000,00	0	150.000,00	70.702,03	0	70.702,03	-53%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO SICUREZZA A COMPENSAZIONE DI MAGGIORI INVESTIMENTI NEL CONTO CUMULATIVO DEL TELECONTROLLO 2015MOHA0013	
2014MOHA0146	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		650.000,00	0	650.000,00	1.047.674,90	0	1.047.674,90	61%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.	
2014MOHA0147	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		130.000,00	0	130.000,00	98.324,19	0	98.324,19	-24%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, COMPENSATI DA MAGGIORI INTERVENTI DI NATURA PROGRAMMATA SULLE RETI ID 2014MOHA0146	
2014MOHA0218	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		178.000,00	0	178.000,00	261.986,84	0	261.986,84	47%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.	
2014MOHA0221	Potenziamento sistema idrico Dragone	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	350.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0223	Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		550.000,00	0	550.000,00	411.505,15	0	411.505,15	-25%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, COMPENSATI DA MAGGIORI INTERVENTI DI NATURA PROGRAMMATA ID 2014MOHA0146	
2015MOHA0011	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPI.ACQUEDOTTO MO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	3.450.000,00	160.000,00	0	160.000,00	95.818,42	0	95.818,42	-40%	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 4. NEL 2017 E' STATO AVVIATO L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO AL SERBATOIO OSPEDALE DI SASSUOLO. SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE. NEL 2018 PREVISTA COONCLUSIONE DEI LAVORI.	
2015MOHA0012	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI MO-ATO4	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.000.000,00	100.000,00	0	100.000,00	86.493,89	0	86.493,89	-14%		
2015MOHA0013	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.DEP.-MO-ATO4	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00	0	10.000,00	51.710,21	0	51.710,21	417%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO TELECONTROLLO A COMPENSAZIONE DI MINORI INVESTIMENTI NEL CONTO CUMULATIVO DEGLI ADEGUAMENTI SICUREZZA ID 2014MOHA0145	
2015MOHA0014	TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-MO-ATO4	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		20.000,00	0	20.000,00	52.405,56	0	52.405,56	162%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.	
2018MOHA0008	Interventi emergenza idrica 2017	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		0,00	0	0,00	294.695,34	0	294.695,34	100%		
2014MOHA0148	Realizzazione di collettamento fognario e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Monchio - Grande e di Savoniero	FOGNATURA	Palagano	Gestore	267.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0149	Collegamento scarichi Zona Artigianale Monticello al depuratore del capoluogo	FOGNATURA	Palagano	Gestore	206.000,00	0	0	0	10.565,03	0	10.565,03	100%	INTERVENTO CONCLUSO. MAGGIORI ONERI DOVUTI ALLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO ARAVECCHIA (ONERI PER SERVITU').	
2014MOHA0150	Revamping potabilizzatore Montespino	ACQUEDOTTO	Palagano	Gestore	260.000,00	30.000,00	0	30.000,00	36.453,83	0	36.453,83	22%		
2016MOHA0002	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI PALAGANO MONTE	FOGNATURA	Palagano	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2016MOHA0003	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO COSTRIGNANO-CASTELLACCIO	FOGNATURA	Palagano	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2017MOHA0009	ADEGUAMENTO COSTRIGNANO-CASTELLACCIO	DEPURAZIONE	Palagano	Gestore	350.000,00	10.000,00	0	10.000,00	7.593,00	0	7.593,00	-24%		
2017MOHA0011	ADEG.AGGLOMERATO DI PALAGANO MONTE	FOGNATURA	Palagano	Gestore	110.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0151	Ampliamento serbatoio principale di Serra di Porto e realizzazione di interconnessioni varie con le condotte principali in zona Montecuccolo.	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano	Gestore	520.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0152	Potenziamento impianto acque superficiali acquedotto Scoltenna - Intervento suddiviso in due stralci funzionali.	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano	Gestore	500.000,00	20.000,00	0	20.000,00	127.166,19	0	127.166,19	536%	INTERVENTI STRAORDINARI LEGATI ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELL'APPENNINO DURANTE LA LUNGA STAGIONE SICCTOSA 2017.	
2014MOHA0153	Castagneto: realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	Gestore	400.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0154	Realizzazione di collettori e sistemi di trattamento appropriato in agglomerati di piccole dimensioni (Pian di Scuola, C? Bosi - polo produttivo, Olina, C? d'Olina, Scalella, Bivio di Renno, Monzone Casa Piombini, Camatta, Casa Bellei)	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	Gestore	3.300.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTI IN AGGLOMERATI < 200 AE CON TEMPISTICHE RIVISTE IN BASE A D.G.R. 201/2016	
2014MOHA0155	Verica: realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato	DEPURAZIONE	Pavullo nel Frignano	Gestore	1.050.000,00	40.000,00	0	40.000,00	12.779,23	0	12.779,23	-68%	RITARDI CAUSATI DA CRITICITA' RISCONTRATE NELL' ACQUISIZIONE DELL' AREA	
2014MOHA0156	Collettamento alla rete di Pavullo capoluogo dell'agglomerato di Acquabuona	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	Gestore	230.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0157	Interconnessione dell'acquedotto rurale ""Il Sorbo"" in localit? Frassinetti	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano	Gestore	165.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0158	Collegamento condotte Scoltenna e Dragone al serbatoio Il Poggio	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano	Gestore	60.000,00	0	0	0	0	0	0			

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti annualità 2017 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	DOMANDE
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento		
2014MOHA0159	Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato a Coscogno	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	Gestore	563.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-100%	LA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA ADEGUATA SULLA BASE DELLA RIDEFINIZIONE DEGLI AGGLOMERATI E DELLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO, DEFINITA DAL DECRETO 201/2016 RER.	
2014MOHA0160	TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO II STRALCIO - ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO PIANELLI	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	Gestore	560.000,00	10.000,00	0	10.000,00	18.854,47	0	18.854,47	89%		
2014MOHA0161	Sistemazione laghi di accumulo impianto di potabilizzazione Scoltenna	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano	Gestore	190.000,00	30.000,00	0	30.000,00	1.022,25	0	1.022,25	-97%	INTERVENTO POSSIBILE SOLO DURANTE STAGIONALITA' PARTICOLARMENTE IDONEE FINO AD OGGI NON VERIFICATESI.	
2014MOHA0162	TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO IV STRALCIO - ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO RENNO DI SOPRA-PIANTACROCE	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	Gestore	510.000,00	100.000,00	0	100.000,00	16.326,39	0	16.326,39	-84%	SLITTAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA A CAUSA DELL'OPPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DELLA SCELTA PROGETTUALE CHE HA FATTO PREVALERE LA SOLUZIONE DEL COLLETTAMENTO VERSO IL DEPURATORE DI PAVULLO PIUTTOSTO CHE IL TRATTAMENTO IN LOCO DEI REFLUI.	
2014MOHA0163	TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO III STRALCIO	DEPURAZIONE	Pavullo nel Frignano	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2015MOHA0015	POTENZIAMENTO RETE PAVULLO CENTRO	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano	Gestore	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0016	POTENZIAMENTO IMP. BALDACCINI-AMBERO (II STR)	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano	Gestore	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0017	NUOVO COLLEGAMENTO SERRA PORTO-MONTECUCCOLO	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2017MOHA0013	ELIM.ACQ.PARASSITE E RIS.CANALE COGORNO	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	Gestore	520.000,00	20.000,00	0	20.000,00	62.711,81	0	62.711,81	214%	SCOSTAMENTO DOVUTO A MAGGIORI ATTIVITA' PROGETTUALI, IN PARTICOLARE LEGATE ALLA NECESSITA' DI CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE IN INGRESSO ALLA RETE FOGNARIA DAL RETICOLO SUPERFICIALE.	
2014MOHA0164	Realizzazione sistema di trattamento appropriato e opere di collettamento nell'agglomerato di Sant'Anna Pelago	DEPURAZIONE	Pievepelago	Gestore	1.050.000,00	25.000,00	0	25.000,00	15.670,88	0	15.670,88	-37%		
2014MOHA0165	Installazione impianto di disinfezione	ACQUEDOTTO	Pievepelago	Gestore	50.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.922,19	0	10.922,19	9%		
2014MOHA0166	Rilievo, Pianificazione e realizzazione attivit? di manutenzione straordinaria sulle sorgenti	ACQUEDOTTO	Pievepelago	Gestore	30.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.524,70	0	5.524,70	10%		
2014MOHA0167	Ottimizzazione rete acquedottistica rurale di Pievepelago-localit? Fontanini	ACQUEDOTTO	Pievepelago	Gestore	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2017MOHA0002	COLLETTAMENTO CASONI A PIEVEPELAGO	FOGNATURA	Pievepelago	Gestore	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2017MOHA0007	NUOVO SERBATOIO PERSELLO	ACQUEDOTTO	Pievepelago	Gestore	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0168	Collettamento della localit? Casale a Casa Marini	FOGNATURA	Polinago	Gestore	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0169	Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Casa Nogato	FOGNATURA	Polinago	Gestore	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0170	CASA AZZONI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO OVVERO COLLETTAMENTO ALL'AGGLOMERATO DI SASSUOLO	DEPURAZIONE	Prignano sulla Secchia	Gestore	450.000,00	15.000,00	0	15.000,00	7.609,60	0	7.609,60	-49%		
2015MOHA0018	NUOVO COLLEGAMENTO RETE CASA GALLO-GUAITAROLA	ACQUEDOTTO	Prignano sulla Secchia	Gestore	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO SONO IN CORSO VALUTAZIONI PER LA TEMPSTICA DI MESSA IN ESERCIZIO IN FUNZIONE DI ALTRI INTERVENTI	
2015MOHA0019	POTENZIAMENTO RETE POGGIOLROSSO	ACQUEDOTTO	Prignano sulla Secchia	Gestore	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0020	NUOVO COLLEGAMENTO SERBATOIO LA FREDDA-IMPIANTO VALLEURBANA	ACQUEDOTTO	Prignano sulla Secchia	Gestore	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0171	Perforazione di un nuovo pozzo per uso idropotabile nel Campo Acquifero di San Cesario s.P. in sostituzione di un pozzo che presenta problemi di nitrati.	ACQUEDOTTO	San Cesario sul Panaro	Gestore	400.000,00	165.000,00	0	165.000,00	10.703,89	0	10.703,89	-94%	RITARDI CAUSATI DAL MANCATO VIA LIBERA DI ATERSIR A PROCEDERE (PRIMA RICHIESTA AD ATERSIR DEL 21/01/2015 PER VALUTARE LA POSSIBILITA' DI AVVIARE LA VIA PER LA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO).	
2014MOHA0172	Costruzione di un sistema irriguo in pressione nell'area del Comune di San Cesario.	ACQUEDOTTO	San Cesario sul Panaro	Gestore	2.350.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0173	Collettamento S. Cesario a Castelfranco	FOGNATURA	San Cesario sul Panaro	Gestore	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0174	Estendimenti rete acquedottistica Via San Gaetano, via Bosco, via Molza, via Monchio, via Benedello, via Bosco, via Castelleone, via Parolaro, via De Giacomi, Via Modenese	ACQUEDOTTO	San Cesario sul Panaro	Gestore	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0021	STUDIO ACQUE PARASSITE E INTERVENTI	FOGNATURA	San Cesario sul Panaro	Gestore	60.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2016. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO.	
2017MOHA0012	DEP S.CESARIO SP_SOSTITUZIONE AREAZIONE	DEPURAZIONE	San Cesario sul Panaro	Gestore	150.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	NECESSARIA RIPROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO AL FINE DI MINIMIZZARE L'IMPATTO AMBIENTALE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, CHE ALTRIMENTI AVREBBERO CONDIZIONATO PESANTEMENTE L'EFFICIENZA DELL'IMPIANTO.	
2014MOHA0175	Estendimento rete in via Ancora a nord della Pedemontana	FOGNATURA	Sassuolo	Gestore	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0176	Estendimento rete tra via Umbria e via dell'Artigianato	FOGNATURA	Sassuolo	Gestore	50.000,00	20.000,00	0	20.000,00	76.436,49	0	76.436,49	282%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2017. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE DEGLI IMPORTI 2016 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL'ANNUALITA' 2016	
2014MOHA0177	RINN.RETE - V.MONTEGIBBIO - IqST	ACQUEDOTTO	Sassuolo	Gestore		0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0178	classificazione potabile acqua Secchia	ACQUEDOTTO	Sassuolo	Gestore	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0179	Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio degli scolmatori a forte impatto SAS1-1 e SAS1-3	FOGNATURA	Sassuolo	Gestore	926.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO SU ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, CON TEMPSTICHE RIVISTE IN BASE A D.G.R. 201/2016	
2014MOHA0180	Revamping impianto di potabilizzazione di Santa Cecilia	ACQUEDOTTO	Sassuolo	Gestore	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0		

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti annualità 2017 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto al preventivo e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	DOMANDE
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento		
2015MOHA0022	POTENZIAMENTO RETE VALLEURBANA-VIA MURAGLIE	ACQUEDOTTO	Sassuolo	Gestore	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0023	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA SASSUOLO	ACQUEDOTTO	Sassuolo	Gestore	100.000,00	15.000,00	0	15.000,00	16.070,10	0	16.070,10	7%		
2014MOHA0181	Potenziamento del depuratore del Capoluogo (2 ^o stralcio).	DEPURAZIONE	Savignano sul Panaro	Gestore	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0182	Riassetto campo pozzi Bocchirolo	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	Gestore	200.000,00	40.000,00	0	40.000,00	22.206,61	0	22.206,61	-44%		
2014MOHA0183	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Savignano sul Panaro	Gestore	220.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0184	Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per alimentare Vignola	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	Gestore	50.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	-100%	L'INTERVENTO E' STRETTAMENTE CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RELATIVA CONDOTTA DI TRASPORTO (TRACCIATA CON ID 2014MOHA0211-ADDUTTRICE SAVIGNANO - VIGNOLA (GESSIERE)) LA CUI REALIZZAZIONE E' STATA COMPLETATA SOLO A FINE 2017. IL SISTEMA DI POMPAGGIO NEL 2017 SAREBBE RISULTATO INATTIVABILE PER L'ASSENZA DELLA CONDOTTA; PERTANTO LA SUA REALIZZAZIONE E' STATA POSTICIPATA ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE	COME MAI?
2014MOHA0185	Potenziamento campo pozzi Magazzino	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	Gestore	170.000,00	80.000,00	0	80.000,00	36.779,79	0	36.779,79	-54%	SCOSTAMENTO DOVUTO A PARTE DELLE ATTIVITA' ANTICIPATE NEL 2016	
2014MOHA0186	Collegamento fognario C2 d'Oirina - Fondaccia	FOGNATURA	Serramazzoni	Gestore	115.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0187	COLLETTAMENTO SCARICHI DI RICCO' E SAN DALMAZIO AL DEPURATORE ESISTENTE DI SAN DALMAZIO	DEPURAZIONE	Serramazzoni	Gestore	445.000,00	90.000,00	0	90.000,00	12.052,88	0	12.052,88	-87%	RITARDI NELL'AVVIO DEI LAVORI DOVUTI ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE (SERVITU').	
2014MOHA0188	Risanamento fognario località Varana/Pescarola e impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Serramazzoni	Gestore	600.000,00	10.000,00	0	10.000,00	2.222,73	0	2.222,73	-78%		
2014MOHA0189	Collettamento dello scarico non trattato di Pompeano Nord alla fossa Imhoff di Pompeano Sud e potenziamento della Imhoff	FOGNATURA	Serramazzoni	Gestore	80.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0190	Realizzazione di trattamento appropriato nell'agglomerato di La Barbona	FOGNATURA	Serramazzoni	Gestore	50.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0191	Opere di collettamento dell'agglomerato di Casa Principe - Casa Camerieri alla rete di Casa Naldi o al sollevamento della Fondaccia	FOGNATURA	Serramazzoni	Gestore	150.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0192	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Villaggio Caselletta	FOGNATURA	Serramazzoni	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0193	Rifacimento strada di accesso e condotta al Depuratore di Casa Tadioli	DEPURAZIONE	Serramazzoni	Gestore	80.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0194	Consolidamento fondazioni depuratore Casa Tadioli ammalorate in seguito a frana	DEPURAZIONE	Serramazzoni	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
2017MOHA0015	NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO MONTARDONE	ACQUEDOTTO	Serramazzoni	Gestore	200.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0195	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato negli agglomerati di Rovinaccia	FOGNATURA	Sestola	Gestore	240.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0196	Estensione rete fognaria alle aree da servire all'interno del capoluogo e nell'agglomerato di Vesale	FOGNATURA	Sestola	Gestore	80.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0197	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	30.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0198	Sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro Nord	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	40.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-100%	L'IMPORTO PREVISTO NEL 2017 ERA UNICAMENTE LEGATO ALLE VALUTAZIONI PRELIMINARI SULLO SVILUPPO DELL'INTERVENTO, LA CUI REALIZZAZIONE E' COMUNQUE PREVISTA FUORI ARCO PIANO IN QUANTO TRATTASI DI UN BACK-UP ALL'ATTUALE CAMPO POZZI. POICHE' AD OGGI NON SUSSISTONO CRITICITA' SUL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO SI E' RITENUTO OPPORTUNO POSTICIPARE LO STUDIO DI FATTIBILITA' FUORI ARCO PIANO IN COERENZA ALL'IPOTESI DI AVVIO DI UNA PROGETTAZIONE PUNTUALE.	COME MAI?
2014MOHA0199	Manutenzione straordinaria serbatoio Coccia	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	430.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0200	Potenziamento sistema areazione depuratore centrale	DEPURAZIONE	Spilamberto	Gestore	227.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0201	Contributo per realizzazione scolmatore della fognatura in Panaro in Via Pontemarianna	FOGNATURA	Spilamberto	Gestore	120.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0202	Nuova condotta Coccia - Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	510.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0203	Nuova condotta Sant'Eusebio - Settecani	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	900.000,00	150.000,00	0	150.000,00	157.447,82	0	157.447,82	5%		
2014MOHA0204	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Spilamberto	Gestore	40.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0205	Realizzazione nuovo pompaggio Coccia per Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	50.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0206	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL DEPURATORE	DEPURAZIONE	Spilamberto	Gestore	170.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0207	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	200.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0208	Adduttrice Spilamberto - Vignola - Gessiere. Il ^o tratto	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	850.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0209	RINN.RETE FRIGNANESE-REPUBB VIG.1 ^o S	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	125.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0210	RINN RETE AC - VIA DOCCIA	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	0	0	0	0	0	0	0			

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti annualità 2017 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	DOMANDE
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento		
2014MOHA0211	Adduttrice Savignano - Vignola (Gessiere)	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	305.000,00	0	0	0	300.319,80	0	300.319,80	100%	ANTICIPATO E CONCLUSO IL PRIMO STRALCIO (PREVISTO NEL 2019-20) FUNZIONALE ALLA SITUAZIONE SICCITOSA. PREVISTA PER LE FUTURE ANNUALITA' LA REALIZZAZIONE DEL II STRALCIO RELATIVO AL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA PONTE MURATORI E VIA PORTELLO.	
2014MOHA0212	Realizzazione impianto di potabilizzazione nella centrale Baroni	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	150.000,00	50.000,00	0	50.000,00	58.539,11	0	58.566,68	17%		
2014MOHA0213	Realizzazione serbatoio di accumulo nella centrale di Fogazzaro	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	210.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0214	Adeguamento collettore fognario via Vittorio Veneto	FOGNATURA	Vignola	Gestore	315.000,00	60.000,00	0	60.000,00	108.132,85	0	108.132,85	80%	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO NEL 2017. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO ALL'ANTICIPAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NEL 2018.	
2014MOHA0215	Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore	DEPURAZIONE	Vignola	Gestore	200.000,00	0	0	0	83.593,97	0	83.593,97	100%	SLITTAMENTO AL 2017 DI PARTE DEI LAVORI ORIGINARIAMENTE PROGRAMMATI NEL 2016, DOVUTO A RITARDI NEI TEMPI DI CONSEGNA DELLA CENTRIFUGA.	
2014MOHA0224	Potenziamento areazione depuratore, sistemazione impianto elettrico	DEPURAZIONE	Vignola	Gestore	300.000,00	0	0	0	0	0	0			
2015MOHA0024	NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	980.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOHA0216	Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati vari a Zocca	DEPURAZIONE	Zocca	Gestore	850.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO ESPLICITANDO GLI AGGLOMERATI INTERESSATI DALL'ADEGUAMENTO (CASA NADINO- CA' RAME- VERUCCHIA, CLASSI DI CONSISTENZA 200-2000 CON TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016). NUOVI ID 2017MOHA0017 - 2017MOHA0018 - 2017MOHA0019	
2014MOHA0217	ADEGUAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI MONTEOMBRARO CAMPAZZO	FOGNATURA	Zocca	Gestore	160.000,00	135.000,00	0	135.000,00	1.302,40	0	1.302,40	-99%	CONCLUSA PROGETTAZIONE. INIZIO LAVORI RIPIANIFICATO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI TEMPORALI DEL DECRETO 201/2016 RER.	
2017MOHA0017	ADEG. AGGLOM. MONTE CORONE CASA NADINO	FOGNATURA	Zocca	Gestore	450.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-100%	POSTICIPATA PROGETTAZIONE AL 2018, NEL RISPETTO COMUNQUE DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016	
2017MOHA0018	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO VERUCCHIA	DEPURAZIONE	Zocca	Gestore	200.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	-100%	IMPORTO 2017 PER ATTIVITA' PRELIMINARI NON RILEVANTI. AVVIO ATTIVITA' PROGETTUALE NEL 2018	
2017MOHA0019	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' RAME	DEPURAZIONE	Zocca	Gestore	200.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	-100%	IMPORTO 2017 PER ATTIVITA' PRELIMINARI NON RILEVANTI. AVVIO ATTIVITA' PROGETTUALE NEL 2018	
						12.957.000	0	12.957.000	12.948.467	24.590	12.923.877			
						12.957.000	0	12.957.000	12.948.467	24.590	12.923.877			

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 4 del 18.03.2019

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 18 marzo 2019

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena
F.to Caterina Bagni

Il segretario verbalizzante
F.to Elisa Di Francesca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 maggio 2019
