

CLPC/2018/7 del 19/12/2018

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore IRETI S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2017**

IL COORDINATORE

F.to Dott. Giuseppe Sidoli

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

CLPC/2018/7

L'anno **2018** il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10,30 presso la Sala Consiglio della Provincia di Piacenza – Via Garibaldi n. 50 -, si è riunito il Consiglio Locale di Piacenza convocato con lettera PG/AT/2018/7888 del 12 dicembre 2018.

Assume la presidenza il Coordinatore Giuseppe Sidoli, che chiama la signora Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
AGAZZANO			NO	0,7848
ALSENO	Zucchi Davide	Sindaco	SI'	1,5682
ALTA VAL TIDONE	Aradelli Andrea	Vice Sindaco	SI'	1,1488
BESENZONE			NO	0,4734
BETTOLA	Negri Paolo	Sindaco	SI'	1,0491
BOBBIO	Pasquali Roberto	Sindaco	SI'	1,2518
BORGONOVO	Sogni Nicola	Consigliere	SI'	2,3674
CADEO			NO	1,9180
CALENDASCO	Zangrandi Francesco	Sindaco	SI'	0,8923
CAORSO			NO	1,5702
CARPANETO			NO	2,3406
CASTELL'ARQUATO			NO	1,5367
CASTEL S. GIOVANNI			NO	4,0744
CASTELVETRO	Luca Quintavalla	Sindaco	SI'	1,7848
CERIGNALE			NO	0,2398
COLI			NO	0,4674
CORTEBRUGNATELLA			NO	0,3866
CORTEMAGGIORE	Zilli Maria Rosa	Assessore	SI'	1,4638
FARINI			NO	0,6097
FERRIERE	Malchiodi Giovanni	Sindaco	SI'	0,6012
FIORENZUOLA D'ARDA	Minari Marcello	Assessore	SI'	4,4321

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
GAZZOLA	Maserati Simone	Sindaco	SI'	0,7646
GOSSOLENGO			NO	1,7413
GRAGNANO	Calza Patrizia	Sindaco	SI'	1,4439
GROPPARELLO	Ghittoni Claudio	Sindaco	SI'	0,8570
LUGAGNANO			NO	1,3781
MONTICELLI D'ONG.	Distante Gimmi	Sindaco	SI'	1,7404
MORFASSO	Calestani Paolo	Sindaco	SI'	0,5101
OTTONE			NO	0,3579
PIACENZA	Mancioppi Paolo	Assessore	SI'	28,7436
PIANELLO			NO	0,8474
PIOZZANO	Burgazzoli Lorenzo	Sindaco	SI'	0,3784
PODENZANO	Scaravella Mario	Vice Sindaco	SI'	2,7542
PONTEDELL'OLIO			NO	1,6004
PONTENURE			NO	2,0094
RIVERGARO	Mezzadri Marina	Assessore	SI'	2,1460
ROTOFRENO			NO	3,5086
S.GIORGIO P.NO			NO	1,8514
S. PIETRO IN CERRO	Sogni Manuela	Sindaco	SI'	0,4592
SARMATO	Tanzi Anna	Sindaco	SI'	1,0264
TRAVO	Albasi Ludovico	Sindaco	SI'	0,7628
VERNASCA	Sidoli Giuseppe	Sindaco	SI'	0,8334
VIGOLZONE			NO	1,4103
VILLANOVA			NO	0,7466
ZERBA	Borre' Claudia	Sindaco	SI'	0,2218
ZIANO			NO	0,9456
PROVINCIA di PIACENZA			NO	10,0000

Presenti n. 24 quote 59,20

Assenti n. 23 quote 40,80

Riconosciuta la validità della seduta, il Dott. Giuseppe Sidoli, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore IRETI S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2017**

Vista la L.R. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 1 del 21 marzo 2016 del Consiglio Locale di Piacenza è stato approvato l'Aggiornamento del Programma degli Interventi per gli anni 2015-2019 e la Proposta di integrazione del Piano di Ambito e di variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 32 del 26 aprile 2016 del Consiglio d'Ambito è stata approvata l'Integrazione del Piano d'Ambito di Piacenza conseguentemente all'approvazione del consuntivo degli interventi 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui allo schema regolatorio AEEGSII;
- con deliberazione n. 54 del 07 ottobre 2016 del Consiglio d'Ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Piacenza, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano degli Interventi e del Programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato"; tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che il gestore IRETI S.p.A. ha effettuato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2015-19 approvato con Deliberazione n.1 del 21 marzo 2016 dal Consiglio Locale di Piacenza, fatto salvo le revisioni ordinarie in conformità alla Deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 di Consiglio d'Ambito "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano degli Interventi e del Programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato";
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati risultano nella maggior parte scostati rispetto agli importi pianificati nel Programma degli interventi 2015-2019 approvato (differenze che derivano sostanzialmente dall'anticipo o nuova introduzione di interventi necessari a causa dell'emergenza idrica, da altri scostamenti dovuti ad approfondimenti progettuali o a difficoltà di acquisizione delle aree necessarie; vedi tabella 1 allegato 1);
- sono presenti n.42 interventi nel programma operativo interventi 2015-2019 che hanno avuto avvio anticipato nel 2017 o chiusura, sempre nel 2017, di interventi programmati nelle precedenti annualità, per un importo complessivo di € 2.546.605;
- non sono stati avviati n.21 interventi, per un importo complessivo di € 3.392.747;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti totali netti a tariffa realizzati risultano essere superiori, rispetto a quanto previsto dal programma operativo, per un importo di € 1.586.093; gli investimenti totali lordi risultano invece inferiori, rispetto a quanto programmato, per un importo di € 1.389.528 (differenza dovuta soprattutto alla mancata erogazione dei contributi pianificati a favore degli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del 2015);
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per n.8 interventi, in caso di scostamento, le note giustificative del Gestore non sono state ritenute esaustive;

ritenuto pertanto

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di avviare un supplemento istruttorio relativo agli otto interventi per i quali le motivazioni fornite non sono state ritenute soddisfacenti;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 24 (quote 59,20), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 per il gestore IRETI S.p.A. per il bacino tariffario di Piacenza come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla struttura tecnica di ATERSIR l'incarico di svolgere un supplemento di istruttoria sugli interventi identificati dalla tabella 2 della relazione allegata, per i quali non sono state giudicate esaustive le motivazioni addotte dal gestore a giustificazione dei ritardi rilevati rispetto al cronoprogramma di pianificazione, finalizzato alla valutazione delle azioni da intraprendere nei confronti del gestore ai sensi della vigente convenzione di regolazione del Servizio Idrico;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2017
Gestore: IRETI S.p.A. (PC)**

2 dicembre 2018

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Piacenza n.1 del 21 marzo 2016, che il gestore IRETI S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2017		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017	
Importo Lordo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 16.881.247	-€ 1.389.528	€ 15.491.719	Importo Lordo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 3.098.956	-€ 2.975.621	€ 123.335	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 13.782.291	€ 1.586.093	€ 15.368.384	Importo Netto Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

Dalla tabella si nota come il gestore IRETI S.p.A. abbia effettuato investimenti con scostamenti rispetto alla pianificazione approvata (integrata con n.25 nuovi investimenti autorizzati con nulla-osta ATERSIR - Delibera di Consiglio d'Ambito n.75/2017): rispetto agli investimenti lordi la differenza ammonta a - € 1.389.528, mentre facendo il confronto con gli investimenti netti il divario è di + € 1.586.093 a fronte dei contributi incassati pari a € 123.335, decisamente inferiori rispetto ai € 3.098.956 previsti.

Per avere un quadro più esaustivo degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi, nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

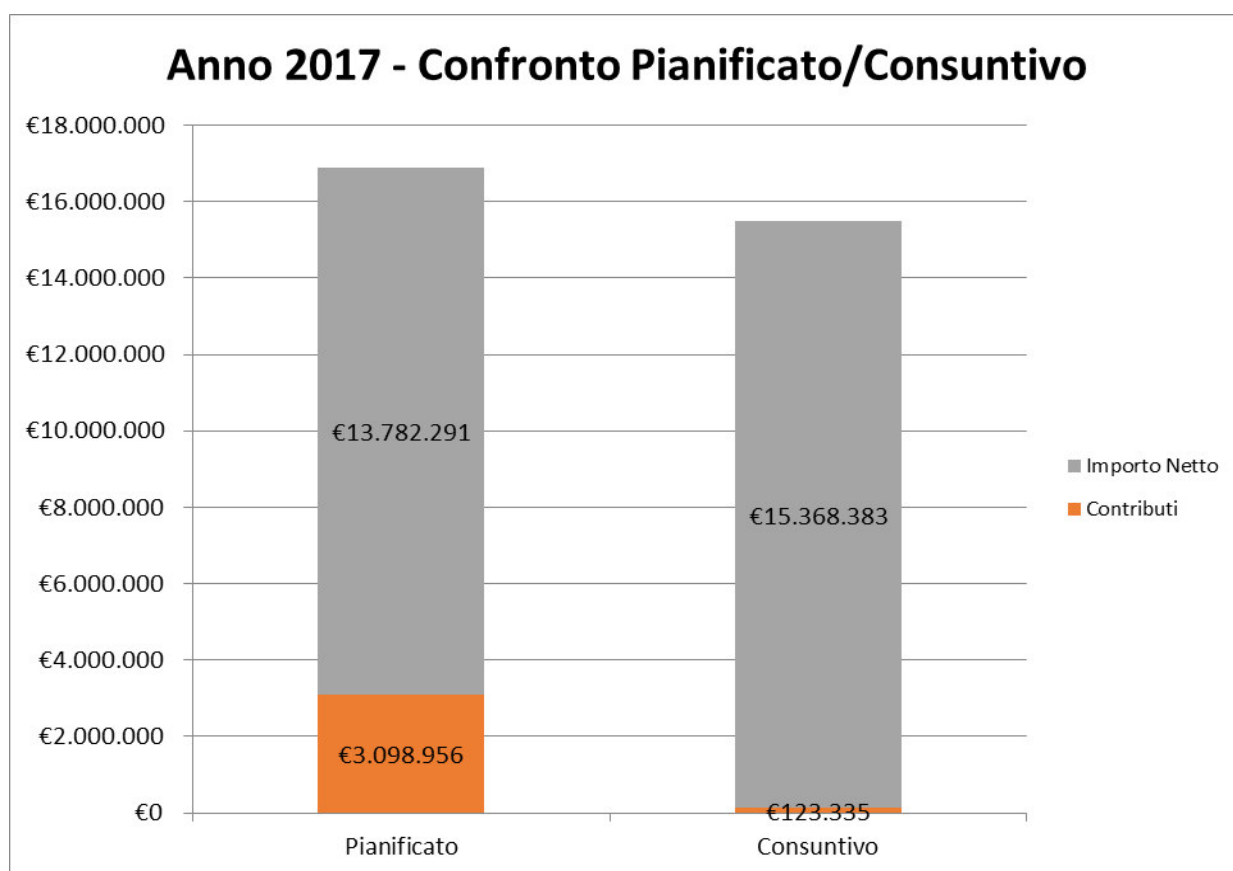


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

**ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZA IDRICA FINANZIATI INTERAMENTE DALLA PROTEZIONE CIVILE
INCREMENTO CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017**

Il gestore ha inoltre avviato nel 2017, e terminato nel 2018, una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile - atto DPGR n. 158/2017 e DPGR 178/2017 – che sono attualmente in corso di rendicontazione e che ammontano a ulteriori circa € 3.000.000.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato pianificato, e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata ritenuta esaustiva da ATERSIR.

Numero di interventi pianificati nel 2017: 95 - Numero di interventi rendicontati nel 2017: 115

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
Interventi non avviati scostamento pari al -100% (di cui 3 già conclusi)	21	€ 0	€ 3.392.747	2015PCIE0125 2015PCIE0139	2014PCIE0024 2014PCIE0035 2015PCIE0094 2015PCIE0097 2015PCIE0102 c 2015PCIE0107 c 2015PCIE0112 2015PCIE0115 2015PCIE0126 2015PCIE0130 2015PCIE0134 2016PCIE0154 2016PCIE0170 2016PCIE0172 c 2016PCIE0173 c 2016PCIE0178 2016PCIE0179 2017PCIE0217 2017PCIE0225
<i>*di cui interventi autorizzati con nulla-osta CAMB 75/2017</i>	2		€ 115.000		
Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	42	€ 2.546.605	€ 0		2014PCIE0002 2014PCIE0006 2014PCIE0009 2014PCIE0018 2014PCIE0022 2014PCIE0023 2014PCIE0036 2014PCIE0037 2014PCIE0040 2014PCIE0042 2014PCIE0051 2014PCIE0052 2014PCIE0056 2014PCIE0057 2014PCIE0060 2014PCIE0062 2014PCIE0065 2014PCIE0068 2015PCIE0075 2015PCIE0083 2015PCIE0090 2015PCIE0091 2015PCIE0106 2016PCIE0153 2016PCIE0155

					2016PCIE0157 2016PCIE0163 2016PCIE0164 2016PCIE0166 2016PCIE0167 2016PCIE0176 2016PCIE0177 2016PCIE0185 2016PCIE0187 2016PCIE0194 2016PCIE0195 2017PCIE0210 2018PCIE0227 2018PCIE0228 2018PCIE0258 2018PCIE0282 2018PCIE0295
<i>*di cui interventi autorizzati con nulla-osta CAMB 75/2017</i>	1	€ 6.596			
<i>* di cui interventi P.O.I. Del.CL PC 3/2018 anticipati al 2018</i>	4	€ 1.112.718			
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	61	€ 11.685.336	€ 12.218.500	2014PCIE0010 2014PCIE0013 2014PCIE0020 2014PCIE0030 2014PCIE0032 2014PCIE0041	2014PCIE0001 2014PCIE0004 2014PCIE0005 2014PCIE0007 2014PCIE0008 2014PCIE0011 2014PCIE0014 2014PCIE0015 2014PCIE0016 2014PCIE0021 2014PCIE0027 2014PCIE0033 2014PCIE0039 2014PCIE0046 2014PCIE0047 2014PCIE0048 2014PCIE0059 2014PCIE0063 2014PCIE0071 2014PCIE0072 2015PCIE0084 2015PCIE0086 2015PCIE0087 2015PCIE0088 2015PCIE0092 2015PCIE0096 2015PCIE0098 2015PCIE0114 2015PCIE0117 2015PCIE0118 2015PCIE0119 2015PCIE0120 2015PCIE0121 2015PCIE0124 2015PCIE0128 2015PCIE0133 2015PCIE0141 2016PCIE0165 2016PCIE0186 2016PCIE0188 2016PCIE0189 2016PCIE0196 2017PCIE0198 2017PCIE0204 2017PCIE0206 2017PCIE0209 2017PCIE0212 2017PCIE0213 2017PCIE0214 2017PCIE0215 2017PCIE0216

					2017PCIE0218 2017PCIE0220 2017PCIE0223 2017PCIE0224
<i>*di cui interventi modificati con nulla-osta CAMB 75/2017</i>	1	€ 359.114	€ 500.000		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	13	€ 1.259.778	€ 1.270.000		
<i>*di cui interventi autorizzati con nulla-osta CAMB 75/2017</i>	8	€ 676.854	€ 695.000		
TOTALE INVESTIMENTI		€ 15.491.719	€ 16.881.247		

TAB.2 – Numero di interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato (esclusi ulteriori interventi emergenza idrica e finanziati Protezione Civile)

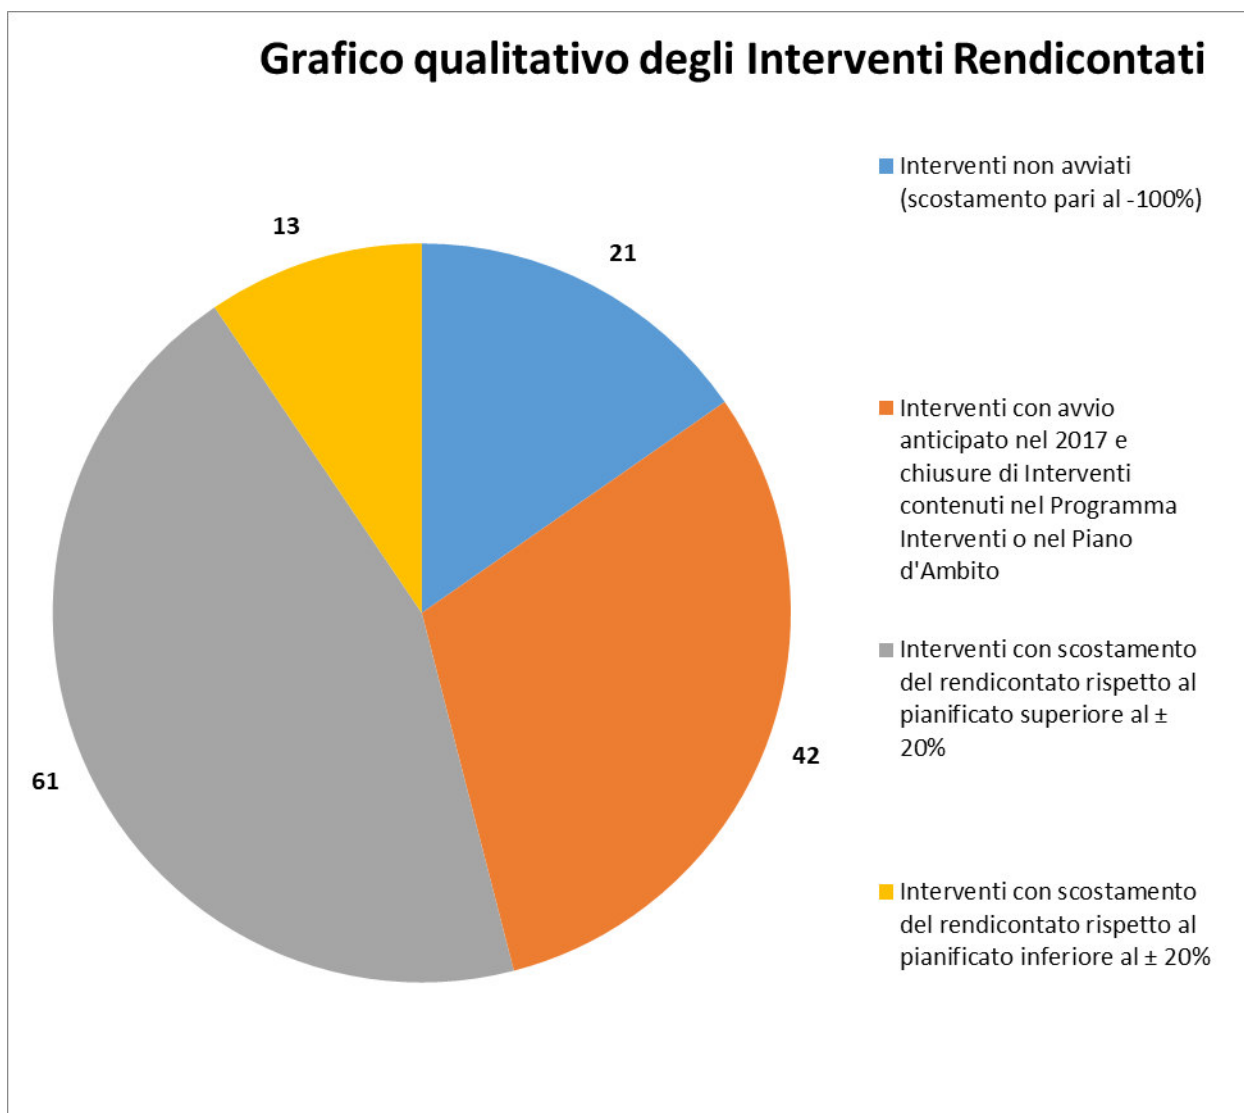


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

Comune	ID ATERSIR	Descrizione intervento	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2017
Rottofreno, Grandi opere, Calendasco	2014PCIE0024	G20090011 -Sistema depurativo a servizio del comune di CALENDASCO - indennità servitù e danni - adeguamento e messa in sicurezza viabilità di accesso al nuovo depuratore	1.750.000	150.000
Bobbio	2014PCIE0035	P2010011 - Ristrutturazione sedimentatore.	60.000	54.000
Besenzone	2015PCIE0094	Rifacimento reti acquedotto via della Libertà e piazza Repubblica	200.000	100.000
Bobbio	2015PCIE0097	Sistemazione adduttrice da sorgente Arelli - studio preliminare	10.000	10.000
Caorso	2015PCIE0102	Rifacimento rete acquedotto e rete fognaria via Molinazzo (TERMINATO ANT.)	150.000	50.000
Castel San Giovanni	2015PCIE0107	Rifacimento rete fognaria via Simonetti (TERMINATO ANT.)	100.000	10.000
Cortemaggiore	2015PCIE0112	Progettazione impianto depurazione di Chiavenna Landi - studio di fattibilità	10.000	10.000
Fiorenzuola	2015PCIE0115	Rifacimento sottoservizi rotonda Via Illica	80.000	80.000
Ottone	2015PCIE0125	Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e Bertassi (frane)	50.000	25.000
Podenzano	2015PCIE0126	Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio: studio di fattibilità	1.200.000	150.000
Pontenure	2015PCIE0130	Rifacimento impianto elettrico impianto di depurazione e nuova linea pretrattamento liquami	190.000	180.000
Sarmato	2015PCIE0134	Estendimento acquedotto rete idrica su SPR10-via Emilia Est - verifica fattibilità per acquisizione	61.000	10.000
Vernasca	2015PCIE0139	Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Vernasca Rete1 e collegamenti fognar	300.000	50.000
Rivergaro	2016PCIE0154	Completamento rete fognaria in loc. Bassano.	70.000	70.000
Rivergaro	2016PCIE0170	Interventi straordinari sull'impianto di sollevamento Molinazzo	314.000	264.000
Travo	2016PCIE0172	Interventi straordinari sul pozzo Campo Sportivo (TERMINATO ANT.)	150.000	100.000
Bobbio	2016PCIE0173	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Bobbio capoluogo (TERMINATO ANT.)	200.000	74.747
Grandi opere, Ferreri, Farini	2016PCIE0178	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto ponte Cantoniera - Ponte Nano	1.145.000	1.145.000
Grandi opere, Bettola	2016PCIE0179	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto Case Camia - Maioli	745.000	745.000
Travo	2017PCIE0217	* Interconnessione tra serbatoio Bobbiano e la località Chiosi	15.000	15.000
Pecorara	2017PCIE0225	* 1° stralcio, interconnessione tra serbatoio Bobbio e serbatoio Roncaglie a beneficio di Pecorara (tubazione provvisoria)	100.000	100.000
		TOTALE INVESTIMENTI NON AVVIATI		€ 3.392.747

TAB.3 – Interventi programmati nel 2017 e non realizzati (percentuale di scostamento pari a -100%)

ALLEGATO 1

IRETI - PIACENZA - CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2017

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	COMUNE	PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO DELIBERA CONSIGLIO LOCALE N.1/2016				CONSUNTIVO RENDICONTATO - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
			IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificato 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento %	Note giustificative in caso di scostamento maggiore del ±20% del consuntivo rispetto a quanto pianificato, e in caso di interventi nuovi (non previsti nel 2017)
2014PCIE0001	Z03 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Osteria Nuova 2 e relativi collegamenti fognari (studio fattibilità NUOVA SOLUZIONE)	Vernasca	€ 115.000	€ 85.000	€ 0	€ 85.000	€ 742	€ 0	€ 742	-99	Intervento posticipato ad annualità successive, per far fronte ad altre necessità.
2014PCIE0002	E2008001 - Potenziamento vasche dell'impianto di depurazione di Borgonovo, e progetto di adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006).	Borgonovo Val Tidone	€ 1.500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.889	€ 0	€ 4.889	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.
2014PCIE0004	G20080001 - Miglioramento della qualità dell'acqua nel comune di PIACENZA, 1° Stralcio: Impianto di produzione acqua potabile località Mortizza - Collegamento Piacenza -Mortizza - Collegamento pozzo esistente Mortizza-scuole - perforazione di tre nuovi pozzi	Grandi opere, Piacenza	€ 5.300.000	€ 500.000	€ 0	€ 500.000	€ 769.187	€ 0	€ 769.187	53	Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018. Concluso intervento di realizzazione e collaudo dell'adduttrice. In corso preforazione nuovi pozzi.
2014PCIE0005	G20080003-1 - Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 1° Stralcio: Adeguamento e automazione potabilizz. sino 140 l/s - Condotta Mignano-LUGAGNANO, dorsale sinistra Ongina, adduttrice loc. MOCOMERO, potabilizzatore San Protaso. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Grandi opere, Gropparello	€ 2.600.000	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 370.303	€ 0	€ 370.303	270	Superamento del finanziato sulla annualità 2017 in quanto sono state realizzate più opere di quelle pianificate. In particolare è stata realizzata la cabina elettrica, si è conclusa la realizzazione della strada di accesso ed è terminato l'intervento relativo al deferrizzatore di San Protaso. Il totale rimane entro il 20% dell'importo di progetto.
2014PCIE0006	G20080007-1 - Acquedotto intercomunale Val Tidone, 1° Stralcio: collegamento CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVINO-PIACENZA. Potenziamento pozzi Mottaziana - collegamento BORGONOVINO e ROTTOFRENO e PIACENZA.	Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Grandi opere, Calendasco	€ 1.100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 51.314	€ 0	€ 51.314	100	Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018. Completamento di intervento relativo ad annualità precedente.
2014PCIE0007	G20080008 - Acquedotto intercomunale Bassa Val Trebbia: Collegamenti acquedottistici Torrazzo Momelliano Pigazzano.	Gazzola, Travo, Grandi opere, Piozzano	€ 1.180.000	€ 80.000	€ 0	€ 80.000	€ 159.078	€ 0	€ 159.078	98	Lavori in corso. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2014PCIE0008	G20080009 - Razionalizzazione sistema sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure, Alta Val d'Arda. Comuni Cerignale, Zerba, Ottone, Cortebrunatella, Bobbio, Vernasca, Morfasso Lugagnano, Ferriere, Farini, Bettola, Gropparello, Caminata, Pecorara.	Bettola, Bobbio, Caminata, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Zerba, Vernasca, Grandi opere, Cerignale, Morfasso, Ottone, Cortebrunatella, Farini, Ferriere, Gropparello	€ 1.000.000	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 188.134	€ 0	€ 188.134	276	Proceduto con la sistemazione di alcune sorgenti della Val d'Arda, ma le lavorazioni sono state influenzate dall'emergenza siccità verificatesi nel corso del 2017. Sono inoltre confluiti in questa voce i costi concordati per la risoluzione delle problematiche inerenti le sorgenti Val Nure.
2014PCIE0009	G20080011 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Ovest. 1° Stralcio: completamento collettamento di CALENDASCO	Calendasco, Grandi opere	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 33.793	€ 0	€ 33.793	100	Pagate servitù. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2014PCIE0010	G20080012 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: stralcio funzionale relativo al potenziamento sino a 10.000 AE dell'impianto di depurazione di S.Giuliano	Villanova sull'Arda, Castelvetro Piacentino, Grandi opere	€ 1.450.000	€ 56.000	€ 0	€ 56.000	€ 22.470	€ 0	€ 22.470	-59	VEDI CAMB75. Progettazione definitiva/esecutiva in corso.
2014PCIE0011	G20080013 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: 1° stralcio collettamento Soarza + VILLANOVA(Est+Ovest) + Villanova zona artigianale + Cignano all'impianto di depurazione di S.Giuliano, e adeguamento scarichi loc. Cantarana mediante realizzazione di fossa Imhoff.	Castelvetro Piacentino, Villanova sull'Arda, Grandi opere	€ 1.750.000	€ 300.000	€ 0	€ 300.000	€ 112.483	€ 0	€ 112.483	-62	Lavori in corso. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2014PCIE0013	G20080015 -Adeguamento scarichi dell'agglomerato di NIBBIANO mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi	Grandi opere, Nibbiano	€ 650.000	€ 181.000	€ 0	€ 181.000	€ 24.466	€ 0	€ 24.466	-86	In fase conclusiva la progettazione definitiva. Tale soluzione comporta la realizzazione di opere di difesa e contenimento dell'impianto di notevole entità ed impatto visivo. Soluzione progettuale sottoposta informalmente ad Amministrazione Comunale per condivisione scelte progettuali (muro di sostegno).
2014PCIE0014	G20080016 - Sistemazione reticolo fognario di CAMINATA e Costiola e adeguamento scarichi dell'agglomerato mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi	Grandi opere, Caminata	€ 500.000	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 14.832	€ 0	€ 14.832	-85	Nel corso del 2017 sono stati effettuati rilievi per la predisposizione del progetto definitivo che è in corso nel 2018. In occasione degli incontri con l'Amministrazione Comunale è emerso che la realizzazione dell'impianto è subordinata all'approvazione ed all'eseguità del nuovo strumento urbanistico di cui si deve dotare il Comune. Per la predisposizione del suddetto piano l'Unione ha partecipato ad un bando Regionale i cui esiti saranno noti a fine 2018.
2014PCIE0015	G20080017 - Intervento di ristrutturazione dell'impianto di depurazione del capoluogo CASTEL SAN GIOVANNI, con adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006).	Grandi opere, Castel San Giovanni	€ 3.512.000	€ 750.000	€ 0	€ 750.000	€ 1.371.273	€ 0	€ 1.371.273	82	Costi sostenuti per completare alcune lavorazioni che non è stato possibile effettuare nelle annualità precedenti.
2014PCIE0016	G20080018 -Collettamento loc. Trevozzo (NIBBIANO) all'impianto di depurazione di Pianello V.T., potenziamento depuratore di PIANELLO e sistemazione strada di accesso	Grandi opere, Nibbiano, Pianello Val Tidone	€ 700.000	€ 150.000	€ 0	€ 150.000	€ 70.729	€ 0	€ 70.729	-52	Realizzato attraversamento Tidone per il futuro collegamento Trevozzo - Pianello. Nell'autunno del 2017 sono iniziati i lavori per la realizzazione dell'attraversamento del torrente Tidone mediante la posa di una tubazione in pressione che collegherà Trevozzo a Pianello. I costi delle opere incideranno anche sul 2018. Il completamento del collettamento potrà avvenire solo dopo l'adeguamento del depuratore di Pianello la cui progettazione definitiva è in corso nel 2018.
2014PCIE0018	G20080020 - Adeguamento agglomerato Valconasso di Pontenure.	Grandi opere, Pontenure	€ 847.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 330.497	€ 0	€ 330.497	100	Costi sostenuti per completare alcune lavorazioni che non è stato possibile effettuare nelle annualità precedenti.
2014PCIE0019	G20080022 - Realizzazione tratti di fognatura e impianto di depurazione biologico per COLI, collettamento Coli Capoluogo (agglomerato: Coli, Baselica, Cerreto, Boioli, Peveri, Poggiolo, Corte, Pradaglione, Mazzucchi, Molino) ed estensione rete loc.Caminata	Grandi opere, Coli	€ 1.158.201	€ 135.000	€ 0	€ 135.000	€ 134.915	€ 0	€ 134.915	1	
2014PCIE0020	G20080023 - Realizzazione impianto di depurazione e collettamenti fognari per agglomerato Vicobarone 3 e Case Pallaroni di ZIANO	Ziano Piacentino, Grandi opere	€ 650.000	€ 200.000	€ 0	€ 200.000	€ 14.120	€ 0	€ 14.120	-92	In corso progettazione definitiva/esecutiva dell'impianto in seguito alle richieste della proprietà privata di ridefinire l'area destinata all'impianto e alla necessità di garantire adeguati livelli depurativi a fronte dei possibili carichi biologici afferenti all'impianto. Scostamento in parte già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2014PCIE0021	G20080026 - Impianto di depurazione di Mezzano Scotti.	Bobbio	€ 500.000	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 21.339	€ 0	€ 21.339	-57	VEDI CAMB75. Presi contatti con comune per definire area impianto. In corso progettazione definitiva/esecutiva.
2014PCIE0022	G2008025 - Adeguamento scarichi agglomerato Alseno Stazione mediante collettamento all'impianto di Alseno.	Alseno	€ 270.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.724	€ 0	€ 10.724	100	Lavoro concluso. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2014PCIE0023	G20090010 - Sistema fognario e depurativo a servizio del comune di GRAGNANO: 1°stralcio impianto di depurazione e sistemazione reticolo fognario capoluogo	Gragnano Trebbiense, Grandi opere	€ 2.600.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.991	€ 0	€ 27.991	100	Costi sostenuti per completare alcune lavorazioni che non è stato possibile effettuare nelle annualità precedenti.
2014PCIE0024	G20090011 - Sistema depurativo a servizio del comune di CALENDASCO - indennità servitù e danni - adeguamento e messa in sicurezza viabilità di accesso al nuovo depuratore	Rottofreno, Grandi opere, Calendasco	€ 1.750.000	€ 150.000	€ 0	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	In corso progettazione preliminare strada su richiesta dell'amministrazione comunale.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	COMUNE	PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO DELIBERA CONSIGLIO LOCALE N.1/2016				CONSUNTIVO RENDICONTATO - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					Note giustificative in caso di scostamento maggiore del ±20% del consuntivo rispetto a quanto pianificato, e in caso di interventi nuovi (non previsti nel 2017)
			IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificato 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento %		
2014PCIE0027	Manutenzioni straordinarie e interventi di emergenza	Opere pluricomunali	€ 0	€ 3.000.000	€ 0	€ 3.000.000	€ 6.101.794	€ 0	€ 6.101.794	103	Numerosi sono stati gli interventi di potenziamento ed estensione delle reti acquedottistiche per raggiungere zone in difficoltà, campagne mirate di monitoraggio e misura, di ricerca perdite idriche.FOGNATURA: a causa della vetustà delle reti fognarie della provincia, per garantire il servizio, si è dovuto provvedere ad un maggior numero di interventi. A ciò si aggiungono alcuni interventi richiesti dalle Amministrazioni Comunali. ACQUEDOTTO: Le manutenzioni straordinarie effettuate su RETI e IMPIANTI acquedottistici, qui rendicontate al netto di quanto investito per far fronte alla EMERGENZA SICCITA' ESTATE 2017, sebbene superiori alla somma di Piano, sono del tutto in linea con quanto speso su questa voce nell'annualità precedente. Trattasi di attività legate a ripristini conservativi, sostituzioni di reti o di parte di impianti, elettropompe, gruppi di misura, ripristini civili e idraulici a cernere di manovra e serbatoi. L'infrastruttura acquedottistica provinciale mediamente necessita infatti di 3,5mln di euro in Manutenzioni Straordinarie. DEPURAZIONE: Trattasi di attività legate a ripristini conservativi, sostituzioni di parte di impianti, macchine e gruppi di misura, ripristini civili e idraulici. Il parco impianti provinciale necessita di interventi di questo tipo per necessità infatti di oltre 1,0mln/anno.	
2014PCIE0030	P2008072 - Potenziamento depuratore capoluogo. 1° stralcio	San Giorgio Piacentino	€ 800.000	€ 190.000	€ 0	€ 190.000	€ 1.413	€ 0	€ 1.413	-99	Progettazione definitiva conclusa e nel 2017 in corso di validazione. Scostamento in parte già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018. Nel 2018 in corso la verifica della necessità di acquisire una porzione di area limitrofa all'impianto per la realizzazione dell'intervento ma non ancora di proprietà comunale.	
2014PCIE0032	P2010001 - Adeguamento impianto di depurazione per agglomerato Agazzano OVEST.	Agazzano	€ 800.000	€ 650.000	€ 140.055	€ 509.945	€ 32.238	€ 0	€ 32.238	-95	Progettazione definitiva/esecutiva in fase di completamento. Scostamento in parte già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.	
2014PCIE0033	P2010004 - Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia	Cadeo	€ 1.100.000	€ 300.000	€ 0	€ 300.000	€ 42.975	€ 0	€ 42.975	-85	Completato progetto definitivo e fatta richiesta di autorizzazioni. Avviati contatti con proprietà poer acquisizione area. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.	
2014PCIE0035	P2010011 - Ristrutturazione sedimentatore.	Bobbio	€ 60.000	€ 54.000	€ 0	€ 54.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Intervento posticipato ad annualità successive, per far fronte ad altre necessità.	
2014PCIE0036	P2010016 - Rifacimento impianti di sollevamento Ricetto e Fontana Fredda.	Cadeo	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 23.520	€ 0	€ 23.520	100	Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018. Completamento di intervento relativo ad annualità precedente.	
2014PCIE0037	P2010022 - Adeguamento agglom. Muradolo e Zerbio: collettamento scarichi all'impianto di depurazione di Caorso (realizzato Muradolo, resta da collettare Zerbio)	Caorso	€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 44.525	€ 0	€ 44.525	100	Lavori di collettamento di Zerbio in corso. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.	
2014PCIE0038	P2010024 - Estensione rete acquedotto località Ciriano-Caminata e collegamento a San Lazzaro	Carpaneto	€ 300.000	€ 160.000	€ 0	€ 160.000	€ 145.320	€ 0	€ 145.320	-9		
2014PCIE0039	P2010049 - Adeguamento dell'impianto di depurazione agglomerato Capoluogo Ovest-Rio Gazzola e collettamento scarichi	Gazzola	€ 500.000	€ 250.000	€ 90.154	€ 159.846	€ 8.720	€ 0	€ 8.720	-96	Nel 2017 completato progetto preliminare. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018. Nel 2018 completato progetto definitivo e trasmesso ad Amministrazione Comunale per approvazione. L'area è stata concordata con il comune e, tramite l'amministrazione comunale, sono state avviate le trattative con i privati per l'acquisizione.	
2014PCIE0040	P2010061 - Rifacimento impianto di potabilizzazione di San Pedretto.	Monticelli d'Ognina	€ 240.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 130.366	€ 0	€ 130.366	100	Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018. Intervento posticipato dal 2016 ed in corso nel 2017.	
2014PCIE0041	P2010067 - Realizzazione impianto di depurazione per adeguamento scarico agglomerato Pecorara e sistemazioni reti fognarie capoluogo	Pecorara	€ 500.000	€ 200.000	€ 0	€ 200.000	€ 1.168	€ 0	€ 1.168	-99	Nel 2017 è stato approntato il progetto preliminare necessario per evidenziare le criticità da risolvere con la stesura del progetto definitivo, che risulta in corso nel 2018. Si evidenzia la necessità di estendere la progettazione non solo alla realizzazione dell'impianto ma anche a quella delle reti di collettamento.	
2014PCIE0042	P2010070 - Sistemazione del sistema di depurazione agglomerati Cicogni Nord, Centro e Sud	Pecorara	€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.471	€ 0	€ 1.471	100	Individuata l'area per il posizionamento del nuovo depuratore, nel 2017 sono state anticipate alcune attività di rilievo per valutare la tipologia di trattamento da attuare e i possibili tracciati delle reti di collettamento.	
2014PCIE0046	P2010121 - Collegamento acquedotto in località Vitalta.	Vernasca	€ 180.000	€ 80.000	€ 0	€ 80.000	€ 175.462	€ 0	€ 175.462	119	Intervento iniziato a fine 2016 e concluso nel 2017. Mancano spese notarili per servitù. L'importo totale rientra nel 20% dell'importo di progetto.	
2014PCIE0047	P2010125 - Realizzazione di impianto per adeguamento scarico dell'agglomerato Bacedasco Alto	Castell'Arquato	€ 100.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 980	€ 0	€ 980	-90	Nel 2017 sono state effettuate alcune attività propedeutiche alla predisposizione del progetto definitivo. Nel 2018 sono stati definiti gli accordi con i privati per l'acquisizione dell'area in cui posizionare la nuova fossa Imhoff ed è in corso la progettazione definitiva dell'opera.	
2014PCIE0048	P2010133 - Completamento rete fognaria località Case Gatti. 1° Stralcio: rete.	Podenzano	€ 100.000	€ 84.000	€ 0	€ 84.000	€ 14.257	€ 0	€ 14.257	-83	Progettazione esecutiva conclusa. L'inizio lavori è subordinato all'ottenimento dell'A.U.A.	
2014PCIE0051	P2010174 - Nuovo serbatoio, impianto di rilancio e relativi collegamenti idraulici serbatoio. 1° Stralcio - Carpaneto	Carpaneto	€ 800.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 134.741	€ 0	€ 134.741	100	Costi sostenuti per completare alcune lavorazioni che non è stato possibile effettuare nelle annualità precedenti. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.	
2014PCIE0052	P2010239 - Nuovo pozzo Altoè.	Podenzano	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.963	€ 0	€ 13.963	100	Completamento opere elettriche e telecontrollo.	
2014PCIE0053	P2011001 - Impianto di telegestione depuratori.	Opere pluricomunali	€ 450.000	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 48.720	€ 0	€ 48.720	-2		
2014PCIE0056	P2011007 - Ristrutturazione rilancio Campo Sportivo Castel San Giovanni e sostituzione tratti di adduttrice per serbatoio Ginestre	Castel San Giovanni	€ 450.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.561	€ 0	€ 1.561	100	Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018. In realtà la conclusione dei lavori elettrici sarà prevista nel 2018.	
2014PCIE0057	P2011016 - Collettamento scarichi via Tinazzo.	Monticelli d'Ognina	€ 160.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.900	€ 0	€ 1.900	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.	
2014PCIE0059	P2011028 - Ristrutturazione impianto di depurazione di Travo capoluogo.	Travo	€ 1.000.000	€ 190.000	€ 0	€ 190.000	€ 1.603	€ 0	€ 1.603	-99	A causa della vicinanza al fiume Trebbia il depuratore non potrà essere ampliato nel sito attuale ma dovrà trovare una nuova collocazione in area più protetta. A tal fine sono stati effettuati sopralluoghi per individuare una localizzazione idonea.	
2014PCIE0060	P2011032 - Adeguamento degli scarichi fognari dell'agglomerato Ziano 5.	Ziano Piacentino	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.999	€ 0	€ 1.999	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.	
2014PCIE0062	P2014001 - Collettamento scarichi in Via XXIV Maggio.	Cadeo	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.867	€ 0	€ 27.867	100	Lavoro posticipato dal 2016 e concluso nel 2017.	
2014PCIE0063	P2014003 - Ampliamento impianto di depurazione di Gossolengo.	Gossolengo	€ 1.700.000	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 3.207	€ 0	€ 3.207	-96	Pronto il progetto preliminare, ma l'ampliamento del depuratore di Gossolengo richiede l'occupazione dell'attuale area destinata alla stazione ecologica ed il conseguente spostamento della stessa che dovrebbe essere a carico del comune il quale sta valutando la nuova area da utilizzare a tal fine. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.	
2014PCIE0065	P2014006 - Realizzazione tratto di fognatura in località La Verza.	Piacenza	€ 800.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.427	€ 0	€ 3.427	100	Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018. Completamento di intervento relativo ad annualità precedente.	
2014PCIE0068	P2014009 - Rifacimento caricamento e distribuzione acquedotto via Taccella Ca' Leone	Rivergaro	€ 165.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 633	€ 0	€ 633	100	Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018. Completamento di intervento relativo ad annualità precedente.	

ALLEGATO 1

IRETI - PIACENZA - CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2017

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	COMUNE	PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO DELIBERA CONSIGLIO LOCALE N.1/2016				CONSUNTIVO RENDICONTATO - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
			IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificato 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento %	Note giustificative in caso di scostamento maggiore del ±20% del consuntivo rispetto a quanto pianificato, e in caso di interventi nuovi (non previsti nel 2017)
2014PCIE0071	P2014012/P2014025 - CAORSO-Acquedotto strada Chiavenna; CASTELL'ARQUATO-Realizzazione impianto depurazione S.Lorenzo; COLI-Realizzazione impianto depurazione Aglio; FARINI Sistemazione fognatura Montereleggio; FERRIERE-Sistem. fognatura e acquedotto Castelcanafurone,Solaro,Noce e Brugneto; GAZZOLA-Interventi acquedottistici cofinanziati; PIANELLO-Potenziamento acquedotto Gabbiano Poggiolo; PIOZZANO Fognatura Montecanino; PONTE DELL'OLIO Collegamenti fognari Zaffignano, Caneva e La Fratta all'impianto di dep. del Capoluogo; PONTENURE-Collegamento a pozzo Coglialegna dell'acquedotto del Capoluogo; RIVERGARORifacimento rete acquedotto Niviano-Roveleto Landi; SAN GIORGIO-Realizzazione nuovo impianto di dep.di Centovera e adeguamento San Damiano tramite collettamento a Centovera; TRAVO-Acquedotto loc.Pillerone (contributo); VILLANOVA-Realizzazione rete acquedotto via Stallone e Sant'Agata acquedotto e fognatura.	Caorso, Castell'Arquato, Gazzola, Lugagnano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio P.no, Villanova, Coli, Farini, Ferriere, Pianello, Piozzano, Travo	€ 3.425.000	€ 530.000	€ 0	€ 530.000	€ 166.619	€ 0	€ 166.619	-68	Realizzato intervento Dolgo - Pillerone. In corso progettazione collet. Centovera. In corso intervento Solaro - Noce.
2014PCIE0072	Cartografia	Opere pluricomunali		€ 200.000	€ 0	€ 200.000	€ 310.634	€ 0	€ 310.634	55	Attività di razionalizzazione dati finalizzato alla trasmissione dati SIT RER
2015PCIE0075	P2010063 - Ristrutturazione impianto Quattrocasse	Monticelli d'Ognina	€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100	€ 0	€ 100	100	Intervento in ritardo rispetto alla pianificazione per problemi di tipo autorizzativo. L'amministrazione Comunale di Monticelli si sta occupando dello svincolo da parte della Soprintendenza.
2015PCIE0083	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI DI EMERGENZA - ALLUVIONE 2015	Opere pluricomunali	€ 1.508.345	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.020	€ 0	€ 17.020	100	Code fine lavori anno precedente relative a impianto depurazione Rivergaro
2015PCIE0084	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 2° Stralcio: Nuovo serbatoio diga di Mignano. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Grandi opere, Gropparello	€ 800.000	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 26.961	€ 0	€ 26.961	-73	In corso progettazione esecutiva. Acquisita area d'intervento. Inizio lavori posticipato ad annualità successiva. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2015PCIE0086	Acquedotto intercomunale Val Tidone, 3° Stralcio: Sistemazione criticità Trevozzo (NIBBIANO) mediante rifacimento captazione Molino Rizzo - Collegamento Trevozzo-PIANELLO (serbatoio Ca' dell'Alpe)	Grandi opere, Nibbiano, Pianello Val Tidone	€ 800.000	€ 280.000	€ 0	€ 280.000	€ 5.028	€ 0	€ 5.028	-98	Concluse indagini di caratterizzazione dell'acquifero che hanno portato ad escludere la fattibilità dell'intervento.
2015PCIE0087	Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 2° stralcio: ristrutturazione e ampliamento depuratore di Podenzano	Grandi opere, Podenzano, Vigolzone	€ 1.340.000	€ 130.000	€ 0	€ 130.000	€ 670	€ 0	€ 670	-99	Completato progetto definitivo/esecutivo da sottoporre ad approvazione. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2015PCIE0088	G20090010-2 - Sistema fognario e depurativo a servizio del comune di GRAGNANO e ROTTOFRENO: 2° stralcio collettamento loc. Campremoldo e Casaliggio e Centora	Gragnano Trebbiense, Rottofreno, Grandi opere	€ 1.275.000	€ 140.000	€ 0	€ 140.000	€ 15.201	€ 0	€ 15.201	-89	CENTORA: Conclusa progettazione esecutiva. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2015PCIE0090	Rifacimento automazione e rifacimento decantatore secondario n.2.	Grandi opere, Piacenza	€ 440.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.227	€ 0	€ 1.227	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.
2015PCIE0091	Sistemazione rete acquedotto loc.Chiaravalle Carretto	Alseno	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.069	€ 0	€ 4.069	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.
2015PCIE0092	Potenziamento impianto di depurazione di Cortina - con contributo	Alseno	€ 250.000	€ 150.000	€ 0	€ 150.000	€ 3.971	€ 0	€ 3.971	-97	Completata progettazione per definire area destinata all'impianto. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2015PCIE0094	Rifacimento reti acquedotto via della Libertà e piazza Repubblica	Besenzone	€ 200.000	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	In accordo con l'Amministrazione Comunale di Besenzone l'intervento è stato posticipato ad annualità successive e sostituito con l'intervento di collegamento idrico Cortemaggiore - Besenzone.
2015PCIE0096	Collegamento loc. Casarone all'i.d. di S.Maria	Bobbio	€ 60.000	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 71.519	€ 0	€ 71.519	43	Lavoro concluso. Maggiori costi dovuti a necessità di scavo in roccia.
2015PCIE0097	Sistemazione adduttrice da sorgente Arelli - studio preliminare	Bobbio	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Studio posticipato ad annualità successive, per far fronte ad altre necessità.
2015PCIE0098	Sistemazione criticità fognarie Bobbio	Bobbio	€ 50.000	€ 25.000	€ 0	€ 25.000	€ 49.897	€ 0	€ 49.897	99	Intervento previsto nel 2016 ma posticipato in toto nel 2017.
2015PCIE0102	Rifacimento rete acquedotto e rete fognaria via Molinazzo	Caorso	€ 150.000	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Intervento concluso nel 2016 con minor spesa.
2015PCIE0106	Rifacimento acquedotto e fognatura via Bixio, Mozza, Portone e Zilli	Castel San Giovanni	€ 335.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 78.842	€ 0	€ 78.842	100	Intervento di Via Bixio anticipato rispetto alla pianificazione 2015/2019 in quanto da realizzare in concomitanza ai lavori di riqualificazione previsti dall'Amministrazione Comunale.
2015PCIE0107	Rifacimento rete fognaria via Simonetti	Castel San Giovanni	€ 100.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	L'intervento, la cui sola progettazione era stata pianificata nel 2017 è stato realizzato nel 2018 per sopraggiunte criticità di smaltimento delle acque che provocavano numerosi allagamenti alle abitazioni.
2015PCIE0109	Recupero e consolidamento fognatura loc.Mezzano	Castelvetro Piacentino	€ 200.000	€ 140.000	€ 0	€ 140.000	€ 154.276	€ 0	€ 154.276	10	
2015PCIE0112	Progettazione impianto depurazione di Chiavenna Landi - studio di fattibilità	Cortemaggiore	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	I sopralluoghi effettuati nel 2017 hanno evidenziato che il sistema di depurazione attuale risulta un impianto di 1° livello costituito da F.I. posta in prossimità delle abitazioni. La vicinanza dell'impianto alle abitazioni non ne permette il potenziamento a II° livello per la dimensione dell'area necessaria e per l'estrema vicinanza alle abitazioni. Da qui la necessità di scegliere una nuova posizione condizionata dal fatto che lungo l'asse del Chiavenna, scarico obbligato del dep, sono dislocate numerose abitazioni. Sono pertanto ancora in corso valutazioni sulla tipologia d'impianto e sulla posizione che potrebbe comportare maggiori oneri.
2015PCIE0114	Rifacimento fognatura via Ugo Foscolo	Fiorenzuola	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	€ 25.000	€ 1.283	€ 0	€ 1.283	-94	Le verifiche effettuate nel corso del 2017 hanno evidenziato la necessità di predisporre uno studio su un'area più ampia. Tale necessità è stata recepita nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2015PCIE0115	Rifacimento sottoservizi rotonda Via Illica	Fiorenzuola	€ 80.000	€ 80.000	€ 0	€ 80.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	L'intervento verrà realizzato in concomitanza dei lavori di competenza del lottizzante.
2015PCIE0117	Potenziamento dell'impianto di depurazione agglomerato Canneto - Studio di fattibilità	Gazzola	€ 250.000	€ 250.000	€ 0	€ 250.000	€ 6.717	€ 0	€ 6.717	-97	Il progetto ha subito un forte rallentamento dovuto alle difficoltà riscontrate per reperire gli eredi del proprietario dell'area (si tratta di minore). La progettazione impiantistica è comunque proseguita ma la realizzazione dell'intervento è stata necessariamente posticipata.
2015PCIE0118	Sistemazione acquedotto e fognatura via dei Rivi	Gossolengo	€ 200.000	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 52.850	€ 0	€ 52.850	-47	Lavori in corso. Conclusi nel 2018.
2015PCIE0119	Rifacimento rete acquedotto via Marconi	Gossolengo	€ 80.000	€ 46.000	€ 0	€ 46.000	€ 71.441	€ 0	€ 71.441	55	Lavori in corso. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2015PCIE0120	Sistemazione rete fognaria loc. Niviano di Sopra	Lugagnano Val d'Arda	€ 150.000	€ 35.000	€ 0	€ 35.000	€ 73.780	€ 0	€ 73.780	110	I lavori sono stati parzialmente eseguiti nel 2017 e in parte posticipati al 2018.
2015PCIE0121	Rifacimento rete acquedotto via Garibaldi-via Risorgimento	Lugagnano Val d'Arda	€ 115.000	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	€ 2.843	€ 0	€ 2.843	-85	Intervento realizzato insieme a quello di fognatura ID 2015PCIE0187. Il totale dell'opera rispetta il pianificato.
2015PCIE0124	Rifacimento rete acquedotto loc. Colombello	Morfasso	€ 120.000	€ 60.000	€ 0	€ 60.000	€ 7.198	€ 0	€ 7.198	-88	Progettazione esecutiva conclusa. Lavori avviati nel 2018. Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.

ALLEGATO 1

IRETI - PIACENZA - CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2017

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	COMUNE	PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO DELIBERA CONSIGLIO LOCALE N.1/2016				CONSUNTIVO RENDICONTATO - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
			IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificato 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento %	Note giustificative in caso di scostamento maggiore del ±20% del consuntivo rispetto a quanto pianificato, e in caso di interventi nuovi (non previsti nel 2017)
2015PCIE0125	Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e Bertassi (frane)	Ottone	€ 50.000	€ 25.000	€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	In base alle autorizzazioni AUA in essere, risulta una sola fossa Imhoff regolarmente gestita da Ireti in loc. Bertassi. Si rende pertanto necessario un incontro con il privato che sollecita l'intervento in loc. Bertassi Superiore al fine di procedere alla risoluzione della problematica. Relativamente all'intervento in loc. Fabbrica, in seguito al sopralluogo effettuato si provvederà a intervenire sul lo scarico derivante dalla F.I.
2015PCIE0126	Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio: studio di fattibilità	Podenzano	€ 1.200.000	€ 150.000	€ 0	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Predisposto lo studio preliminare dell'opera. L'intervento, risulta particolarmente complesso per la necessità di eliminare probabili commistioni con acque bianche e necessiterà di approfondite indagini mediante spurghi e videoispezioni. Nel 2018 inizieranno tali indagini per la predisposizione del progetto definitivo.
2015PCIE0128	Ristrutturazione impianto di depurazione Capoluogo - studio fattibilità	Ponte dell'Olio	€ 1.000.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 1.544	€ 0	€ 1.544	-84	Nel 2017 è stato approntato un progetto preliminare che dovrà essere sottoposto ad ulteriori approfondimenti relativamente alla necessità di rimanere nella stessa area e di mantenere in esercizio il trattamento durante l'esecuzione dei lavori di potenziamento.
2015PCIE0130	Rifacimento impianto elettrico impianto di depurazione e nuova linea pretrattamento liquami	Pontenure	€ 190.000	€ 180.000	€ 0	€ 180.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Completate le opere propedeutiche all'installazione del nuovo impianto elettrico. La progettazione elettrica è stata momentaneamente sospesa per dare priorità ad interventi di maggior urgenza.
2015PCIE0133	Rifacimento condotte idriche in loc. Poggio verso loc. Molza, nel tratto terminale via Poggio-via Sito Nuovo	Sarmato	€ 100.000	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 80.494	€ 0	€ 80.494	60	Intervento posticipato dal 2016 e eseguito in toto nel 2017.
2015PCIE0134	Estendimento acquedotto rete idrica su SPR10-via Emilia Est - verifica fattibilità per acquisizione	Sarmato	€ 61.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Intervento posticipato ad annualità successive, per far fronte ad altre necessità.
2015PCIE0136	Collegamento Ponte Travo al serbatoio del Capoluogo	Travo	€ 160.000	€ 90.000	€ 0	€ 90.000	€ 99.694	€ 0	€ 99.694	10	
2015PCIE0139	Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Vernasca Rete1 e collegamenti fognari	Vernasca	€ 300.000	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Nel 2017 sono state effettuate le attività propedeutiche alla predisposizione del progetto definitivo che risulta in corso nel 2018. Si evidenziano problematiche relative alla localizzazione del nuovo impianto.
2015PCIE0141	Struttura, studi e progettazioni. Progettazione dell'adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) degli impianti di depurazione di Fiorenzuola e di Rottofreno.	Opere pluricomunali		€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 77.313	€ 0	€ 77.313	-22	Come già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018, l'intervento con codice 2015PCIE0141 è stato suddiviso in due nuovi interventi relativi al depuratore di Fiorenzuola e a quello di Rottofreno. Nel corso del 2017 è stata portata avanti la progettazione definitiva del solo impianto di Fiorenzuola. Nel 2018 verrà conclusa anche quella di Rottofreno.
2016PCIE0153	Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 2° stralcio	Podenzano	€ 1.865.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 136.258	€ 0	€ 136.258	100	Concluso collegamento rete Podenzano con rilancio Cà del Vescovo. Anticipo posa tubazioni collegamento tra pozzo Bissolo e serb Cà del Vescovo. Scostamento in parte già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2016PCIE0154	Completamento rete fognaria in loc. Bassano.	Rivergaro	€ 70.000	€ 70.000	€ 0	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018. Approntato studio di fattibilità.
2016PCIE0155	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure: attraversamento Nure a Farini	Grandi opere, Farini	€ 216.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.959	€ 0	€ 11.959	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.
2016PCIE0157	Interventi straordinari sul pozzo Le Forche	Bettola	€ 110.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 253	€ 0	€ 253	100	Avviata progettazione preliminare. L'intervento è sottoposto a contributo regionale.
2016PCIE0163	Interventi straordinari sul pozzo Borcaglia	Farini	€ 110.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 332	€ 0	€ 332	100	Avviata progettazione preliminare. L'intervento è sottoposto a contributo regionale.
2016PCIE0164	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Ferriere in fregio agli alvei dei torrenti Grondana e Nure	Ferriere	€ 260.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 52.461	€ 0	€ 52.461	100	Costi sostenuti per completare alcune lavorazioni che non è stato possibile effettuare nelle annualità precedenti.
2016PCIE0165	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ferriere capoluogo	Ferriere	€ 1.145.000	€ 540.000	€ 540.000	€ 0	€ 54.391	€ 0	€ 54.391	-89	In corso progettazione definitiva/esecutiva. Scostamento dovuto a mancata erogazione contributo regionale e già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2016PCIE0166	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ottone	Ottone	€ 54.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37.157	€ 0	€ 37.157	100	L'intervento, iniziato nel 2016, si è protratto e concluso nel 2017 con una spesa inferiore a quella pianificata.
2016PCIE0167	Interventi straordinari sul pozzo Cisiano	Rivergaro	€ 245.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 21.835	€ 0	€ 21.835	100	Scostamento già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018. Maggiori costi dovuti a rifacimento e potenziamento della difesa spondale.
2016PCIE0170	Interventi straordinari sull'impianto di sollevamento Molinazzo	Rivergaro	€ 314.000	€ 264.000	€ 264.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-100	L'intervento relativo alla difesa spondale è in ritardo in quanto ARPAE non ha autorizzato i lavori dal momento che in alveo ne erano concomitanti altri. E' stata pertanto inoltrata nuova richiesta di autorizzazione nel 2018.
2016PCIE0172	Interventi straordinari sul pozzo Campo Sportivo	Travo	€ 150.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Intervento concluso. Le verifiche post alluvione hanno evidenziato la necessità di una minor spesa rispetto a quella prevista. Alcuni interventi di manutenzione straordinaria sono ricaduti nell' ID 2015PCIE0083. La difesa spondale sarà realizzata da STB.
2016PCIE0173	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Bobbio capoluogo	Bobbio	€ 200.000	€ 74.747	€ 74.747	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Intervento terminato nel 2015. Nel 2016 sono stati conclusi alcuni interventi minori. Lo scostamento sul 2017 è già stato recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2016PCIE0176	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Albarola	Vigolzone	€ 351.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.276	€ 0	€ 6.276	100	Acquisite le aree. In attesa di rilascio autorizzazioni e di emissione del contributo regionale.
2016PCIE0177	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto ponte Farini - ponte Cantoniera.	Grandi opere, Ferriere, Farini	€ 2.035.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.921	€ 0	€ 4.921	100	Avviata progettazione preliminare. L'intervento è sottoposto a contributo regionale.
2016PCIE0178	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto ponte Cantoniera - Ponte Nano	Grandi opere, Ferriere, Farini	€ 1.145.000	€ 1.145.000	€ 1.145.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Scostamento dovuto a mancata erogazione contributo e già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2016PCIE0179	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto Case Camia - Maioli	Grandi opere, Bettola	€ 745.000	€ 745.000	€ 745.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Scostamento dovuto a mancata erogazione contributo e già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2016PCIE0181	Rifacimento acquedotto V.le Matteotti e Bellini ad Alseno	Alseno	€ 170.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 70.000	-€ 70.000	contributi	
2016PCIE0185	Rifacimento sottoservizi in occasione degli interventi sulla viabilità comunale	Fiorenzuola	€ 190.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80.676	€ 0	€ 80.676	100	Nel 2017 sono state realizzate due nuove rotonde dall'Amministrazione Comunale. Lo scostamento è già recepito nella nuova pianificazione approvata con CLPC/2018/3 del 15/03/2018.
2016PCIE0186	* Raddoppio collegamento campo-pozzi di San Protaso al serbatoio pensile del Capoluogo	Fiorenzuola	€ 700.000	€ 500.000	€ 0	€ 500.000	€ 359.114	€ 0	€ 359.114	-28	Anticipo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em. idrica) - L'intervento ha subito un rallentamento dovuto all'acquisizione delle servitù con i privati e alle condizioni meteo invernali. I lavori stanno procedendo nel 2018.
2016PCIE0187	Rifacimento fognatura in via Garibaldi	Lugagnano Val d'Arda	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.912	€ 0	€ 6.912	100	Intervento realizzato insieme a quello di acquedotto ID 2015PCIE0121. Il totale dell'opera rispetta il pianificato.
2016PCIE0188	Realizzazione rete fognatura via Beati	Piacenza	€ 120.000	€ 110.000	€ 0	€ 110.000	€ 6.920	€ 0	€ 6.920	-93	Conclusa progettazione esecutiva. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale di PC l'intervento è stato posticipato ad annualità successive a favore dell'intervento in Via Posta dei Cavalli.
2016PCIE0189	Realizzazione pozzo a Quarto. Cofinanziamento lottizzante.	Piacenza	€ 350.000	€ 190.000	€ 0	€ 190.000	€ 1.022	€ 0	€ 1.022	-99	In attesa del contributo da parte della Ditta Lottizzante.
2016PCIE0194	Rifacimento tratti di rete fognaria in Via Caorsana a Polignano	San Pietro in Cerro	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 44.688	€ 0	€ 44.688	100	Intervento anticipato rispetto alla pianificazione 2015/2019. Mancano ripristini definitivi.
2016PCIE0195	* Estendimento reti a carico di privati	Opere pluricomunali					€ 77.125	€ 48.789	€ 28.336	100	In questa voce vengono inseriti i contributi c/terzi per estendimenti rete acquedotto e fognatura.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	COMUNE	PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO DELIBERA CONSIGLIO LOCALE N.1/2016				CONSUNTIVO RENDICONTATO - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
			IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificato 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento %	Note giustificative in caso di scostamento maggiore del ±20% del consuntivo rispetto a quanto pianificato, e in caso di interventi nuovi (non previsti nel 2017)
2016PCIE0196	* Sistemazione del collettore fognario afferente l'impianto di depurazione di Gropparello	Gropparello	€ 60.000	€ 60.000	€ 0	€ 60.000	€ 85.045	€ 0	€ 85.045	42	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 - Maggior spesa dovuta al rifacimento di un ulteriore tratto di fognatura, non previsto in origine, ed alla sistemazione di una cameretta d'ispezione posta a monte dello scolmatore ad una profondità di circa 3,5 m.
2017PCIE0197	* Studio delle azioni di contenimento del CROMO VI	Opere pluricomunali	€ 120.000	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 51.892	€ 0	€ 51.892	4	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (contenimento cromo VI)
2017PCIE0198	* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto d bis. Collegamento acquedottistico Calendasco Piacenza: Ponte Trebbia Calendasco.	Piacenza, Calendasco, Rottofreno	€ 600.000	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 32.424	€ 0	€ 32.424	-35	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (contenimento cromo VI)
2017PCIE0199	* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto e. Collegamento acquedottistico Sant'Antonio - Via Primo Maggio - (lungo Via Einaudi)	Piacenza, Calendasco, Rottofreno	€ 690.000	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	€ 22.359	€ 0	€ 22.359	12	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (contenimento cromo VI)
2017PCIE0200	* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto e-1. Collegamento acquedottistico Calendasco Piacenza: Tubazione Ponte Trebbia	Calendasco, Piacenza, Rottofreno	€ 210.000	€ 95.000	€ 0	€ 95.000	€ 94.918	€ 0	€ 94.918	1	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (contenimento cromo VI)
2017PCIE0204	* Ripristino danni alluvione fosse imhoff di Mareto	Farini	€ 120.000	€ 120.000	€ 0	€ 120.000	€ 73.360	€ 0	€ 73.360	-39	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 - Minor costo dovuto al recupero anziché sostituzione dei manufatti dissabbiatore e partitore ingresso liquami.
2017PCIE0205	* Ripristino danni alluvione depuratore Rompeggio	Ferriere	€ 30.000	€ 30.000	€ 0	€ 30.000	€ 32.081	€ 0	€ 32.081	7	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 -
2017PCIE0206	* Ripristino danni alluvione fosse imhoff	Ottone	€ 30.000	€ 30.000	€ 0	€ 30.000	€ 16.730	€ 0	€ 16.730	-44	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 - Costo iniziale sovrastimato in quanto i lavori da eseguire non erano quantificabili con precisione a priori.
2017PCIE0209	* Ripristino pozzo Trebbia	Rivergaro	€ 26.500	€ 26.500	€ 0	€ 26.500	€ 32.727	€ 0	€ 32.727	23	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 - L'intervento si è concluso nel 2017 con costi leggermente superiori al pianificato che hanno compreso la sigillatura dei pozzi e la messa in sicurezza dell'area.
2017PCIE0210	* Collegamento acquedottistico Cortemaggiore-Besenzone (e studio serbatoio Besenzone)	Besenzone	€ 290.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.596	€ 0	€ 6.596	100	Autorizzato intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 - In accordo con l'Amministrazione Comunale è stato posticipato ad annualità successive l'intervento ID2015PCIE0094 e sostituito con l'intervento di collegamento idrico Cortemaggiore - Besenzone per il quale nel 2017 si è conclusa la progettazione definitiva.
2017PCIE0211	* 2° stralcio: Collegamento pozzo zona artigianale Carpaneto con serbatoio	Carpaneto	€ 60.000	€ 60.000	€ 0	€ 60.000	€ 53.360	€ 0	€ 53.360	-11	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 -
2017PCIE0212	* Potenziamento pozzi esistenti	Calendasco, Piacenza	€ 80.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 2.455	€ 0	€ 2.455	-75	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (contenimento cromo VI)
2017PCIE0213	* Realizzazione nuovi pozzi a Calendasco	Calendasco, Piacenza	€ 1.500.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 5.813	€ 0	€ 5.813	-42	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (contenimento cromo VI)
2017PCIE0214	* Interconnessione acquedotto Fiorenzuola con acquedotto Castell'Arquato per alimentazione idrica di Castell'Arquato e Lugagnano con i pozzi di Fiorenzuola	Fiorenzuola, Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Alseno, Carpaneto, Gropparello, Vernasca	€ 400.000	€ 200.000	€ 0	€ 200.000	€ 104.761	€ 0	€ 104.761	-48	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em.idrica) - I lavori sono proseguiti nel 2018. L'avanzamento fisico coincide con quanto pianificato. Sono stati riscontrati alcuni problemi interni di liquidazione delle contabilità che si sono risolti nel 2018.
2017PCIE0215	* Interventi di ottimizzazione delle opere di presa delle sorgenti che alimentano la rete acquedottistica	Cortebrugnatella	€ 70.000	€ 70.000	€ 0	€ 70.000	€ 114.519	€ 0	€ 114.519	64	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em.idrica) - Durante i lavori, a causa delle forti piogge, si è verificata una frana e si è dovuto ripristinare tutto il lavoro già eseguito.
2017PCIE0216	* Interconnessione tra serbatoio Scagliotti e la località Osera	Coli	€ 20.000	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	€ 5.060	€ 0	€ 5.060	-75	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em.idrica) - La prima parte dell'intervento è stato rendicontato nelle manutenzioni straordinarie perché realizzata nelle prime fasi dell'emergenza. L'intervento è concluso.
2017PCIE0217	* Interconnessione tra serbatoio Bobbiano e la località Chiosi	Travo	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em.idrica) - L'intervento meno oneroso del previsto è stato realizzato nei primi mesi del 2018.
2017PCIE0218	* Interconnessione tra pozzo Caminata e la località Trebecco	Nibbiano	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	€ 25.000	€ 7.938	€ 0	€ 7.938	-68	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em.idrica) - Intervento iniziato nel 2017 e concluso nel 2018.
2017PCIE0219	* 1° stralcio, interconnessione acquedotto intercomunale Castel San Giovanni - Sarmato - Borgonovo - Ziano con l'acquedotto di Pianello (tubazione provvisoria)	Pianello Val Tidone	€ 160.000	€ 160.000	€ 0	€ 160.000	€ 156.545	€ 0	€ 156.545	-2	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em.idrica) -
2017PCIE0220	* Adeguamento rete idrica per potabilizzazione pozzo Sisco - collegamento pozzo Sisco al nuovo serbatoio Vezzeno (emergenza idrica)	Carpaneto	€ 70.000	€ 70.000	€ 0	€ 70.000	€ 47.023	€ 0	€ 47.023	-33	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em.idrica) - L'intervento è terminato con spese meno onerose del previsto.
2017PCIE0221	* Adeguamento rete idrica per potabilizzazione pozzo Piacentino - collegamento pozzo Piacentino al nuovo serbatoio Vezzeno	Carpaneto	€ 190.000	€ 190.000	€ 0	€ 190.000	€ 174.935	€ 0	€ 174.935	-8	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em.idrica)
2017PCIE0222	* 1° stralcio, interconnessione acquedotto Pianello con Trevozzo di Nibbiano (tubazione provvisoria)	Nibbiano	€ 90.000	€ 90.000	€ 0	€ 90.000	€ 90.765	€ 0	€ 90.765	1	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em.idrica)
2017PCIE0223	* Tubazioni definitive relative alle interconnessioni idrauliche degli acquedotti di Bobbio con le loc. Cascina Ponte, Bellocchio, Caldarola, Cascina Alpeggiani e altre minori	Bobbio	€ 200.000	€ 200.000	€ 0	€ 200.000	€ 145.009	€ 0	€ 145.009	-27	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em.idrica) - L'intervento è terminato con spese meno onerose del previsto.
2017PCIE0224	* Interconnessione col serbatoio Ettoli e il serbatoio Penni per alimentare la località Case Ettoli	Vernasca	€ 30.000	€ 30.000	€ 0	€ 30.000	€ 42.087	€ 0	€ 42.087	40	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 (em.idrica) - L'intervento è risultato più oneroso del previsto.
2017PCIE0225	* 1° stralcio, interconnessione tra serbatoio Dobbio e serbatoio Roncaglie a beneficio di Pecorara (tubazione provvisoria)	Pecorara	€ 100.000	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	-100	Nuovo intervento nulla-osta ATERSIR CAMB 75/2017 -(em.idrica) Previsto il solo secondo stralcio nel 2018. Nel 2017 è stato gestito solo mediante autobotti.
2018PCIE0227	Trattamento Pozzi Piacenza (Via Degani, Via XXIV Maggio)	Piacenza	€ 1.500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.807	€ 0	€ 5.807	100	Intervento pianificato in annualità successive (contenimento cromo VI) - Anticipate alcune attività di progettazione.
2018PCIE0228	Trattamento Pozzo Marchesana	Gossolengo	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.473	€ 0	€ 2.473	100	Intervento pianificato in annualità successive (contenimento cromo VI) - Anticipate alcune attività di progettazione.
2018PCIE0258	Intervento strutturale di ristrutturazione pozzi di alimentazione della rete idrica con installazione potabilizzatori per l'abbattimento dei nitrati	Borgonovo Val Tidone, Carpaneto, Castel San Giovanni, Sarmato, Ziano Piacentino, Alseno	€ 590.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.100.670	€ 0	€ 1.100.670	100	Gli eventi siccitosi del 2017 hanno comportato la necessità di installazione di impianti di trattamento su diversi pozzi del territorio piacentino in quanto la qualità dell'acqua è andata via via in peggioramento ed è risultata indispensabile la rimozione di ferro, manganese e nitrati. I fondi stanziati dalla Protezione Civile che prevedevano il solo noleggio dei potabilizzatori, non sono stati sufficienti per l'acquisto dei medesimi e anche l'importo inizialmente stimato si è rivelato non adeguato. Infatti, oltre alla quota di acquisto, i costi maggiori sono imputabili a installazione, adeguamenti tecnici, opere accessorie e sistemazione delle aree.
2018PCIE0282	Nuovo pozzo Polo Logistico Piacenza (contributo privati)	Piacenza	€ 360.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.768	€ 0	€ 3.768	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione. Nel 2018 è stato incassato il contributo di privato.
2018PCIE0295	Contributi interventi acquedottistici Dolgo e Pillerone - comune di Travo (rif. 2014PCIE0071)	Travo		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.546	-€ 4.546	100	
	TOTALI PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI PC (DELIB. CONSIGLIO LOCALE 1/2016 CON MODIFICHE NULLA-OSTA CAMB. 75/2017)			€ 16.881.247	€ 3.098.956	€ 13.782.291	€ 15.491.719	€ 123.335	€ 15.368.383		
	* INTERVENTI AUTORIZZATI CON NULLA-OSTA ATERSIR - DELIBERA CAMB 75/2017										
	INTERVENTI NUOVI APPROVATI CON DELIBERA CONSIGLIO LOCALE PC 3/2018, CON AVVIO ANTICIPATO AL 2017										



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 7 del 19 dicembre 2018

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore IRETI S.p.A. Programma Operativo Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2017.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 19 dicembre 2018

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Piacenza
F.to Dott. Giuseppe Sidoli

Il segretario verbalizzante
F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 11 luglio 2019
