

CLPR/2020/15/del 4 dicembre 2020

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Approvazione Consuntivo 2019.
Programma Operativo Interventi 2015 – 2019**

IL COORDINATORE
F.to Tiziana Benassi

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2020** il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0008624 del 01/12/2020.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle "Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19", approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

Assume la presidenza il Coordinatore Tiziana Benassi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO			NO	0,6059
BARDI			NO	0,6385
BEDONIA	Serpagli Giampaolo	Sindaco	SI'	0,8811
BERCETO			NO	0,6019
BORE			NO	0,3471
BORGO VAL DI TARO	Rossi Diego	Sindaco	SI'	1,5743
BUSSETO	Capelli Stefano	Sindaco	SI'	1,5303
CALESTANO			NO	0,5809
COLLECCHIO	Pietralunga William	Assessore	SI'	2,8284
COLORNO	Grassi Mirka	Assessore	SI'	1,8860
COMPIANO	Mariani Francesco	Sindaco	SI'	0,4083
CORNIGLIO	Delsante Giuseppe	Sindaco	SI'	0,5741
FELINO			NO	1,8294
FIDENZA	Amigoni Franco	Assessore	SI'	5,0320
FONTANELLATO			NO	1,5152
FONTEVIVO			NO	1,2243
FORNOVO DI TARO	Zanetti Michela	Sindaco	SI'	1,3691
LANGHIRANO			NO	2,0497
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,0975
MEDESANO	Ghidini Riccardo	Assessore	SI'	2,2163
MONCHIO DELLE CORTI			NO	0,3823
MONTECHIARUGOLO	Olivieri Maurizio	Assessore	SI'	2,1820

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO	Maini Giovanna	Assessore	SI'	2,6033
PALANZANO	Boraschi Ermes	Sindaco	SI'	0,4164
PARMA	Benassi Tiziana	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	1,3746
ROCCABIANCA			NO	0,7772
SALA BAGANZA			NO	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Marco Trevisan	Assessore	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI	Tonini Sara	Assessore	SI'	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO MEZZANI	Comelli Marco	Consigliere	SI'	2,6562
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA			NO	0,5961
TORNOLO			NO	0,4045
TORRILE			NO	1,6090
TRAVERSETOLO	Lanzi Michele	Assessore	SI'	1,9533
VALMOZZOLA	Alzapiedi Claudio	Sindaco	SI'	0,3031
VARANO DE' MELEGARI			NO	0,7052
VARSÌ			NO	0,4384
PROVINCIA DI PARMA			NO	10,000

Presenti n. 19, quote 67,7132

Assenti n. 26, quote 32,2868

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Approvazione Consuntivo 2019.
Programma Operativo Interventi 2015 – 2019**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Iren S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.
- con deliberazione n. 51 del 28 giugno 2018 del Consiglio d’ambito è stato approvato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IREN S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;

dato atto che:

- il gestore Iren S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;

rilevato che dai dati presentati è emerso per l'annualità 2019 che:

- sono stati introdotti n. 4 interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-2019, approvato con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio Locale di Parma ai sensi della Delibera n° 75 del 12 ottobre 2017, fatto salvo le revisioni ordinarie introdotte in conformità alla Deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 di Consiglio d'Ambito "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano degli Interventi e del Programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato";
- non sono stati avviati n.22 interventi per un importo complessivo lordo di €. 2.727.000;
- sono stati anticipati/conclusi n.27 interventi previsti in altre annualità per un importo complessivo lordo di € 3.166.026;
- per n.38 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l'annualità 2019;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

a voti unanimi favorevoli e palesi,

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore Iren S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2019
Gestore: IREN S.p.A. (PR)**

4 dicembre 2020

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 21 marzo 2016, revisionato con Delibera del Consiglio d'Ambito n.51 del 28 giugno 2018, che il gestore IREN S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2019		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2019	
Importo Lordo Pianificato [A]	€ 18.870.625	+ € 2.202.820	€ 21.073.445	Importo Lordo a Consuntivo [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 1.347.316	-€ 576.983	€ 770.333	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 17.523.309	+ € 2.779.803	€ 20.303.112	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IREN S.p.A. abbia effettuato maggiori investimenti netti rispetto alla pianificazione approvata precisamente pari ad €. 2.779.803 a fronte dei minori contributi incassati pari a - € 576.983. I contributi non incassati si riferiscono in larga parte a quelli relativi ai fondi FSC per la riduzione delle perdite, che, nello specifico, sono stati pianificati per complessivi €. 1.326.500 e non incassati.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

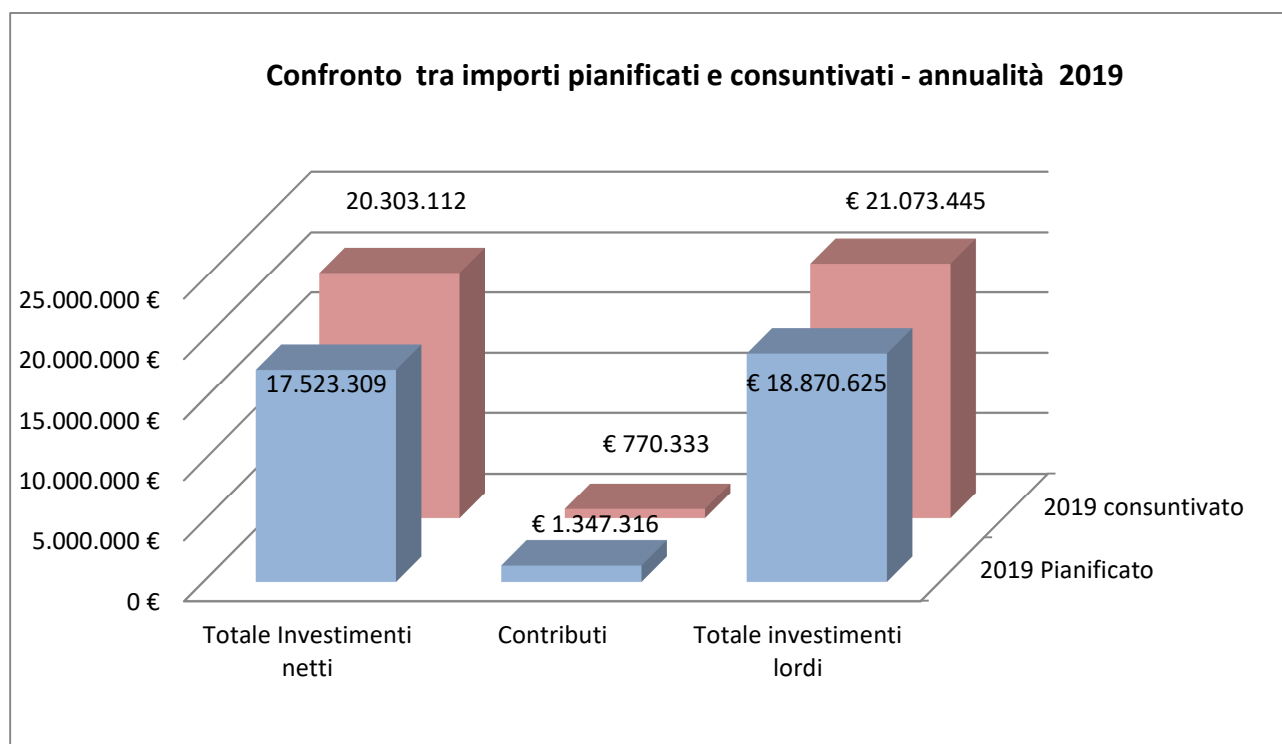


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2019 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

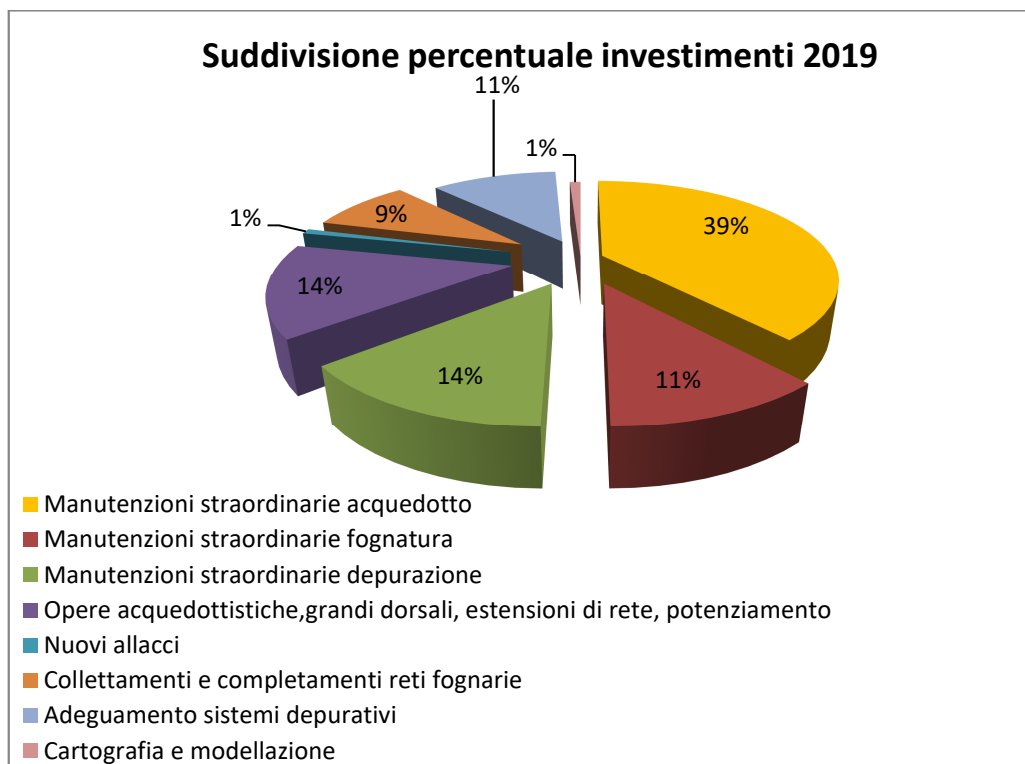


Fig.2 –Suddivisione investimenti 2019 per servizio

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppati sulla base degli scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria rapportata al totale:

Interventi non iniziati (-100%)	22
interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%)	27
Interventi con scostamento superiore a + o - 20%	38
interventi con scostamento inferiore a + o - 20%	6

Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra pianificato e quanto rendicontato

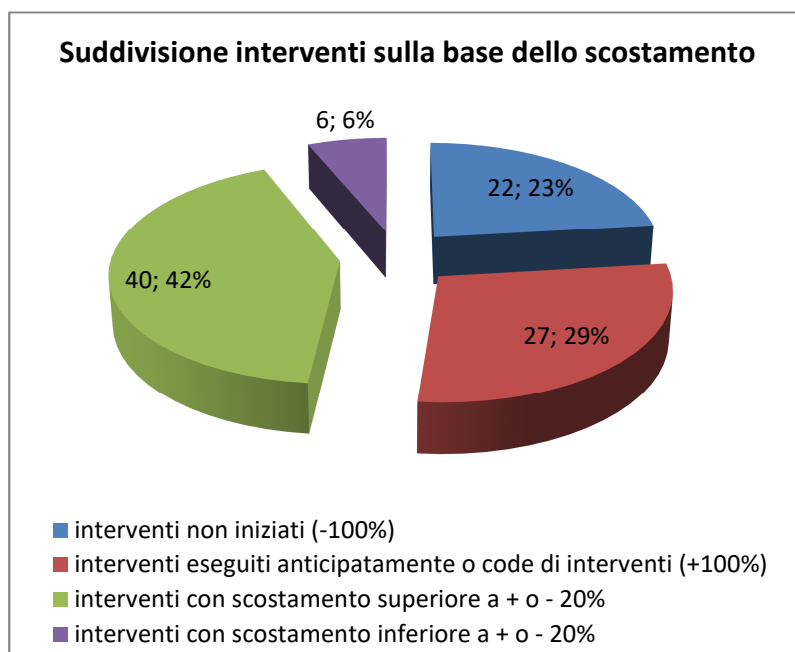


Fig.3 –Interventi realizzati nell'annualità 2019 suddivisi per scostamento

Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l'annualità 2019, n.22 interventi, che erano stati programmati per complessivi €. 2.727.000, non sono stati avviati (scostamento pari a -100%), (per l'elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1).

Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.27 interventi e n.38 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.6 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare.

Numero di interventi programmati nel 2019 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 66

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2019: 71

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2019	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2019	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	22	€ 0	€ 2.727.000	NO	Vedi TAB.L, 2 e 4 e Fig. 3. Vedi il dettaglio in ALLEGATO 1	
Interventi con avvio anticipato nel 2019 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito (+100%)	27	€ 3.166.026	€0	NO	2014PRIA0006 2014PRIA0007 2014PRIA0008 2014PRIA0009 2014PRIA0018 2014PRIA0023 2014PRIA0026 2014PRIA0032 2014PRIA0033 2014PRIA0041 2014PRIA0049 2014PRIA0052 2014PRIA0056 2014PRIA0058 2014PRIA0061 2014PRIA0074 2014PRIA0084 2014PRIA0091 2014PRIA0092 2014PRIA0094 2016PRIA0111 2016PRIA0121 2016PRIA0127 2016PRIA0129 2016PRIA0131 2016PRIA0135 2016PRIA0149	
Interventi avviati nel 2019 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID		€. 706.199	€. 1.563.625	NO	2019PRIA0165 2019PRIA0165 2019PRIA0167 2019PRIA0168	

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2019	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2019	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	38	€ 16.596.711	€ 14.803.625	NO	2014PRIA0001 2014PRIA0012 2014PRIA0013 2014PRIA0014 2014PRIA0015 2014PRIA0016 2014PRIA0020 2014PRIA0029 2014PRIA0030 2014PRIA0037 2014PRIA0038 2014PRIA0039 2014PRIA0040 2014PRIA0042 2014PRIA0051 2014PRIA0055 2014PRIA0059 2014PRIA0063 2014PRIA0068 2014PRIA0071 2014PRIA0077 2014PRIA0083 2014PRIA0086 2014PRIA0095 2014PRIA0096 2014PRIA0097 2014PRIA0098 2014PRIA0100 2014PRIA0102 2014PRIA0103 2014PRIA0104 2014PRIA0105 2016PRIA0108 2018PRIA0161 2018PRIA0162 2018PRIA0163 2018PRIA0164 2019PRIA0166	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	6	€ 1.310.708	€ 1.340.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Si specifica che è stato aperto il cod. 2019PRIA0168 per consentire la rendicontazione dei contributi, erogati dalla Protezione Civile, al momento non incassati, relativi all’Emergenza Idrica dell’anno 2017, di cui al OCDPC 468/2017.

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 22 e sintetizzati nella tabella che segue:

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019
2014PRIA0002	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	ACQUEDOTTO	Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	2.000.000	500.000
2014PRIA0005	148EN - Nuova captazione a monte di Calestano e rete trasporto intercomunale	ACQUEDOTTO	Calestano, Felino, Sala Baganza	2.500.000	20.000
2014PRIA0024	14IAG - Adeguamento depuratore di Langhirano	DEPURAZIONE	Langhirano	2.000.000	200.000
2014PRIA0025	155EN - Potenziamento condotta Molino Cozzano Langhirano e ampliamento trattamento acque	ACQUEDOTTO	Langhirano, Felino, Lesignano de Bagni	1.450.000	200.000
2014PRIA0028	16IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio e rifacimento del gruppo di pompaggio serbatoio Felegara	ACQUEDOTTO	Medesano	150.000	100.000
2014PRIA0034	145EN - Nuova Captazione fiume Taro impianto trattamento; condotta interconnessione acquedotti	ACQUEDOTTO	Medesano, Fontevivo, Parma, Noceto	5.480.000	30.000
2014PRIA0060	42IAG - Nuova Condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con Parma Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	2.330.000	400.000
2014PRIA0062	44IAG - Collettamento Baganzola e depuratore Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	1.500.000	200.000
2014PRIA0065	46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma EST con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	DEPURAZIONE	Parma	480.000	200.000
2014PRIA0075	56IAG - Via Cava Vigatto, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	100.000	50.000
2014PRIA0079	60IAG - Zona San Pancrazio, via Madonna dell' Aiuto e strada del Cristo - estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	220.000	20.000
2014PRIA0087	146EN - Ultimazione condotte campo Pozzi Roncopascolo e realizzazione tratti di interconnessione al fine di utilizzare la risorsa di Roncopascolo nei comuni limitrofi e viceversa	ACQUEDOTTO	Parma, Fontevivo, Noceto	936.180	200.000
2014PRIA0101	77IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	330.000	37.000
2014PRIA0106	80IAG - Interventi di ripristino serbatoi acqua - Ristrutturazione edile e idraulica dei serbatoi a servizio dell'acquedotto compresi adeguamenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		60.000
2014PRIA0107	81IAG - Interventi di ripristino sorgenti area montagna - Opere per nuove sorgenti e manutenzione straordinaria delle sorgenti esistenti a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		50.000
2016PRIA0109	Sistema depurativo Località Mossale con relativi collettamenti fognari (Agglomerato <200AE)	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000	70.000
2016PRIA0130	73IAG - interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	FOGNATURA	Opere pluricomunali		80.000
2016PRIA0133	73IAG - Collettamento zona Mazzabue al depuratore di M. I. (opera compensazione A7)	FOGNATURA	Mezzani	150.000	50.000
2016PRIA0146	Tombinatura tratto di fogna in galleria Lalatta	FOGNATURA	Palanzano	50.000	10.000
2016PRIA0152	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana fossetta Alta via San Leonardo (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000	50.000

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019
2016PRIA0158	Adeguamento fognatura via Matteotti (opera compensativa A7)	FOGNATURA	Sorbolo	120.000,00	100.000
2019PRIA0165	Adeguamento Sistema Depurativo loc. Bannone	DEPURAZIONE	Traversetolo	350.000,00	100.000

Tab.4 – Interventi pianificati ma non avviati

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON
 DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016,
 revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRIA0001	153EN - Razionalizzazione ovvero potenziamento delle captazioni torrente Enza	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini, Montechiarugolo, Traversetolo, Parma	1.000.000	250.000	0	250.000	67.098	0	67.098	-73%	Finito primo pozzo in corso studio e progettazione area campo pozzi
2014PRIA0002	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	ACQUEDOTTO	Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	2.000.000	500.000	0	500.000	0	0	0	-100%	Progettazione in attesa di definire le portate a seguito dello studio del punto precedente 2014PRIA0001
2014PRIA0003	1IAG - Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio Ravarano Alto	ACQUEDOTTO	Calestano	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0004	2IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile ed idraulica serbatoio e sorgenti Alpicella	ACQUEDOTTO	Calestano	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	Iniziato studio a fine anno, costi computati nel 2020
2014PRIA0005	148EN - Nuova captazione a monte di Calestano e rete trasporto intercomunale	ACQUEDOTTO	Calestano, Felino, Sala Baganza	2.500.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	Iniziato studio a fine anno, costi computati nel 2020
2014PRIA0006	12EN - Ampliamento depuratore Collecchio	DEPURAZIONE	Collecchio	3.100.000	0	0	0	545.980	105.661	440.319	100%	I costi hanno seguito l'andamento del cantiere.
2014PRIA0007	3IAG - Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pompaggio serbatoio Ripa	ACQUEDOTTO	Collecchio	30.000	0	0	0	9.257	0	9.257	100%	Si tratta di una coda dell'intervento realizzato in annualità precedenti.
2014PRIA0008	18EN - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Marra	ACQUEDOTTO	Corniglio	500.000	0	0	0	4.120	0	4.120	100%	Anticipo attività progettuali
2014PRIA0009	4IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione campo sorgenti Cardale	ACQUEDOTTO	Corniglio	70.000	0	0	0	2.648	0	2.648	100%	Anticipo attività progettuali
2014PRIA0010	5IAG - Ristrutturazione edile ed idraulica serbatoio Casalina	ACQUEDOTTO	Corniglio	120.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0011	21EN - Realizzazione nuovo depuratore Corniglio	DEPURAZIONE	Corniglio	1.342.746	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0012	24EN - Sistema depurativo Località Beduzzo Torre con relativi collettamenti fognari	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000	70.000	0	70.000	6.951	0	6.951	-90%	Costi di progettazione, problemi localizzazione area dep.
2014PRIA0013	6IAG - Sistema depurativo in località Ballone: a) villaggio Micheli; b) località La Costa	DEPURAZIONE	Corniglio	140.000	140.000	0	140.000	13.149	0	13.149	-90%	Costi di progettazione, problemi localizzazione area dep.
2014PRIA0014	7IAG - Sistema depurativo in località Tre Rii e località Torre Tre Rii	DEPURAZIONE	Corniglio	100.000	100.000	0	100.000	8.179	0	8.179	-91%	Costi di progettazione, problemi localizzazione area dep.
2014PRIA0015	8IAG - Sistema depurativo in Località Signatico	DEPURAZIONE	Corniglio	150.000	150.000	0	150.000	11.859	0	11.859	-92%	Costi di progettazione, problemi localizzazione area dep.

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON
 DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016,
 revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRIA0016	9IAG - Sistema depurativo località Petrignacola	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000	70.000	0	70.000	7.229	0	7.229	-89%	Costi di progettazione, problemi localizzazione area dep.
2014PRIA0017	161EN - Ampliamento depuratore Felino (accordo distretto del prosciutto con vasche equalizzazione)	DEPURAZIONE	Felino		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0018	10IAG - Rifacimento impianto elettrico e telecontrollo depuratore Felino	DEPURAZIONE	Felino	606.668	0	0	0	30.753	0	30.753	100%	Code lavori finite in ritardo
2014PRIA0019	11IAG -Rifacimento collettore ingresso e sistema flottatori Depuratore Felino	DEPURAZIONE	Felino	133.211	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0020	158EN - Ampliamento depuratore Fontevivo e conseguente dismissione depuratore di Noceto	DEPURAZIONE	Fontevivo, Noceto	4.661.173	800.000	0	800.000	39.606	0	39.606	-95%	Sviluppo bando di gara e fine progettazione
2014PRIA0021	12IAG - Collegamento località Tiorre	ACQUEDOTTO	Langhirano, Felino		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0022	13IAG - Adeguamento fognatura Case Cavatorta in località Giareto	FOGNATURA	Langhirano	160.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0023	45EN - Sistema depurativo Località Case Manfredelli; località Strognano; località Cozzano con relativi collettamenti fognari	DEPURAZIONE	Langhirano	260.000	0	0	0	81.090	0	81.090	100%	Code Case Manfredelli. Strognano problema individuazione area imhoff
2014PRIA0024	14IAG - Adeguamento depuratore di Langhirano	DEPURAZIONE	Langhirano	2.000.000	200.000	0	200.000	0	0	0	-100%	In corso monitoraggio rete adduzione all'impianto per definizione reflu, costi 2020
2014PRIA0025	155EN - Potenziamento condotta Molino Cozzano Langhirano e ampliamento trattamento acque	ACQUEDOTTO	Langhirano, Felino, Lesignano de Bagni	1.450.000	200.000	0	200.000	0	0	0	-100%	Ritardo inizio progettazione a seguito di definizione altre opere per riassetto acquedotto Langhirano (Gallerie Braia, Le Olive, ecc&)
2014PRIA0026	15IAG - Ampliamento depuratore Santa Maria del Piano e dismissione depuratore Lesignano capoluogo	DEPURAZIONE	Lesignano de Bagni	614.359	0	0	0	444.105	0	444.105	100%	Ritardo dovuto ai tempi di appalto. Lavori dipendenti dai tempi di cantiere
2014PRIA0027	49EN - Costruzione nuovo collettore fognario Lesignano capoluogo depuratore Santa Maria del Piano	FOGNATURA	Lesignano de Bagni	450.240	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0028	16IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio e rifacimento del gruppo di pompaggio serbatoio Felegara	ACQUEDOTTO	Medesano	150.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	Avviate valutazioni di fattibilità
2014PRIA0029	17IAG - Zona Carnevala, collettamento area al dep di Felegara	FOGNATURA	Medesano	550.000	200.000	0	200.000	79.396	0	79.396	-60%	Anticipazione lavori possibili, esproprio in corso e richiesta attraversamento ferroviario, ripianificato POI
2014PRIA0030	18IAG - Via Cisa Felegara a sud dell'agglomerato di Felegara, estendimento fognatura	FOGNATURA	Medesano	600.000	50.000	0	50.000	2.147	0	2.147	-95%	Riprogrammato al 2023

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON
 DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016,
 revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRIA0031	19IAG - Sostituzione aeratori vasca ossidazione e installazione tappeto poroso depuratore Medesano	DEPURAZIONE	Medesano	40.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0032	20IAG - Medesano, rifacimento vasche e filtrazione campo pozzi di Ramiola - 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Collecchio, Medesano, Noceto	1.901.943	0	0	0	152.654	0	152.654	100%	Dilatazione tempi dovuta all'ottenimento dell'autorizzazione del Comune all'esecuzione lavori
2014PRIA0033	21IAG - Nuova Captazione Ceno Accordo Barilla-ATO-IREN	ACQUEDOTTO	Collecchio, Noceto, Medesano	2.500.000	0	0	0	54.794	0	54.794	100%	Costi sviluppo progettuale. Possibile revisione completa dell'opera per captazione da bonifica
2014PRIA0034	145EN - Nuova Captazione fiume Taro impianto trattamento; condotta interconnessione acquedotti	ACQUEDOTTO	Medesano, Fontevivo, Parma, Noceto	5.480.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-100%	Dipendente e conseguente all'opera 2014PRIA0033
2014PRIA0035	58EN - Opere per realizzazione distretti idrici	ACQUEDOTTO	Mezzani		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0036	22IAG - Rifacimento fognatura via Benassi	FOGNATURA	Mezzani		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0037	68EN - Sistema depurativo Località Trefiumi	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	472.000	60.000	0	60.000	11.325	0	11.325	-81%	Costi di progettazione, problemi localizzazione area dep.
2014PRIA0038	23IAG - Sistema depurativo località Ceda	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	112.000	70.000	0	70.000	14.488	0	14.488	-79%	Costi di progettazione, problemi localizzazione area dep.
2014PRIA0039	24IAG - Sistema depurativo Lugagnano Inferiore A+B; Lugagnano Superiore; Ponte di Lugagnano	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	520.000	70.000	0	70.000	11.089	0	11.089	-84%	Costi di progettazione, problemi localizzazione area dep.
2014PRIA0040	25IAG - Sistema depurativo Trecoste	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	70.000	70.000	0	70.000	8.186	0	8.186	-88%	Costi di progettazione, problemi localizzazione area dep.
2014PRIA0041	26IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Navert	ACQUEDOTTO	Monchio delle Corti	200.000	0	0	0	3.140	0	3.140	100%	Lavori in corso, finiranno 2020
2014PRIA0042	156EN - Costruzione nuovo depuratore di Monticelli Terme e dismissione del vecchio impianto - 1° stralcio	DEPURAZIONE	Traversetolo, Neviano degli Arduini, Montechiarugolo	12.700.000	2.800.000	0	2.800.000	65.653	0	65.653	-97%	Costi progettazione definitiva
2014PRIA0043	27IAG - Sistema depurativo Cavandola	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0044	28IAG - Sistema depurativo Lodrignano Cabina	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	10.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0045	29IAG - Sistema depurativo Magrignano	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	55.000	0	0	0	0	0	0	0%	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON
 DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016,
 revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRIA0046	30IAG - Sistema depurativo Montezebio	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0047	31IAG - Sistema depurativo Mozzano	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0048	32IAG - Sistema depurativo Sella Di Lodrignano	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	10.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0049	33IAG - Sistema depurativo Verola	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	150.000	0	0	0	53.155	0	53.155	100%	Completamento lavori anno precedente
2014PRIA0050	76EN - Nuovo serbatoio di accumulo in località Mendigola a Neviano	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	66.998	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0051	34IAG - Realizzazione nuovo serbatoio accumulo località Canale di Scurano (Neviano)	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	1.400.000	100.000	0	100.000	5.023	0	5.023	-94%	Ritardo legato alle problematiche incontrate per acquisizione terreno
2014PRIA0052	35IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio serbatoio Gavoia	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	200.000	0	0	0	5.857	0	5.857	100%	Richieste indagini su CLS in ase progettazione strutturale
2014PRIA0053	36IAG - Sostituzione condotta alimentazione serbatoio Coste di Urzano	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	4.127	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0054	37IAG - Interventi cofinanziati con Asse 3, serbatoi montagna	ACQUEDOTTO	Calestano, Neviano degli Arduini, Langhirano, Felino	36.223	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0055	38IAG - Realizzazione nuovo collettore fognario a servizio del Comuni di Neviano; Traversetolo; Montechiarugolo - 1° stralcio	FOGNATURA	Neviano degli Arduini, Traversetolo, Montechiarugolo	7.548.448	700.000	0	700.000	47.379	0	47.379	-93%	Contenzioso con impresa appaltatrice posticipa inizio lavori
2014PRIA0056	90EN - Ampliamento depuratore Borghetto	DEPURAZIONE	Noceto	623.979	0	0	0	392.914	0	392.914	100%	Ritardo dovuto ai tempi di appalto. Lavori dipendenti dai tempi di cantiere
2014PRIA0057	39IAG - Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pompaggio serbatoio Gatto Gambarone	ACQUEDOTTO	Noceto	40.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0058	40IAG - Manutenzione straord. e TLC sollevamento fognario via Canvelli	FOGNATURA	Noceto	30.000	0	0	0	179	0	179	100%	Coda intervento anno precedente
2014PRIA0059	41IAG - Nuova centrale idrica Roncopascolo con vasche accumulo permeato e miscelato e impianto trattamento nitrati (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	5.350.000	800.000	0	800.000	27.644	0	27.644	-96%	Costi per indagini nuovo pozzo
2014PRIA0060	42IAG - Nuova Condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con Parma Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	2.330.000	400.000	0	400.000	0	0	0	-100%	Attività dipendenti dal punto precedente 2014PRIA0059. Oggetto di ripianificazione nel nuovo POI

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON
 DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016,
 revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRIA0061	43IAG - Adeguamento depuratore Corcagnano	DEPURAZIONE	Parma	2.400.000	0	0	0	85.441	0	85.441	100%	Fine attività progettuali
2014PRIA0062	44IAG - Collettamento Baganzola e depuratore Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	1.500.000	200.000	0	200.000	0	0	0	-100%	Ripianificato con proposta di collettamento su parma ovest
2014PRIA0063	45IAG - Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord fra depuratore e Parma	FOGNATURA	Parma	1.991.000	400.000	0	400.000	4.799	0	4.799	-98%	In ritardo con ottenimento autorizzazioni progetto
2014PRIA0064	105EN - Manutenzione straordinaria elettromeccanica digestori PR ovest	DEPURAZIONE	Parma	131.151	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0065	46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma EST con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	DEPURAZIONE	Parma	480.000	200.000	0	200.000	0	0	0	-100%	Era noto lo spostamento nel 2020 nel nuovo piano
2014PRIA0066	47IAG - Manutenzione straordinaria nuovo sollevamento Depuratore Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	120.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0067	48IAG - Sostituzione condotte idriche sottopasso ferroviario PR-SP via Emilia OVEST con DN 400	ACQUEDOTTO	Parma	425.138	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0068	49IAG - Nuova condotta idrica DN 400 via Reggio; strada Baganzola; pozzo Cornocchio per risoluzione problema nitrati	ACQUEDOTTO	Parma	470.000	470.000	235.000	235.000	13.994	0	13.994	-97%	Rivisitazione progetto in corso
2014PRIA0069	50IAG - Rifacimento condotta acquedotto via Trento DN 400	ACQUEDOTTO	Parma	55.010	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0070	51IAG - Sistemazione rete fognaria Vigatto zona via Donatori Sangue (priorità 1 Comune di Parma)	FOGNATURA	Parma	220.657	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0071	52IAG - Estendimento fognatura Via Argini	FOGNATURA	Parma	2.000.000	400.000	0	400.000	293.161	0	293.161	-26%	Lavori in corso rendicontazione secondo avanzamento cantiere
2014PRIA0072	53IAG - Viale Villetta, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	110.750	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0073	54IAG - via Rezzonico, sistemazione fognature	FOGNATURA	Parma	80.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0074	55IAG - Zona Vicopò via Principale Beneceto, via Naviglia - estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	400.000	0	0	0	230	0	230	100%	Code anni precedenti
2014PRIA0075	56IAG - Via Cava Vigatto, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	Ripianificato 2020

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON
 DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016,
 revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRIA0076	57IAG - via Gastaldi e via Colorno, estendimento fognature	FOGNATURA	Parma	220.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0077	58IAG - Zona Viarolo via Lugagnano, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	470.000	100.000	0	100.000	476.474	0	476.474	376%	Lavori in corso rendicontazione secondo avanzamento cantiere
2014PRIA0078	59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, str. Borghetto, str. S.Cosimo, str. Quingenti - estendimento fognatura - opera comp. A7	FOGNATURA	Parma	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0079	60IAG - Zona San Pancrazio, via Madonna dell' Aiuto e strada del Cristo - estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	220.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	Intervento non realizzato in quanto Amministrazione Comunale ha chiesto di veicolare importo su altra opera prevista su POI 20-23
2014PRIA0080	61IAG - Ripristino serbatoio pensile Antognano	ACQUEDOTTO	Parma	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0081	62IAG - Impermeabilizzazione vasche contenimento siero latte. Dep PR Ovest	DEPURAZIONE	Parma	10.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0082	63IAG - Rifacimento condotte fognatura via Trento DE 800	FOGNATURA	Parma	105.070	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0083	95EN - Progetti distrettualizzazione rete idrica	ACQUEDOTTO	Parma	985.966	50.000	0	50.000	693.237	0	693.237	1286%	Incentivata distrettualizzazione per riduzione fughe comune di Parma
2014PRIA0084	64IAG - Nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	110.000	0	0	0	79.495	0	79.495	100%	Ritardo inizio lavori per acquisizione terreno
2014PRIA0085	65IAG - Studio degli acquiferi e relativa modellazione per governo problema nitrati Acquedotti Parma e comuni limitrofi.	ACQUEDOTTO	Parma	20.038	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0086	66IAG - Studio e modellazione reti fognarie	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	120.000	30.000	0	30.000	95.549	0	95.549	218%	Consuntivazione delle attività non contabilizzate degli anni precedenti (vedi risparmi anni precedenti)
2014PRIA0087	146EN - Ultimazione condotte campo Pozzi Roncopascolo e realizzazione tratti di interconnessione al fine di utilizzare la risorsa di Roncopascolo nei comuni limitrofi e	ACQUEDOTTO	Parma, Fontevivo, Noceto	936.180	200.000	0	200.000	0	0	0	-100%	Nota la riprogrammazione nel 2020-2023
2014PRIA0088	67IAG - Raddoppio impianto denitrificazione Centrale idrica Marore	ACQUEDOTTO	Parma, Montechiarugolo, Noceto	179.541	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0089	68IAG - Rifacimento impianto elettrico e telecontrollo centrale idrica Marore	ACQUEDOTTO	Parma	734.142	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0090	69IAG - Nuova condotta adduttrice San Vitale serbatoio Torre del Boriano	ACQUEDOTTO	Sala Baganza		0	0	0	0	0	0	0%	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON
DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016,
revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRIA0091	70IAG - Nuovo serbatoio San Vitale Baganza, sistem. campo pozzi ex Monte Bosso con impianto filtrazione	ACQUEDOTTO	Sala Baganza	1.317.620	0	0	0	563.097	0	563.097	100%	Lavori in corso rendicontazione secondo avanzamento cantiere
2014PRIA0092	119EN - Ampliamento depuratore Sorbolo	DEPURAZIONE	Sorbolo	2.204.646	0	0	0	178.668	0	178.668	100%	Contenzioso con l'impresa esecutrice in corso per l'ultimazione lavori sta protrando nel tempo le lavorazioni e la consuntivazione
2014PRIA0093	118EN - Opere per realizzazione distretti idrici	ACQUEDOTTO	Sorbolo	30.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0094	138EN - Sistema depurativo Località Torre e colettamento fognature	DEPURAZIONE	Traversetolo		0	0	0	43.409	0	43.409	100%	Lavoro previsto in annualità precedenti
2014PRIA0095	71IAG - Manutenzioni straordinarie	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		2.300.000	0	2.300.000	7.840.214	0	7.840.214	240%	Di cui circa 2.700.000 di rifacimento reti idriche per perdite in quanto manca capitolo specifico. Per quanto riguarda la parte IMPIANTI, i maggiori costi sono dovuti principalmente ad adeguamenti normativi
2014PRIA0096	71IAG - Manutenzioni straordinarie	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		1.080.000	0	1.080.000	2.801.747	0	2.801.747	340%	Maggiori costi presso i depuratori di Mezzani e Noceto per mettere in sicurezza componenti principali e accessori connessi alla nuova cabina MT; maggiori costi presso i depuratori di Monticelli, Collecchio e
2014PRIA0097	73IAG - Manutenzioni straordinarie	FOGNATURA	Opere pluricomunali	21.966.088	650.000	0	650.000	2.321.881	0	2.321.881	257%	Sono stati eseguiti interventi non prorogabili per evitare problemi alla sicurezza delle strutture, delle persone e garantire le normali condizioni igienico sanitarie in particolare sul reticolo fognario di Parma.
2014PRIA0098	74IAG - Aggiornamento cartografico	TUTTI	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo	1.063.273	100.000	0	100.000	188.087	0	188.087	88%	Maggiori risorse dedicate all'attività di aggiornamento della cartografia delle reti.
2014PRIA0099	75IAG - Sostituzione condotte idriche in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		600.000	0	600.000	628.624	0	628.624	4%	
2014PRIA0100	76IAG - Sostituzione condotte fognarie in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	FOGNATURA	Opere pluricomunali		150.000	0	150.000	405.570	0	405.570	170%	Lavori in funzione delle richieste ricevute dai comuni
2014PRIA0101	77IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo,	330.000	37.000	0	37.000	0	0	0	-100%	Parte dei lavori anticipata negli anni precedenti

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016, revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRIA0102	78IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti depurazione e adeguamento impianti elettrici	DEPURAZIONE	Fontevivo, Calestano, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle	1.321.043	60.000	0	60.000	254.900	0	254.900	324	Interventi realizzati secondo necessità
2014PRIA0103	79IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti fognatura e adeguamento impianti elettrici	FOGNATURA	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle	505.078	50.000	0	50.000	36.335	0	36.335	-27	Interventi realizzati secondo necessità
2014PRIA0104	143EN - Estendimento reti acqedotto con contributo ripartito tra comuni e privati.	ACQUEDOTTO	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza		150.000	150.000	0	27.714	0	27.714	-81%	Lavori in funzione delel richieste ricevute dai comuni
2014PRIA0105	144EN - Estendimento reti fognarie con contributo comuni/privati.	FOGNATURA	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza		50.000	50.000	0	6.934	10.915	-3.981	-86	Lavori in funzione delel richieste ricevute dai comuni
2014PRIA0106	80IAG - Interventi di ripristino serbatoi acqua Ristrutturazione edile e idraulica dei serbatoi a servizio dell'acquedotto compresi adeguamenti per la sicurezza dei luoghi di	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		60.000	0	60.000	0	0	0	-100%	Interventi realizzati secondo necessità
2014PRIA0107	81IAG - Interventi di ripristino sorgenti area montagna - Opere per nuove sorgenti e manutenzione straordinaria delle sorgenti esistenti a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	Interventi realizzati secondo necessità
2016PRIA0108	Complesso acquedottistico relativo all'impianto di trattamento acqua delle gallerie Braia e dei pozzi Fabiola	ACQUEDOTTO	Langhirano, Felino	3.250.000	250.000	0	250.000	2.950	0	2.950	-98%	Ritardo su conclusione fase progettuale e appalto lavori
2016PRIA0109	Sistema depurativo Località Mossale con relativi collettamenti fognari (Agglomerato <200AE)	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-100%	Nota la riprogrammazione nel 2020-2023
2016PRIA0110	interventi di sistemazione rete fognaria nera e mista via La Spezia con eventuale realizzazione scaricatori di piena (opera comp. A7)	FOGNATURA	Parma	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0111	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Naviglio (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	125.000	0	0	0	129.646	0	129.646	100%	Code intervento pianificato in annualità precedenti.
2016PRIA0112	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Galasso (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	120.000	0	0	0	0	0	0	0%	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON
 DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016,
 revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2016PRIA0113	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Abbeveratoia (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0114	progettazione e realizzazione interventi di man str impianti sollevamento acque bianche sottopassi (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	280.000	60.000	0	60.000	54.386	0	54.386	-9%	
2016PRIA0115	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana fognatura Carignano-San Ruffino-Gaione (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0116	Interventi di sistemazione strutturale rete fognaria Carignano-San Ruffino-Gaione (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0117	rifacimento tratto fognario in corrispondenza dell'attraversamento tangenziale sud via Langhirano (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0118	verifiche per adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori Savani - D'Azeglio e Bernini (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0119	Interventi di manutenzione straordinaria fognatura pensile all'interno del Canale Maggiore area urbana Cittadella (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0120	interventi di manutenzione straordinaria collettore di scarico caditoie via Varese (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0121	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piazzale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000	0	0	0	28.584	0	28.584	100%	Lavori iniziati in ritardo
2016PRIA0122	80IAG - Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio pensile Ponte Taro	ACQUEDOTTO	Fontevivo	200.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0123	Sistemazione rete fognaria FONTEVIVO capoluogo area Rio Scagno e Canale Vecchio. Collettamento fognatura con sostituzione canalette con adeguate tubazioni	FOGNATURA	Fontevivo	200.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0124	Messa in sicurezza (abbattimento) serbatoio pensile Basilicanova a seguito verifica vulnerabilità sismica	ACQUEDOTTO	Montechiarugolo	200.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0125	interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		30.000	0	30.000	25.493	354.924	-329.430	-15%	
2016PRIA0126	75IAG - Nuovo collegamento idrico Strada Croce Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo, Parma	400.000	300.000	0	300.000	278.584	0	278.584	-7%	
2016PRIA0127	75IAG - Attraversamento acquedotto Via Mantova (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo	100.000	0	0	0	57.960	0	57.960	100%	Iniziato lavorazioni in funzione di permessi ottenuti

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON
 DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016,
 revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2016PRIA0128	71IAG - Sostituzione rete Via Cavatorta lo. Giarreto	ACQUEDOTTO	Langhirano	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0129	76IAG - Collettamento nuclei isolati Corte Godi; Enzano e Alba ad adeguato impianto trattamento (opera compensativa A7)	FOGNATURA	Sorbolo	1.500.000	0	0	0	4.724	0	4.724	100%	Spese progettuali, ripianificato 20-23
2016PRIA0130	73IAG - interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	FOGNATURA	Opere pluricomunali		80.000	0	80.000	0	0	0	-100%	Lavori in funzione delle necessità verificate
2016PRIA0131	72IAG - Installazione analizzatori fosforo(P) uscita depuratori di PR OVEST; PR EST; FELINO	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	100.000	0	0	0	42.621	0	42.621	100%	Coda intervento anno precedente
2016PRIA0132	73IAG - Man Str. Sistema fognario Pietta Cisone per evoluzione frane	FOGNATURA	Tizzano Val Parma	411.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0133	73IAG - Collettamento zona Mazzabue al depuratore di M. I. (opera compensazione A7)	FOGNATURA	Mezzani	150.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	Ripianificato 20-23
2016PRIA0134	73IAG - Collettamento Via Garibaldi Casale di MEZZANI (opera compensazione A7)	FOGNATURA	Mezzani	150.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0135	80IAG - ampliamento serbatoio Le Olive e man. Str. serb Manzano	ACQUEDOTTO	Langhirano	950.000	0	0	0	138.251	0	138.251	100%	Fine lavori Manzano. Le olive ripianificato 20-23
2016PRIA0136	Realizzazione nuovi impianti di clorazione per consolidare corretto mantenimento dei parametri allegato 1 parte A D.Lgs 31/01	ACQUEDOTTO	Palanzano	195.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0137	Rifacimento opera di presa Monte Faggeto per impianto Isola	ACQUEDOTTO	Palanzano	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0138	Rifacimento opera di presa Temperla Vairo	ACQUEDOTTO	Palanzano	80.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0139	Intervento di riparazione linea adduzione Vairo Vaestano	ACQUEDOTTO	Palanzano	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0140	Intervento di ripristino adduzione Groppo Vairo	ACQUEDOTTO	Palanzano	20.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0141	Messa a norma serbatoio Caneto	ACQUEDOTTO	Palanzano	80.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0142	Opere di protezione prese Lalatta	ACQUEDOTTO	Palanzano	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON
 DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016,
 revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2016PRIA0143	Rifacimento imhoff Vaestano	DEPURAZIONE	Palanzano	30.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0144	Rifacimento imhoff Selvanizza A	DEPURAZIONE	Palanzano	80.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0145	Rifacimento imhoff Sommogrosso	DEPURAZIONE	Palanzano	20.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0146	Tombinatura tratto di fogna in galleria Lalatta	FOGNATURA	Palanzano	50.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	nessuna sa di che opera si tratti
2016PRIA0147	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0148	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0149	adeguamento idraulico e strutturale collettori e scolmatori di piena collettori via Sidoli - via Casa Bianca (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	480.000	0	0	0	33.254	0	33.254	100%	Code anni precedenti
2016PRIA0150	via Torrente Gotra realizzazione nuova fognatura mista Vs. collettore via Manubiola. (opera compensativa A7)	FOGNATURA	Parma	40.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0151	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana cavo Cinghio tombinato (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0152	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana fossetta Alta via San Leonardo (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	Intervento non realizzato in quanto Amministrazione Comunale ha chiesto di veicolare importo su altra opera prevista su POI 20-23
2016PRIA0153	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana cavo Cava via Ferrarini-via Valera di sopra (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0154	Interventi di manutenzione straordinaria via Trieste via Montello	FOGNATURA	Parma	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0155	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana strada Bassa dei Folli Porporano (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0156	Rifacimento collettore fognario ingresso depuratore Vestola, divelto da ondata di piena torrente.	FOGNATURA	Corniglio	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0157	sistemazione tratti di collettori fognari interessati da movimenti franosi nelle seguenti località: Capoluogo; Carpaneto;Reno di TIZZANO; Capriglio; Pianestolla, Boschetto,	FOGNATURA	Tizzano Val Parma	500.000	100.000	0	100.000	84.722	0	84.722	-15%	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON
DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016,
revisionato con delibera n. n° 6 del 15 gennaio 2020**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2016PRIA0158	Adeguamento fognatura via Matteotti (opera compensativa A7)	FOGNATURA	Sorbolo	120.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	Ripianificato 20-23
2018PRIA0159	"Contributi Progetto sperimentazione autolettura contatori - comune di Parma (rif. 2014PRIA0095)	ACQUEDOTTO	Parma		0	0	0	0	0	0	0%	
2018PRIA0160	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0%	
2018PRIA0161	Sostituzione reti idriche fuganti via Tommasicchio-Don Corchia	ACQUEDOTTO	Langhirano	150.000	150.000	75.000	75.000	5.669	0	5.669	-96%	FSC iniziati in ritardo contabilizzati 2020
2018PRIA0162	Sostituzione rete idrica fugante in strada Argini NORD	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	150.000	150.000	75.000	75.000	5.479	0	5.479	-96%	FSC iniziati in ritardo contabilizzati 2020
2018PRIA0163	Sostituzione reti idriche fuganti zona Passo del Bocco	ACQUEDOTTO	Parma	300.000	300.000	150.000	150.000	75.386	0	75.386	-74%	lavori in corso rendicontazione secondo avanzamento cantiere
2018PRIA0164	Sostituzione reti idriche fuganti zona Strada Massese	ACQUEDOTTO	Tizzano Val Parma	200.000	200.000	100.000	100.000	152.930	0	152.930	-23%	lavori in corso rendicontazione secondo avanzamento cantiere
2019PRIA0165	Adeguamento Sistema Depurativo loc. Bannone	DEPURAZIONE	Traversetolo	350.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	Problema con acquisto area
2019PRIA0166	Nuovi Allacci	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		1.213.625	442.316	771.309	467.300	298.833	168.467	-61%	Interventi realizzati in funzione delle richieste ricevute
2019PRIA0167	Opere di difesa spondale per la protezione del Campo Pozzi di Velago	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	250.000	250.000	70.000	180.000	238.899	0	238.899	-4%	
2019PRIA0168	Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0%	
IMPORTO TOTALE:					18.870.625 €	1.347.316 €	17.523.309 €	21.073.445 €	770.333 €	20.303.112 €		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 15 del 4 dicembre 2020

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Approvazione Consuntivo 2019.
Programma Operativo Interventi –2015-2019**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 4 dicembre 2020

Il Direttore
Responsabile ad interim
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Vito Belladonna



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante

F.to Mario Ori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 25 marzo 2021

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
