

**CLRA/2023/4 del 12 dicembre 2023**

**CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

LA COORDINATRICE

Valentina Palli

CLRA/2023/4

## CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 12:00 si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0012588 del 07/12/2023, in seduta telematica.

Assume la presidenza la Coordinatrice Valentina Palli.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune/Provincia	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
Provincia di Ravenna	Palli Valentina	Sindaco, Delegato	si	10,0000
Alfonsine	Graziani Riccardo	Sindaco	si	2,9186
Bagnacavallo	Corzani Caterina	Assessore, Delegato	si	3,9307
Bagnara di Romagna	Ercolani Cristiano	Assessore, Delegato	si	1,0049
Brisighella				
Casola Valsenio				
Castel Bolognese	Minzoni Gaspare	Assessore, Delegato	si	2,5086
Cervia	Zavatta Cesare	Assessore, Delegato	si	6,5495
Conselice	Pula Paola	Sindaco	si	2,4874
Cotignola	Baldini Pier Luca	Vicesindaco, Delegato	si	2,0455
Faenza	Ortolani Luca	Assessore, Delegato	si	12,8921
Fusignano				
Lugo	Galletti Maria Pia	Assessore, Delegato	si	7,1977
Massa Lombarda	Sangiorgi Stefano	Assessore, Delegato	si	2,7147
Ravenna	Baroncini Gianandrea	Assessore, Delegato	si	33,2519
Riolo Terme				
Russi	Palli Valentina	Sindaco	si	3,0389
Sant'Agata sul Santerno				
Solarolo	Briccolani Stefano	Sindaco	si	1,4254

Presenti n. 14 quote 91.9659

Assenti n. 5 quote 8.0341

Riconosciuta la validità della seduta Valentina Palli invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n.1 del 27 gennaio 2020 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore Hera Spa;
- con deliberazione n.8 del 25 luglio 2022 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato la revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2022-2023 del Gestore Hera s.p.a.;

**considerato** altresì che:

- con deliberazione n. 84 del 12 settembre 2022 il Consiglio d'ambito ha approvato la revisione delle "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato" di cui alla CAMB n.75/2007;
- tale deliberazione tra l'altro dispone che il Consiglio Locale:
  - esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
  - individua gli interventi per i quali avviare eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Gestore da proporre al Consiglio d'ambito, in relazione a quanto previsto dalle Convenzioni di servizio vigenti;
  - ratifica la revisione puntuale del POI avvenuta con nulla osta della struttura tecnica di ATERSIR;

**dato atto** che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software ARSI;

**dato atto** altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2022 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**rilevato** che:

- nell'annualità 2022 dalla struttura tecnica di ATERSIR è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR un nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.84/2022, rintracciabile al protocollo dell'Agenzia PG.AT/2022/0012837 del 22/12/2022;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati inferiori di 4.788.362,11 € rispetto a quanto previsto nell'annualità 2022 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al -18%;

- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

**ritenuto** pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**a voti** resi nelle forme di legge, con voti favorevoli unanimi;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 4 del 12 dicembre 2023

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 12 dicembre 2023

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI  
ANNO 2022  
GESTORE: HERA S.P.A.  
BACINO PROVINCIALE DI: RAVENNA**

## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2022, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ravenna n.1 del 27 gennaio 2020, successivamente aggiornato con Delibera n.8 del 25 luglio 2022, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO2022	CONSUNTIVO2022	DIFFERENZA	DIFF%
<b>GESTORE</b>	18.126.159,00€	18.080.347,53€	-45.811,47€	0%
<b>SOCIETA' TERZE</b>	4.869.407,00€	2.760.124,85€	-2.109.282,15€	-43%
<b>FONDOPERDUTO</b>	4.315.950,00€	1.682.681,51€	-2.633.268,49€	-61%
<b>TOTALE</b>	<b>27.311.516,00€</b>	<b>22.523.153,89€</b>	<b>-4.788.362,11€</b>	<b>-18%</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Gli investimenti di struttura per l'anno 2022 non sono ancora stati rendicontati (max. 1.799.721,00 €). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa il 18%.

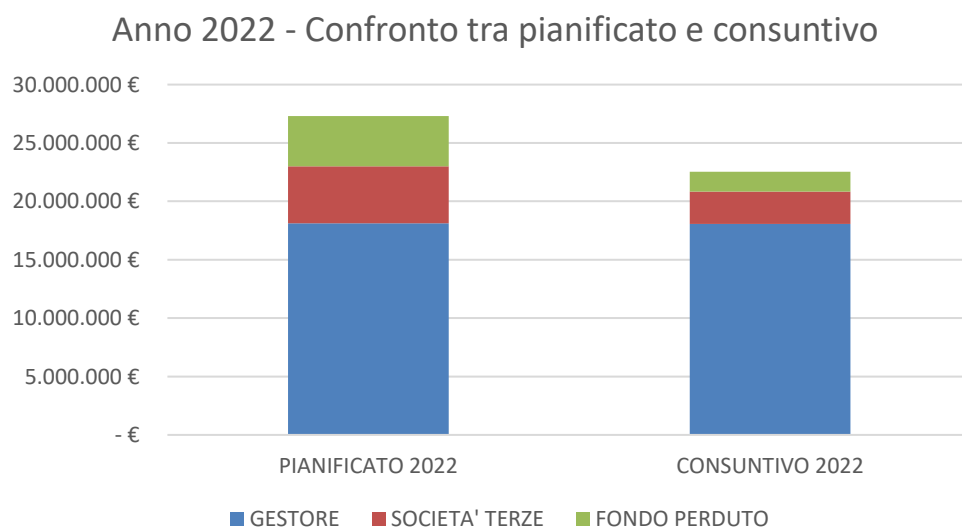


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

## 2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si notano investimenti nel comparto acquedottistico sostanzialmente in linea con il programmato, mentre significativi sono gli scostamenti negativi per il comparto fognario-depurativo. Si registrano alcuni ritardi nelle fasi di progettazione e per ridefinizione di alcune priorità a fronte di nuove esigenze.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	11.155.976,00€	10.547.200,83€	-608.775,17€	-5%
DEPURAZIONE	6.140.918,00€	4.905.392,10€	-1.235.525,90€	-20%
FOGNATURA	9.639.622,00€	6.753.460,61€	-2.886.161,39€	-30%
ACQUE BIANCHE	375.000,00€	317.100,35€	-57.899,65€	-15%
<b>Totale</b>	<b>27.311.516,00€</b>	<b>22.523.153,89€</b>	<b>-4.788.362,11€</b>	<b>-18%</b>

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

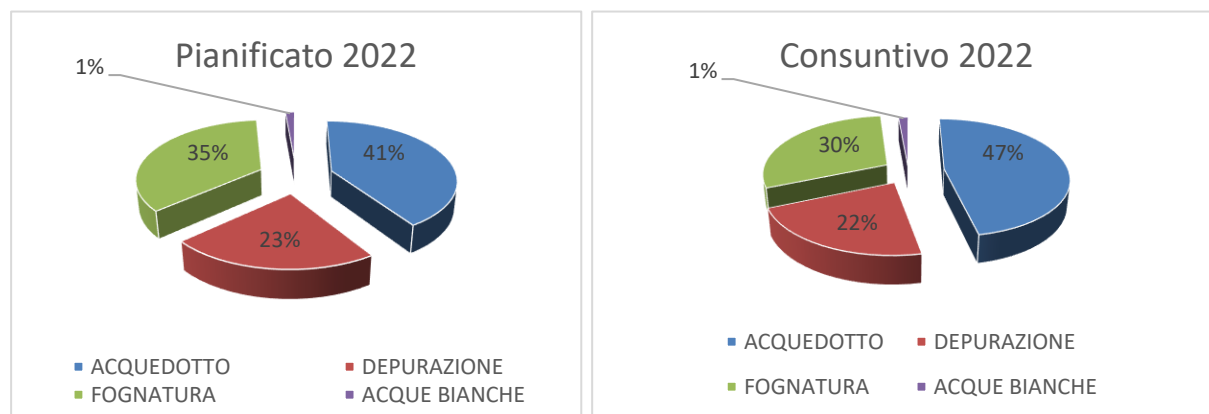


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2022 per servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie, costituite da opere specifiche di manutenzione straordinaria individuate nel programma investimenti e dai titoli cumulativi di manutenzione straordinaria; per quest'ultimi è previsto un budget complessivo a cui il Gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno.



	<b>PIANIFICATO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFFERENZA €</b>	<b>DIFF %</b>
<b>ACQUEDOTTO</b>	7.327.000,00 €	7.211.205,22 €	-115.794,78 €	-1,58%
<b>DEPURAZIONE</b>	1.220.000,00 €	1.107.546,20 €	-112.453,80 €	-9,22%
<b>FOGNATURA</b>	1.708.000,00 €	2.431.890,87 €	723.890,87 €	42,38%
<b>ACQUE BIANCHE</b>	375.000,00 €	317.100,35 €	-57.899,65 €	-15,44%
<b>TOTALE</b>	<b>10.630.000,00 €</b>	<b>11.067.742,64 €</b>	<b>437.742,64 €</b>	<b>4,12%</b>

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi. Sono esclusi dal conteggio gli interventi già conclusi in annualità precedenti ma ancora presenti a piano con pianificazione e consuntivazione pari a 0 (n.38), gli interventi annullati (n.18) e gli investimenti di struttura (n.2).

<b>CLASSI D'IMPORTO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>PIANIFICATO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF. %</b>
<b>Fino a 500.000 €</b>	48	1.965.248,00 €	1.619.391,25 €	- 345.856,75 €	-18%
<b>500.000-1.000.000 €</b>	22	1.274.095,00 €	444.564,85 €	- 829.530,15 €	-65%
<b>1.000.000-2.000.000 €</b>	15	3.088.894,00 €	2.752.661,99 €	- 336.232,01 €	-11%
<b>2.000.000-5.000.000 €</b>	21	723.580,00 €	490.744,06 €	- 232.835,94 €	-32%
<b>Oltre 5.000.000 €</b>	9	7.298.699,00 €	3.400.154,00 €	- 3.898.545,00 €	-53%
<b>Titoli cumulativi</b>	36	12.961.000,00 €	13.815.637,74 €	854.637,74 €	7%
<b>TOTALE</b>	<b>151</b>	<b>27.311.516,00</b>	<b>22.523.153,89</b>	<b>- 4.788.362,11</b>	<b>-18%</b>

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.

- Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 87
- Numero di interventi rendicontati (con importo lordo maggiore di zero) nel 2022: 66.

	<b>NUMERO INTERVENTI</b>	<b>IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022</b>	<b>IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2022</b>
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%), cd "non avviati"	31	4.289.032,00€	-€
Interventi con un valore pianificato pari a 0 e un valore consuntivato diverso da 0 (+100%)	10	-€	418.408,55€
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	40	13.173.397,00€	11.986.847,97€
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	16	9.849.087,00€	10.117.897,37

TAB.5 – Corrispondenza fra importi pianificati e consuntivati

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti maggiori del +/- 20% sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

Di seguito la tabella degli interventi non avviati.

**INTERVENTI NON AVVIATI**

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022
1	2019RAHA0013	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	CONAMI	152.000,00€	102.000,00€
2	2019RAHA0017	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEGLI SCARICHI DELLO SCOLMATORE V.CANALE	FOGNATURA	Castel Bolognese	CONAMI	2.500.000,00€	100.000,00€
3	2022RAHA0016	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E NUOVA VASCA DI EQUALIZZAZIONE	DEPURAZIONE	Cervia	Ravenna Holding	7.060.916,00€	227.519,00€
4	2014RAHA0063	COLLETTAMENTO DEPURAZIONE QUART.VIA DALPOZZO VIA BIASOLA	FOGNATURA	Faenza	Romagna Acque	200.000,00€	18.000,00€
5	2019RAHA0028	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI FAENZA	DEPURAZIONE	Faenza	CONAMI	1.356.000,00€	20.000,00€
6	2014RAHA0067	POTENZIAMENTO RETE IDRICA LUGO - VOLTANA	ACQUEDOTTO	Lugo	Gestore	2.250.000,00€	239.000,00€
7	2022RAHA0015	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	FOGNATURA	Lugo	TEAM	160.000,00€	20.000,00€
8	2022RAHA0006	REVAMPING SISTEMA AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEP LUGO	DEPURAZIONE	Lugo	Gestore	255.000,00€	55.000,00€
9	2022RAHA0022	RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 7 - TEAM	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	TEAM		74.000,00€
10	2022RAHA0005	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		1.346.000,00€
11	2022RAHA0021	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - TEAM	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	TEAM		120.000,00€
12	2022RAHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		50.000,00€
13	2022RAHA0014	STUDIO PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI IDRICI DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO AFFERENTE AL POTABILIZZATORE BRUNORI-ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	100.000,00€	20.000,00€
14	2022RAHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00€
15	2022RAHA0023	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - TEAM	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	TEAM		80.000,00€
16	2019RAHA0036	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 7 RA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00€
17	2019RAHA0039	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 7 RA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00€
18	2019RAHA0054	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	FOGNATURA	Ravenna	Ravenna Holding	427.000,00€	376.000,00€
19	2018RAHA0014	DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	Ravenna	Romagna Acque	25.110.000,00€	412.230,00€
20	2019RAHA0056	TOMBAMENTO FOSSO V.CELLA SAN BARTOLO	FOGNATURA	Ravenna	Ravenna Holding	1.127.000,00€	97.000,00€
21	2014RAHA0158	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN1 VIA CHERSO - DARSENA	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	974.000,00€	366.075,00€
22	2019RAHA0041	POTENZIAMENTO CENTRALE IDRICA LIDO ADRIANO	ACQUEDOTTO	Ravenna	Ravenna Holding	853.173,00€	9.000,00€
23	2014RAHA0117	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE ""CORSO NORD"" - III STRALCIO	ACQUEDOTTO	Ravenna	NON DEFINITO	595.000,00€	27.000,00€
24	2019RAHA0045	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	Romagna Acque	3.710.000,00€	90.000,00€
25	2019RAHA0055	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO LIDO ADRIANO	FOGNATURA	Ravenna	NON DEFINITO	853.000,00€	9.000,00€
26	2019RAHA0040	COMPLETAMENTO CONDOTTA RAV.NORD-CASALBORSETTI II STR	ACQUEDOTTO	Ravenna	Romagna Acque	2.105.156,00€	50.000,00€
27	2019RAHA0046	FILTRAZIONE E DISINFEZIONE DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	Romagna Acque	4.610.000,00€	90.000,00€
28	2019RAHA0044	DISMISSIONE DEPURATORE MARINA DI RAVENNA E COLLETTAMENTO A RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	NON DEFINITO	3.890.000,00€	50.000,00€
29	2015RAHA0026	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO BIDENTE	FOGNATURA	Ravenna	NON DEFINITO	6.600.000,00€	90.000,00€
30	2019RAHA0043	NUOVO IMPIANTO CADITOIE A DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	Romagna Acque	2.670.000,00€	70.000,00€
31	2014RAHA0167	COLLETTAMENTO ZONA ARTIGIANALE "MONALDINA NORD" - I STRALCIO	FOGNATURA	Russi	Romagna Acque	485.159,00€	51.208,00€

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Ravenna n.8 del 25 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO			
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative	
1	2014RAHA0004	REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA RASPOVA ALFONSI	F	Alfonse	TEAM	445.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID CONCLUSO	
2	2017RAHA0020	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA BASSA - LONGASTRINO	F	Alfonse	Gestore	3.100.000,00 €	43.206,00 €	- €	- €	43.206,00 €	38.332,26 €	- €	- €	38.332,26 €	-	4,873,74	-11	ID CONCLUSO NEL 2020
3	2019RAHA0003	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - ALFONSE	F	Alfonse	TEAM	3.100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
4	2014RAHA0001	DEPURATORE ALFONSE/AUTOMAZIONE PER ADEG. LIM. AZOTO	D	Alfonse	Gestore	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID CONCLUSO	
5	2019RAHA0001	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE DI ALFONSE (PIATTELLI)	D	Alfonse	NON DEFINITO	650.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
6	2019RAHA0002	RINNOVO RETE FOGNARIA V BORSE IN CONCOMITANZA CON RIPRISTINO SEDE STRADALE	F	Alfonse	Gestore	200.000,00 €	85.000,00 €	- €	- €	85.000,00 €	387.764,07 €	- €	- €	387.764,07 €	302.764,07 €	191,382	356	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATE ALL' AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO DELL' INTERVENTO, E' STATO ANTICIPATO DAL COMUNE LO STEP 2 DELLA RIQUALIFICAZIONE E PERTANTO E' STATO NECESSARIO INTERVENIRE ANCHE SU QUESTA PARTE INDEMENTE NON PREVISTA PER IL 2022
7	2017RAHA0001	OTTIMIZZAZIONE SIST.FOG.SU SCOLLO REDNO	F	Bagnacavallo	Gestore	552.000,00 €	148.000,00 €	- €	- €	148.000,00 €	17.622,24 €	- €	- €	17.622,24 €	-	130,377,76	-88	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA. SCOSTAMENTO 2022. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO ALLA NECESSITA' DI APPROFONDIRE ALCUNI ASPETTI REALIZZATIVI RELATIVI ALL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
8	2014RAHA0016	COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DI MASERA	F	Bagnacavallo	TEAM	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID CONCLUSO	
9	2019RAHA0004	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI BAGNACAVALLO	D	Bagnacavallo	NON DEFINITO	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
10	2019RAHA0005	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE VILLANOVA (PIATTELLI)	D	Bagnacavallo	NON DEFINITO	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
11	2019RAHA0006	STUDIO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA FOSSA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DELLA CRITICITA'	F	Bagnacavallo	Gestore	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	3.960,48 €	- €	- €	3.960,48 €	-	11,039,52	-73	
12	2014RAHA0009	Potenziamento Rete Boncellino - Il stralzo	A	Bagnacavallo	Romagna Acque	462.591,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
13	2019RAHA0007	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - BAGNACAVALLO	F	Bagnacavallo	TEAM	1.017.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
14	2019RAHA0008	STUDIO DEL SISTEMA FOGNARIO DI BAGNARA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA RETE E DELLA RICETTIVITA' IDRAULICA (SPECIFICO RIFERIMENTO AL CENTRO STORICO)	F	Bagnara di Romagna	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.884,01 €	- €	- €	1.884,01 €	1.884,01 €	100	100	AVVIATO LO STUDIO CON LA FINALITA' DI INDIVIDUARE EVENTUALI CRITICITA' STRUTTURALI PER LE QUALI VERRANNO SUCCESSIVAMENTE DEFINITE LE COMPETENZE DI REALIZZAZIONE ED GLI INTERVENTI RISOLUTIVI CHE, TRATTANDOSI DI ACQUE METEORICHE, POTREBBERO NON ESSERE DI COMPETENZA DEL GESTORE
15	2019RAHA0009	ADEGUAMENTO DEPURATORI FRAZIONALI BRISIGHELLA	D	Brisighella	CONAMI	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
16	2014RAHA0020	MANUTENZIONE FOGNATURA IN V.EMILIANI	F	Brisighella	Gestore	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID CONCLUSO	
17	2014RAHA0021	ADEGUAMENTO RETE FOGNA V.FRIBILI	F	Brisighella	CONAMI	560.563,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID CONCLUSO	
18	2019RAHA0010	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI VILLA VEZZANO	F	Brisighella	CONAMI	1.005.067,00 €	608.282,00 €	- €	608.282,00 €	- €	180.307,61 €	- €	- €	180.307,61 €	-	427,974,39	-70	INTERVENTO IN ESECUZIONE LAVORI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL PROLUNGARSI DELL' ITER AUTORIZZATIVO PER L' OTTENIMENTO DELL' ORDINANZA DI OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PROVINCIALE INTERESSATA DALLA POSA DELLE TUBAZIONI E ALLA NECESSITA' DI RIPROGETTAZIONE DOVUTA AL DNEGIO DI ATTRAVERSAMENTO FIUME SENIO
19	2019RAHA0013	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	A	Casola Valsenio	CONAMI	152.000,00 €	102.000,00 €	- €	102.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	102.000,00 €	-100	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE IN QUANTO SUFFISCONO CRITICITA' AUTORIZZATIVE CHE BLOCCANO L' AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE. RICHIESTO ANCHE L' INTERVENTO DI ATERSIR. I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL' AA. LE CRITICITA' AUTORIZZATIVE SONO RELATIVE ALLA MANCATA RISPOSTA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI, SI VEDANO RICHIESTA DA PARTE DI HERA PROT. 7712/2018/2018 E PROT. 101965/06/11/2018. SOLLECITO HERA PROT. 049790/20/05/2019 E PROT. 114658/04/12/2019. SI VEDANO NOLTRE COMUNICAZIONI TRASMESSE AD ATERSIR PROT. 0265714/12/03/2020 E PROT. 0041514/29/04/2021
20	2019RAHA0015	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO NELL'ALTA VALLE DEL RIO SINTRIA PER 10 UTENZE	A	Casola Valsenio	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
21	2018RAHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN ACCANTO LAGHI DEL CESTINA - FSC Scheda 25	A	Casola Valsenio	Gestore	657.450,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	1.206,10 €	- €	- €	1.206,10 €	-	98,793,90	-88	INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE. AVVIO LAVORI IL 05/12/2022. LO SCOSTAMENTO 2022 E' CONSEGUENTE ALLA GIA' SEGNALATA NECESSITA' DI ATTUARE MODIFICHE DEI TRACCIATI PROGETTUALI, COME DA RICHIESTE DEGLI ENTI GESTORI STRADE
22	2015RAHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CASOLA VALSENI	F	Casola Valsenio	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID CONCLUSO	
23	2019RAHA0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA DI STOCCAGGIO CASOLA VALSENI	A	Casola Valsenio	CONAMI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID ANNULLATO	
24	2019RAHA0012	RIDIZONO BACINI RIO CESTINA	A	Casola Valsenio	CONAMI	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
25	2019RAHA0014	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO DA CHIESUOLA A MONTE BATTAGLIA NELLA PARTE ALTA DELLE VALLE DEL CESTINA PER 18 - 20 UTENZE	A	Casola Valsenio	Gestore	220.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
26	2015RAHA0004	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	A	Casola Valsenio	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID ANNULLATO	
27	2019RAHA0017	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEGLI SCARICHI DELLO SCOLMATORE V.CANALE	F	Castel Bolognese	CONAMI	2.500.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	100.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA ANCORSA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
28	2019RAHA0016	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CASTELBOLOGNESE	A	Castel Bolognese	CONAMI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID ANNULLATO	
29	2015RAHA0007	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CERVIA	F	Cervia	Gestore	4.900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
30	2014RAHA0031	DEPURATORE CERVIA. AUTOMAZIONE ADEGUAMENTO LIMITI AZOTO	D	Cervia	Gestore	4.100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID CONCLUSO	
31	2014RAHA0041	BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA III LOTTO	F	Cervia	Romagna Acque	881.078,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID CONCLUSO	
32	2015RAHA0006	POTENZIAMENTO RETE IDRICA MILANO MARITTIMA	A	Cervia	Gestore	447.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID CONCLUSO	
33	2019RAHA0018	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CERVIA	A	Cervia	NON DEFINITO	467.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	
34	2014RAHA0040	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	F	Cervia	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	ID ANNULLATO	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Ravenna n.8 del 25 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
35	2014RAHA0029	BONIFICA-RINNOVO GASOMETRO DEP.CERVIA	D	Cervia	Gestore	127.086,00 €	- €	- €	- €	- €	242.236,49 €	- €	- €	242.236,49 €	- 242.236,49 €	-100	ID COMPOSTO INIZIALMENTE DA 2 INTERVENTI. IL PRIMO INTERVENTO RELATIVO ALLA "BONIFICA-RINNOVO GASOMETRO DEPURATORE DI CERVIA" RISULTA CONCLUSO. IL SECONDO INTERVENTO RELATIVO ALL' ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE. DA HERA A RAVENNA HOLDING (NUOVO ID 2022RAHA0016). LO SCOSTAMENTO 2022 E' DOVUTO ALLA ALLE ATTIVITA' CONTABILI DI STRALCIO E GROCCONTI SUL NUOVO ID 2022RAHA0016
36	2014RAHA0036	REALIZZAZIONE IMP SOLLEVAMENTO FOGNARIO TANTLON-CERVIA	F	Cervia	Romagna Acque	138.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
37	2022RAHA0019	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	F	Cervia	Gestore	3.468.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
38	2022RAHA0016	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE	D	Cervia	Ravenna Holding	7.060.916,00 €	227.519,00 €	- €	227.519,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 227.519,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2022 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO. PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO.
39	2017RAHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO CERVIA	F	Cervia	Gestore	508.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	403,95 €	- €	- €	403,95 €	- 49.596,05 €	-99	LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO. IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO.
40	2019RAHA0019	NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE TRATTAMENTO ACQUE	D	Cervia	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
41	2014RAHA0035	COLLETTAMENTO A DEPURATORE DI MONTELETTIO DI CERVIA -IE II STRALCIO	F	Cervia	Romagna Acque	754.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
42	2014RAHA0037	BY-PASS FOGNATURA CERVIA - I LOTTO	F	Cervia	Romagna Acque	643.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
43	2019RAHA0022	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI LAVEZZOLA	F	Conselice	CONAMI	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
44	2022RAHA0017	REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIA CORREGGIO	A	Conselice	Gestore	282.535,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
45	2019RAHA0023	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	F	Conselice	CONAMI	330.000,00 €	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	- €	71.937,50 €	- €	71.937,50 €	- €	- 138.062,50 €	-65	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO NON E' STATO NECESSARIO SPOSTARE LA RETE ESISTENTE DI VIA BELLAGRANDE. IN QUANTO E' STATO ACCERTATO IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA RETE ESISTENTE.
46	2017RAHA0017	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LAVEZZOLA	D	Conselice	CONAMI	1.032.299,00 €	- €	- €	- €	- €	103.273,48 €	- €	103.273,48 €	- €	103.273,48 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
47	2019RAHA0020	NUOVA SEDIMENTAZIONE FINALE E ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONSELICE	D	Conselice	CONAMI	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
48	2019RAHA0021	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI CONSELICE	F	Conselice	CONAMI	650.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
49	2022RAHA0011	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE IN VIA MORO	F	Conselice	CONAMI	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
50	2021RAHA0003	RICOSTRUZIONE E SPOSTAMENTO FOGNARIA NESTA V. BOBIA	F	Conselice	Gestore	100.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	9.228,71 €	- €	- €	9.228,71 €	- 771,29 €	-7	
51	2018RAHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN PVC - FSC Scheda 26	A	Conselice	Gestore	1.465.200,00 €	988.000,00 €	- €	- €	988.000,00 €	820.125,88 €	- €	- €	820.125,88 €	- 167.874,12 €	-16	
52	2014RAHA0043	RICONFIGURAZIONE ALIMENTAZIONE IDRICA LAVEZZOLA	A	Conselice	Gestore	202.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
53	2019RAHA0025	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI COTIGNOLA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	F	Colignola	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
54	2022RAHA0007	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA SCOLO CONSORTILE BRIGNANI MORTO	F	Colignola	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
55	2019RAHA0024	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE COTIGNOLA	A	Colignola	NON DEFINITO	466.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
56	2019RAHA0029	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO FAENZA	F	Faenza	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
57	2015RAHA0010	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE VIA BOARIA	F	Faenza	NON DEFINITO	2.642.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
58	2019RAHA0027	COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BORGHETTO A SERVIZIO DI DEPURAZIONE	D	Faenza	CONAMI	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
59	2015RAHA0011	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	F	Faenza	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
60	2014RAHA0063	COLLETTAMENTO DEPURAZIONE QUART. VAL DALPOZZO VIA BIASOLA	F	Faenza	Romagna Acque	200.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 18.000,00 €	-100	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2022 E' DOVUTO AL FATTO CHE, NON SUFFICIANDO CRITICITA' NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO, SONO ANCORA IN CORSO LE VALUTAZIONI RELATIVE ALL' EFFETTIVA ESIGENZA DELL' INTERVENTO COSI' COME DEFINITO A POI E ALLA SUA RIDEFINIZIONE
61	2014RAHA0055	ESTENSIONE RETE LOC REDA - I LOTTO - HERA	A	Faenza	Gestore	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
62	2019RAHA0026	COLLEGAMENTO E SISTEMA DI POMPAGGIO FAENZA-BRISIGHELLA	A	Faenza	CONAMI	3.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
63	2019RAHA0028	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI FAENZA	D	Faenza	CONAMI	1.356.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIÀ SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
64	2022RAHA0020	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	F	Faenza	Gestore	5.550.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	59.568,19 €	- €	- €	59.568,19 €	- 40.431,81 €	-40	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE COME DA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. SCOSTAMENTO LEGATO UNICAMENTE ALLA RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI.
65	2014RAHA0066	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V. CANTAGALLO-SORBERA	F	Fusignano	Gestore	501.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	16.105,27 €	- €	- €	16.105,27 €	7.105,27 €	78	
66	2014RAHA0080	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SAN BERNARDINO	F	Lugo	Gestore	451.439,00 €	308.000,00 €	- €	- €	308.000,00 €	313.619,31 €	- €	- €	313.619,31 €	5.619,31 €	1	
67	2014RAHA0078	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - I STRALCIO IV. VILLI	F	Lugo	Gestore	218.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
68	2021RAHA0002	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. SOLDRON	F	Lugo	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
69	2014RAHA0077	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - II STRALCIO (S. Martini)	F	Lugo	Gestore	131.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
70	2014RAHA0067	POTENZIAMENTO RETE IDRICA LUGO - VOLTANA	A	Lugo	Gestore	2.250.000,00 €	239.000,00 €	- €	- €	239.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 239.000,00 €	-100	IL LAVORO IN OGGETTO CHE NON SARA' UN MERO POTENZIAMENTO DELLA TUBAZIONE ESISTENTE, MA UN RADDOPPIO DELLA TUBAZIONE CON MAGLIATURE IN GRADO DI INCREMENTARE LA RESILIENZA DI TUTTA LA RETE DELLE FRAZIONI A NORD DI LUGO. INTERCONNETTENDO LE RETI DI ALCUNI COMUNI LIMITROFI, NEL 2022 E' STATA EFFETTUATA LA MODELLAZIONE E NEL 2023 E' PREVISTA LA PROGETTAZIONE. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI URGENZA MA HA FALTA' AUMENTARE LA DELLA RESILIENZA DELLE RETI
71	2014RAHA0086	ADEGUAMENTO RETI DI FOGNATURA AREA VIA MADONNA DELLE STUORE	F	Lugo	Romagna Acque	721.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
72	2017RAHA0004	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA CENNACHARA	F	Lugo	Gestore	173.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Ravenna n.8 del 25 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		Note giustificative		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%			
73	2022RAHA0015	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	F	Lugo	TEAM	160.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-20	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE COME DA PIANIFICAZIONE POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE NON ESSENDO STATA ANCORA SCELTA LA CONVENZIONE CON TEAM NON E' STATO POSSIBILE FATTURARE E RENDICONTARE ALLA SOC. DEGLI ASSET.
74	2014RAHA0071	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LUGO E LINEA DI RACCOLTA	D	Lugo	Gestore	5.060.000,00 €	253.000,00 €	- €	- €	253.000,00 €	241.308,66 €	- €	- €	241.308,66 €	- €	- €	- €	-4	
75	2017RAHA0005	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA PASTORELLA LOCALITA' VOLTANA	F	Lugo	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
76	2022RAHA0006	REVAMPING SISTEMA AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEP LUGO	D	Lugo	Gestore	255.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100	INTERVENTO RIPROGRAMMATO PER EVITARE SOVRAPPORZIONI CON ALTRI INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL DEPURATORE DI LUGO (ID 2015RAHA0014 E 2014RAHA0071)
77	2019RAHA0030	REVAMPING DIGESTORI E GASOMETRO DEPURATORE DI LUGO	D	Lugo	TEAM	4.188.346,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
78	2018RAHA0007	INTERVENTO INTEGRATO VIA LATO DI MEZZO LUGO	F	Lugo	Gestore	90.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	63.619,60 €	- €	- €	63.619,60 €	- €	- €	- €	27	
79	2015RAHA0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 2 DEI DEPURATORE	D	Lugo	Gestore	1.145.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
80	2015RAHA0014	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO	D	Lugo	Romagna Acque	4.760.000,00 €	34.580,00 €	- €	- €	34.580,00 €	494.097,46 €	- €	- €	494.097,46 €	- €	- €	- €	1299	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO CONTABILE DEI COSTI SOSTENUTI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI (AA SOTTOSCRITTO IN DATA 14/10/2022).
81	2019RAHA0031	RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA LUGO	F	Lugo	Gestore	400.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	32.123,13 €	- €	- €	32.123,13 €	- €	- €	- €	-67	QUESTO ID RISULTA DIRETTAMENTE DIPENDENTE DALLI ID 2014RAHA0071. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE OPERE SONO VINCOLATE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PREVISTI PER IL DEPURATORE DI LUGO. AVVIATE NEL 2023.
82	2014RAHA0079	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - I STRALCIO (Balzarani)	F	Lugo	Gestore	361.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
83	2019RAHA0032	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI MASSA LOMBARDA LIMITI LAZOTO	D	Massa Lombarda	CONAMI	1.545.036,00 €	508.589,00 €	- €	- €	508.589,00 €	365.520,61 €	- €	- €	365.520,61 €	- €	- €	- €	-28	SCOSTAMENTO 2022 CONSEGUENTE ALLO SLITTAMENTO DELLE TEMPERATURE DI ESECUZIONE CAUSATE DAI PROBLEMI RICONTRATI CON L'IMPRESA CHE MOSTRA GRAVI PROFILI DI DISORGANIZZAZIONE. ALCUNE LAVORAZIONI CHE SI SONO RESE NEL FATTO TEMPO NECESSARIO VERRANNO AFFIDATE AD UNA DIVERSA IMPRESA
84	2019RAHA0033	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI V.MAMELLI, V.MARZABOTTO, V.MONTEFIORINO E V.MARCHETTISAFFI	F	Massa Lombarda	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	1.188,49 €	- €	- €	- €	1.188,49 €	1.188,49 €	- €	- €	100	AVVIATO LO STUDIO CON LA FINALITA' DI INDIVIDUARE EVENTUALI CRITICITA' STRUTTURALI PER LE QUALI VERRANNO SUCCESSIVAMENTE DEFINITE LE COMPETENZE DI REALIZZAZIONE ED GLI INTERVENTI RISOLUTIVI CHE, TRATTANDOSI DI ACQUE METEORICHE, POTREBBERO NON ESSERE DI COMPETENZA DEL GESTORE.
85	2019RAHA0034	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI MASSA LOMBARDA	F	Massa Lombarda	CONAMI	3.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
86	2014RAHA0090	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA-ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	988.000,00 €	- €	- €	988.000,00 €	1.022.309,71 €	- €	- €	1.022.309,71 €	34.309,71 €	- €	- €	3	
87	2022RAHA0001	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	4.620,36 €	- €	- €	4.620,36 €	25.379,64 €	- €	- €	-84	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI
88	2022RAHA0022	RINV RETI FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 7 - TEAM	F	Opere Pluricomunali	TEAM	- €	74.000,00 €	- €	- €	74.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100	CONTO CUMULATIVO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL'IMPOSSIBILITA' DI FATTURARE GLI INTERVENTI REALIZZATI NEL 2022 PER MANCANZA DELLA CONVENZIONE TRA ATERSIR LA SOCIETA' DEGLI ASSET TEAM S.R.L. E GESTORE DEL SI HERA S.P.A. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI ED IL FINANZIAMENTO DI OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON TEAM. LA CONVENZIONE E' STATA SOTTOSCRITTA IL 13/04/2023 PERTANTO I CONSUNTIVI 2022 SARANNO RENDICONTATI NEL 2023.
89	2014RAHA0102	MANUT. STRA. IMP. DEPURAZIONE - RA-ATO7	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.140.000,00 €	- €	- €	1.140.000,00 €	1.349.782,69 €	- €	- €	1.349.782,69 €	209.782,69 €	- €	- €	18	
90	2014RAHA0091	RINNOVO RETI ACQUA PROGRAMMATO - RA-ATO 7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.745.000,00 €	- €	- €	1.745.000,00 €	1.985.153,89 €	- €	- €	1.985.153,89 €	240.153,89 €	- €	- €	13	CONTO CUMULATIVO. QUESTO ID RICOPIRENDE GLI INTERVENTI FINANZIATI DALL'ID 2022RAHA0009
91	2014RAHA0101	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNENSE - CONAMI	A	Opere Pluricomunali	CONAMI	20.660.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €	17.682,11 €	- €	- €	17.682,11 €	- €	- €	- €	-90	MANCA NOTA
92	2018RAHA0011	CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	255.811,97 €	- €	- €	255.811,97 €	55.811,97 €	- €	- €	27	CONTO CUMULATIVO. ID COLLEGATO AD ID 2018RAHA0012. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO A MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTO SULLE RETI BIANCHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
93	2019RAHA0037	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - RA-ATO 7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	450.000,00 €	- €	- €	- €	3.204,88 €	- €	- €	- €	3.204,88 €	3.204,88 €	- €	- €	100	ID STRALCIATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI PER LE ANNUALITA' 2022-23 E SOSTITUITO DA NUOVO ID CUMULATIVO 2022RAHA0002. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI GIA' AVVIATI NELLE PASSATE ANNUALITA' SU QUESTO ID
94	2022RAHA0028	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RA-ATO 7 - RAVENNA HOLDING	F	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
95	2014RAHA0178	RINNOVO RETI ALLACCI FOG. DA PI - RA-ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	520.000,00 €	- €	- €	520.000,00 €	567.311,41 €	- €	- €	567.311,41 €	47.311,41 €	- €	- €	9	
96	2022RAHA0029	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - RAVENNA HOLDING	D	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
97	2022RAHA0003	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERRATI PENSILI - ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	164.000,00 €	- €	- €	164.000,00 €	19.452,52 €	- €	- €	19.452,52 €	14.547,48 €	- €	- €	-88	CONTO CUMULATIVO CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 7. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SULLI EDIFICI DA ADEGUIARE. NEL 2022 RISULTA IN PROGETTAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA RENSILE DI LAVAZZOLA
98	2022RAHA0005	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.346.000,00 €	- €	- €	1.346.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE I RINNOVI ACQUEDOTTO SONO STATI RENDICONTATI NEGLI ID MICRORINTERVENTI GIA' ESISTENTI (2014RAHA0091 E 2014RAHA0093)
99	2014RAHA0177	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACOG. - RA-ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	235.433,74 €	- €	- €	235.433,74 €	155.433,74 €	- €	- €	194	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
100	2019RAHA0038	NUOVI ALLACCI ESTENSIONI RETI CTO CLIENTE FOGNATURA - ATO 7 RA	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	246.755,86 €	357.673,00 €	- €	110.917,14 €	126.755,86 €	- €	- €	105	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI
101	2019RAHA0013	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICS1 e TIBS1	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	255.147,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
102	2022RAHA0018	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - RAVENNA HOLDING	A	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
103	2022RAHA0021	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - TEAM	A	Opere Pluricomunali	TEAM	- €	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100	CONTO CUMULATIVO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL'IMPOSSIBILITA' DI FATTURARE GLI INTERVENTI REALIZZATI NEL 2022 PER MANCANZA DELLA CONVENZIONE TRA ATERSIR LA SOCIETA' DEGLI ASSET TEAM S.R.L. E GESTORE DEL SI HERA S.P.A. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI ED IL FINANZIAMENTO DI OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON TEAM. LA CONVENZIONE E' STATA SOTTOSCRITTA IL 13/04/2023 PERTANTO I CONSUNTIVI 2022 SARANNO RENDICONTATI NEL 2023.
104	2022RAHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100	CONTO CUMULATIVO CREATO NEL 2022 IN SOSTITUZIONE DELL'ID SPECIFICO 2019RAHA0097. NEL 2022 LE ATTIVITA' SVOLTE SONO STATE RENDICONTATE SULL'ID SPECIFICO 2019RAHA0097
105	2014RAHA0105	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RA-ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	528.000,00 €	- €	- €	528.000,00 €	781.826,40 €	- €	- €	781.826,40 €	253.826,40 €	- €	- €	48	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Ravenna n.8 del 25 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
106	2015RAHA0017	RECUPERO AREE SERBATOI PENSI LI DIMESSI RA-ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.200.000,00	-	-	-	-	6.646,60	-	-	6.646,60	6.646,60	100	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022RAHA0003. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA IMPORTI PIANIFICATI I CONSUNTIVI SONO RIFERITI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO IN CORSO (PENSI DI SANT'AGATA, CASTELBOLOGNESE E SANT'ALBERTO) E NON TRASFERITI SUL NUOVO ID CUMULATIVO (IN QUANTO AVVIATI ANTE CREAZIONE DEL NUOVO ID CUMULATIVO).
107	2015RAHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE - RA-ATO7	D	Opere Pluricomunali	Gestore	-	40.000,00	-	-	40.000,00	75.970,33	-	-	75.970,33	35.970,33	89	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
108	2015RAHA0020	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI - RA-ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	-	110.000,00	-	-	110.000,00	86.201,96	-	-	86.201,96	23.798,04	-21	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTO SUI SISTEMI DI TELECONTROLLO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
109	2022RAHA0014	STUDIO PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI IDRICI DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO AFFERENTE AL POTABILIZZATORE BRUNORI-ATO 7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	100.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' AVVIO TARDIVO DELLO STUDIO. SONO STATE SVOLTE INTANTO LE PRIME ANALISI SUI PROFILI DI INTENSA E TREN CONSUMI. PRODEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO CONSUMI IDRICI TO BE. E' IN CORSO LA GENERAZIONE DELLO SCENARIO CLIMATICO A CURA DI UNIQ.
110	2015RAHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - RA-ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ID CONCLUSO
111	2014RAHA0107	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RA-ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	-	100.000,00	-	-	100.000,00	91.618,65	-	-	91.618,65	8.181,35	-8	
112	2016RAHA0016	Manutenzione impianti aq. industriali	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ID CONCLUSO
113	2022RAHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-100	CONTO CUMULATIVO - SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI INTERVENTO SUGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI
114	2022RAHA0026	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA - ATO7 - RAVENNA HOLDING	A	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
115	2018RAHA0010	Investimenti di struttura	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	-	1.799.721,00	-	-	1.799.721,00	-	-	-	-	1.799.721,00	-100	INVESTIMENTI DI STRUTTURA RENDICONTATI SEPARATEMENTE
116	2014RAHA0029	RINNOVO RETI ALLACCI ACQUA DA PI-RA-ATO 7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	2.040.000,00	-	-	2.040.000,00	3.382.409,64	-	-	3.382.409,64	1.342.409,64	65	CONTO CUMULATIVO. QUESTO ID RICOMPRENDE GLI INTERVENTI FINANZIATI DALL' ID 2022RAHA0005
117	2022RAHA0023	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - TEAM	D	Opere Pluricomunali	TEAM	-	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00	-100	CONTO CUMULATIVO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' IMPOSSIBILITA' DI FATTURARE GLI INTERVENTI REALIZZATI NEL 2022 PER MANCANZA DELLA CONVENZIONE TRA ATERSIR LA SOCIETA' DEGLI ASSET TEAM S.R.L. E GESTORE DEL SII HERA S.P.A. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI ED IL FINANZIAMENTO DI OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON TEAM. LA CONVENZIONE E' STATA SOTTOSCRITTA IL 13/04/2022 PERTANTO I CONSUNTIVI 2022 SARANNO RENDICONTATI NEL 2023.
118	2019RAHA0035	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 7 RA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	1.150.000,00	-	-	1.150.000,00	1.365.514,30	1.325.008,51	-	40.505,79	215.514,30	18	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI
119	2015RAHA0024	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO - RA-ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ID ANNULLATO
120	2018RAHA0017	Rinnovo reti aq. industriali	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ID CONCLUSO
121	2015RAHA0036	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADEALE - ATO 7 RA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADEALE
122	2014RAHA0173	SOST. PTRI CARI CALIBRO - RA - ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	817.911,04	-	-	817.911,04	182.088,96	-18	
123	2014RAHA0092	ADEG. SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO-RA-ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	50.000,00	-	-	50.000,00	97.270,65	-	-	97.270,65	47.270,65	94	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
124	2022RAHA0027	RINN. RETI. FOG. PROGRAMMATO - RA-ATO 7 - RAVENNA HOLDING	F	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
125	2022RAHA0025	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RA-ATO 7 - TEAM	F	Opere Pluricomunali	TEAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
126	2015RAHA0018	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - RA - ATO 7	D	Opere Pluricomunali	Gestore	-	80.000,00	-	-	80.000,00	199.454,60	-	-	199.454,60	119.454,60	149	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
127	2014RAHA0106	RINNOVO RETI FOG. PROGRAMMATO - RA ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	-	501.000,00	-	-	501.000,00	694.989,99	-	-	694.989,99	193.989,99	38	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FOGNARIE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
128	2018RAHA0012	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	-	175.000,00	-	-	175.000,00	61.288,38	-	-	61.288,38	113.711,62	-64	CONTO CUMULATIVO. ID COLLEGATO AD ID 2018RAHA0011. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO A MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
129	2014RAHA0112	RILEVO RETI FOGNARIE - RA - ATO 7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	604.239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ID CONCLUSO
130	2015RAHA0039	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADEALE - ATO 7 RA	F	Opere Pluricomunali	Gestore	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADEALE
131	2022RAHA0024	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA - ATO7 - TEAM	A	Opere Pluricomunali	TEAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
132	2014RAHA0094	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA RA-ATO 7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	500.000,00	-	-	500.000,00	474.350,65	-	-	474.350,65	25.649,35	-5	
133	2019RAHA0042	COGENERAZIONE DEPURATORE DI RAVENNA	D	Ravenna	Romagna Acque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ID ANNULLATO
134	2015RAHA0023	POTENZIAMENTO CENTRALE LIDO DI SAVO	A	Ravenna	Gestore	521.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ID CONCLUSO
135	2019RAHA0054	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	F	Ravenna	Ravenna Holding	427.000,00	376.000,00	-	376.000,00	-	-	-	-	-	376.000,00	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2022 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
136	2014RAHA0148	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI DURAZZANO	F	Ravenna	Ravenna Holding	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ID CONCLUSO
137	2018RAHA0004	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-2° strallo	F	Ravenna	Gestore	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
138	2022RAHA0030	VARIANTE SS 16 RAVENNA - ACQUEDOTTO	A	Ravenna	Gestore	698.130,01	8.000,00	-	-	8.000,00	5.397,17	-	-	5.397,17	2.602,83	-32	
139	2022RAHA0012	S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA - ADEGUAMENTO DA CLASSE AL PORTO DI RAVENNA. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE - ACQUEDOTTO	A	Ravenna	Gestore	750.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	1.151,15	-	-	1.151,15	3.848,85	-76	
140	2019RAHA0057	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTI RETE NERA PENISOLA TRATTAROLI	F	Ravenna	Romagna Acque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ID ANNULLATO
141	2014RAHA0150	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI MASSA CASTELLO	F	Ravenna	Romagna Acque	214.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ID CONCLUSO
142	2019RAHA0047	DARSENSA CITA' 2° STR. PREMENTE VIA ROMEA	F	Ravenna	Romagna Acque	571.000,00	438.020,00	-	438.020,00	-	312.860,06	-	312.860,06	-	125.159,94	-28	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE COMPLESSIVA. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLE DIVERSE TEMPISTICHE DELL' ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE
143	2018RAHA0003	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-1° strallo	F	Ravenna	Gestore	1.237.000,00	728.000,00	-	-	728.000,00	683.738,29	-	-	683.738,29	44.261,71	-6	
144	2014RAHA0118	REALIZZAZIONE ADULT TRICE "CORSO NORD"-2° STRALLO	A	Ravenna	Romagna Acque	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	ID CONCLUSO
145	2018RAHA0014	DEPURATORE RAVENNA- REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE	D	Ravenna	Romagna Acque	25.110.000,00	412.230,00	-	412.230,00	-	-	-	-	-	412.230,00	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Ravenna n.8 del 25 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO				
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative		
146	2019RAHA0056	TOMBAMENTO FOSSO V.CELLA SAN BARTOLO	F	Ravenna	Ravenna Holding	1.127.000,00 €	97.000,00 €	- €	97.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2022 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO. PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
147	2014RAHA0156	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI EDICITO FLUORI	F	Ravenna	Ravenna Holding	243.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
148	2022RAHA0031	VARIANTE SS 16 RAVENNA - FOGNATURA	F	Ravenna	Gestore	1.219.108,46 €	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	6.356,18 €	- €	- €	6.356,18 €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO TECNICAMENTE TERMINATO. SCOSTAMENTO 2022 DI NATURA CONTABILE LEGATO ALLA TEMPORICITA' DI FATTURAZIONE
149	2014RAHA0158	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SNI VIA CHERSO - DARSENÀ	F	Ravenna	Romagna Acque	974.000,00 €	366.075,00 €	- €	366.075,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150	2018RAHA0055	POTENZIAMENTO RETI ACQUE METEORICHE - 1° STRALCIO (collettori-potenziamento Idrovora Sapri)	F	Ravenna	Gestore	4.143.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
151	2014RAHA0134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDROVORA BIDENTE	F	Ravenna	Gestore	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
152	2014RAHA0121	Adeguamento Linea Acque Dep. Marina di Ravenna	D	Ravenna	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
153	2014RAHA0131	COLLEGAMENTO A DEP. BORGO MONTONE	F	Ravenna	Gestore	195.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
154	2019RAHA0041	POTENZIAMENTO CENTRALE IDRICA LIDO ADRIANO	A	Ravenna	Ravenna Holding	853.173,00 €	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO IN FASE DI GARA. LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2022 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO. PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
155	2014RAHA0117	REALIZZAZIONE ADUTTRICE "CORSO NORD" - II STRALCIO	A	Ravenna	NON DEFINITO	595.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLE VALUTAZIONI IN CORSO SULLA MODALITA' DI SUPERAMENTO DELL' INTERFERENZA FERROVIARIA
156	2019RAHA0045	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI RAVENNA	D	Ravenna	Romagna Acque	3.710.000,00 €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELLA
157	2018RAHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN ZONA PORTO S.VITALE ZONA SAPRI	F	Ravenna	Romagna Acque	1.080.000,00 €	- €	- €	- €	94.684,52 €	- €	- €	94.684,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
158	2014RAHA0122	ADEGUAM. DEP. LIDO DI CLASSE - I STRALCIO	D	Ravenna	Gestore	6.058.000,00 €	2.990.000,00 €	- €	- €	2.990.000,00 €	1.896.512,31 €	- €	- €	1.896.512,31 €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO IN FASE DI CANTIERE CHE HANNO COMPORTATO UNO SPOSTAMENTO
159	2017RAHA0111	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	F	Ravenna	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
160	2014RAHA0140	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO RAGONE	F	Ravenna	Gestore	376.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
161	2022RAHA0010	SOLLEVAMENTI PENISOLA TRATTAROLI	F	Ravenna	NON DEFINITO	409.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
162	2019RAHA0055	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO LIDO ADRIANO	F	Ravenna	NON DEFINITO	853.000,00 €	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO RIPRANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MINORI
163	2019RAHA0040	COMPLETAMENTO CONDOTTA RAV.NORD CASALBORSETTI I STR	A	Ravenna	Romagna Acque	2.105.156,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
164	2015RAHA0021	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA DI MADAMA TONEA	A	Ravenna	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
165	2019RAHA0046	FILTRAZIONE E DISINFEZIONE DEPURATORE DI RAVENNA	D	Ravenna	Romagna Acque	4.610.000,00 €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
166	2014RAHA0123	Depuratore Ravenna - Adeguamento Linea Fanghi	D	Ravenna	Gestore	5.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
167	2014RAHA0130	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PONTE RUSCO	F	Ravenna	Gestore	557.000,00 €	- €	- €	- €	9.758,47 €	- €	- €	9.758,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO CONCLUSO. ULTIME NEL 2022 LE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
168	2018RAHA0052	POTENZIAMENTO COLLETTORI PORTO CORSINI-DEPURATORE	F	Ravenna	Gestore	2.432.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
169	2019RAHA0051	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - LIDO DI CLASSE E LIDO DI SAVO	F	Ravenna	NON DEFINITO	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
170	2014RAHA0154	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE BOTTEGA LA GUARNERA	F	Ravenna	Romagna Acque	325.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
171	2014RAHA0144	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE BASTIA RAVENNA	F	Ravenna	Romagna Acque	338.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
172	2017RAHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RAVENNA	F	Ravenna	Gestore	580.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	79.484,36 €	- €	- €	79.484,36 €	- €	- €	- €	- €	LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
173	2014RAHA0147	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI PUCER	F	Ravenna	Romagna Acque	234.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
174	2022RAHA0059	RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO SAPRI-SAPRI I	F	Ravenna	Romagna Acque	215.439,00 €	215.439,00 €	- €	215.439,00 €	- €	193.879,95 €	- €	- €	193.879,95 €	- €	- €	- €	- €	- €
175	2019RAHA0048	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO PORTO CORSINI	F	Ravenna	NON DEFINITO	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
176	2017RAHA0018	REALIZZAZIONE OPERE BACINI I E 2 ED ALTRI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	F	Ravenna	Gestore	6.151.000,00 €	3.045.950,00 €	- €	3.045.950,00 €	- €	1.183.082,73 €	- €	- €	1.183.082,73 €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO IN ESECUZIONE NEL 2022. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL MANCATO INCASSO DEL CONTRIBUTO (RENDICONTAZIONE IN CORSO NEL 2023)
177	2014RAHA0149	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI ERBOSA	F	Ravenna	Ravenna Holding	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
178	2014RAHA0155	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI VIA CABELLAZZO	F	Ravenna	Ravenna Holding	358.620,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
179	2022RAHA0013	S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA - ADEGUAMENTO DA CLASSE AL PORTO DI RAVENNA. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE - FOGNATURA	F	Ravenna	Gestore	750.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	576,08 €	- €	- €	576,08 €	- €	- €	- €	- €	- €
180	2019RAHA0044	DISMISSIONE DEPURATORE MARINA DI RAVENNA E COLLETTAMENTO A RAVENNA	D	Ravenna	NON DEFINITO	3.890.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
181	2019RAHA0050	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PORTO FLUORI - NUOVA RETE	F	Ravenna	NON DEFINITO	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
182	2014RAHA0141	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO GAMBELLARA	F	Ravenna	Gestore	502.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
183	2019RAHA0053	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI LOCALITA' CASALBORSETTI	F	Ravenna	Romagna Acque	160.442,00 €	160.442,00 €	- €	160.442,00 €	- €	143.511,97 €	- €	- €	143.511,97 €	- €	- €	- €	- €	- €
184	2015RAHA0027	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO NORD CITA'	F	Ravenna	NON DEFINITO	21.100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
185	2014RAHA0127	REVAMPING DEPURATORE DI RAVENNA 2°LOTTO (FANGHI E OSSIDAZIONE)	D	Ravenna	Ravenna Holding	1.285.223,00 €	- €	- €	- €	429.708,45 €	- €	- €	429.708,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
186	2014RAHA0124	REVAMPING LINEA ACQUE DEP. RAVENNA	D	Ravenna	Gestore	1.642.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
187	2015RAHA0026	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO BIDENTE	F	Ravenna	NON DEFINITO	6.600.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA



Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Ravenna n.8 del 25 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO			
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative	
188	2014RAHA0151	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE MENSA MATELLICA	F	Ravenna	Romagna Acque	526.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO	
189	2017RAHA0009	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	F	Ravenna	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO	
190	2019RAHA0049	POTENZIAMENTO FOGNATURA AREA PORTUALE- POLOLOGISTICA FINO AL DEPURATORE	F	Ravenna	NON DEFINITO	2.784.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
191	2019RAHA0052	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATO RI DI MARINA RAVENNA	F	Ravenna	NON DEFINITO	2.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
192	2014RAHA0120	COMPL.COND.IDRICA RAY NORD (CASALBORSETTI)	A	Ravenna	Romagna Acque	1.453.006,00 €	125.023,00 €	- €	125.023,00 €	68.946,97 €	- €	68.946,97 €	- €	- €	56.076,03 €	-44	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL MANCATO AVVIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IN CONSEGUENZA DELL'ALLUNGAMENTO DELLE TEMPSTICHE AUTORIZZATIVE.	
193	2019RAHA0043	NUOVO IMPIANTO CADITOIE A DEPURATORE DI RAVENNA	D	Ravenna	Romagna Acque	2.670.000,00 €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA.	
194	2019RAHA0058	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V.MASSARENTI	F	Riolo Terme	CONAMI	520.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
195	2014RAHA0165	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ARTIGIANALE RUSSI-ISTRALCIO	F	Russi	Romagna Acque	593.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO	
196	2014RAHA0167	COLLETTAMENTO ZONA ARTIGIANALE "MONALDINA NORD" - I STRALCIO	F	Russi	Romagna Acque	485.159,00 €	51.208,00 €	- €	51.208,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	51.208,00 €	-100	INTERVENTO TECNICAMENTE TERMINATO. SCOSTAMENTO 2022 DI NATURA CONTABILE LEGATO ALLA TEMPSTICHE DI FATTURAZIONE.	
197	2014RAHA0164	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ARTIGIANALE RUSSI-FUMAZZO II STRALCIO	F	Russi	Romagna Acque	1.020.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO	
198	2019RAHA0060	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 2° STR-FOG	F	Russi	Romagna Acque	438.000,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	293.714,16 €	- €	293.714,16 €	- €	- €	277.714,16 €	1735	AA SOTTOSCRITTO A FINE 2022. AVVIATA ESECUZIONE LAVORI IN ANTICIPO RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI	
199	2017RAHA0014	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RUSSI	F	Russi	Gestore	360.000,00 €	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	66.720,41 €	- €	- €	66.720,41 €	21.720,41 €	48	ID SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO		
200	2019RAHA0061	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATO RI- RUSSI	F	Russi	NON DEFINITO	2.600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
201	2019RAHA0059	COLL ZA "MONALDINA NORD" - 1° STR-ACQ	A	Russi	Gestore	382.000,00 €	49.953,00 €	- €	49.953,00 €	223.033,83 €	- €	- €	223.033,83 €	173.080,83 €	346	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AI MAGGIORI COSTI COMPLESSIVI DELL'OPERA DOVUTI A NECESSITA' DI BONIFICA DI ALLACCIAMENTI NON PREVISTI A PROGETTO IN QUANTO RILEVATI IN CANTIERE IN ELEVATO STATO DI USURA.		
202	2019RAHA0062	ADEGUAMENTO FOGNATURA TRATTO MAZZARI SOLLEVAMENTO VIA GIARDINO	F	Sant'Agata sul Santeramo	CONAMI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO	
203	2021RAHA0001	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MAZZARI SOLLEVAMENTO V.GIARDINO	F	Sant'Agata sul Santeramo	Gestore	241.000,00 €	- €	- €	- €	10.296,14 €	- €	- €	10.296,14 €	10.296,14 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO A CHIUSURA CONTABILE.		
204	2019RAHA0063	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI LARGO AMENDOLA E CORSO GARIBOLDI	F	Sant'Agata sul Santeramo	Gestore	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	3.608,84 €	- €	3.608,84 €	11.391,16 €	-75			
205	2022RAHA0008	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA DA SCLOLO CONSORTILE RIO BARBIANO	F	Solarolo	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
206	2019RAHA0064	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE - II STRALCIO	F	Solarolo	CONAMI	1.179.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
207	2019RAHA0065	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE-ISTRALCIO	F	Solarolo	CONAMI	495.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
208	2017RAHA0016	ESTENSIONE RETE FOGNARIA NUOVA LOTTEZZAZIONE INDUSTRIALE SOLAROLO	F	Solarolo	Gestore	330.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
209	2015RAHA0031	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA SOLAROLO	A	Solarolo	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO	
<b>Totale</b>							<b>29.111.237,00 €</b>	<b>4.315.950,00 €</b>	<b>4.869.407,00 €</b>	<b>19.925.880,00 €</b>	<b>22.523.153,89 €</b>	<b>1.682.681,51 €</b>	<b>2.760.124,85 €</b>	<b>18.080.347,53 €</b>	<b>6.588.083,11 €</b>			
							<b>Importo lordo pianificato 2022</b>	<b>Contributi pianificati 2022</b>	<b>Investimento di terzi pianificato 2022</b>	<b>Investimento gestore pianificato 2022</b>	<b>Importo lordo consuntivo 2022</b>	<b>Contributi consuntivo 2022</b>	<b>Investimento di terzi consuntivo 2022</b>	<b>Investimento gestore consuntivo 2022</b>	<b>Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura</b>			
<b>Importo Totale</b>							29.111.237,00	4.315.950,00	4.869.407,00	19.925.880,00	22.523.153,89	1.682.681,51	2.760.124,85	18.080.347,53	82,5%			
<b>Importo Totale - esclusi investimenti di struttura</b>							27.311.516,00	4.315.950,00	4.869.407,00	18.126.159,00	22.523.153,89	1.682.681,51	2.760.124,85	18.080.347,53				

Legenda: A = acquedotto D = depurazione  
F = fognatura AB = acque bianche TT=luili  
ST=struttura

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore  
F.to Valentina Palli

Il segretario verbalizzante  
F.to Marialuisa Campani

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 29 gennaio 2024
