

**CLRE/2018/3 del 30 novembre 2018.**

**CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. approvazione consuntivo 2017.  
Programma Operativo Interventi 2015 - 2019**

**IL COORDINATORE  
F.to Tania Tellini**

## CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno **2018** il giorno 30 del mese di novembre alle ore 9,00 presso la Sala del Consiglio Provinciale "Palazzo Allende" – Corso Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia -, si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera PG.AT/2018/0007377 del 23/11/2018.

Assume la presidenza la Coordinatrice Tania Tellini che chiama la signora Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA			NO	1,5851
BAGNOLO IN PIANO	Casali Paola	Sindaco	SI'	1,6839
BAISO			NO	0,7471
BIBBIANO	Carletti Andrea	Sindaco	SI'	1,7746
BORETTO			NO	1,0384
BRESCELLO			NO	1,0827
CA DEL BOSCO SOPRA	Tellini Tania	Sindaco	SI'	1,8441
CAMPAGNOLA EMILIA	Santachiara Alessandro	Sindaco	SI'	1,0744
CAMPEGINE	Mori Claudio	Assessore	SI'	1,0150
CANOSSA	Gombi Mara	Assessore	SI'	0,8069
CARPINETI			NO	0,8685
CASALGRANDE	Vaccari Alberto	Sindaco	SI'	3,1321
CASINA	Filippi Ferro Grazia	Assessore	SI'	0,9242
CASTELLARANO	Bartocini Cassandra	Assessore	SI'	2,5376
CASTELNOVO MONTI			NO	1,8554
CASTELNOVO SOTTO	Monica Francesco	Sindaco	SI'	1,5599
CAVRIAGO			NO	1,7328
CORREGGIO	Testi Fabio	Assessore	SI'	4,1013
FABBRICO	Terzi Maurizio	Sindaco	SI'	1,2627
GATTATICO			NO	1,1379

<b>Ente</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Quote</b>
GUALTIERI	Stecco Marcello	Vice Sindaco	SI'	1,2538
GUASTALLA			NO	2,5294
LUZZARA			NO	1,6499
MONTECCHIO EMILIA			NO	1,8115
NOVELLARA	Baracchi Alessandro	Vice Sindaco	SI'	2,3210
POVIGLIO			NO	1,3174
QUATTROCASTELLA	Tagliavini Andrea	Sindaco	SI'	2,2355
REGGIO EMILIA	Mirco Tutino	Assessore	SI'	25,5927
REGGIOLO			NO	1,6575
RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	SI'	1,1682
ROLO			NO	0,8465
RUBIERA	Cavallaro Emanuele	Sindaco	SI'	2,4723
S. MARTINO IN RIO	Fuccio Paolo	Sindaco	SI'	1,4314
S. POLO D'ENZA	Cavatorti Elisa	Assessore	SI'	1,1458
S. ILARIO D'ENZA	Moretti Marcello	Sindaco	SI'	1,9271
SCANDIANO	Mammi Alessio	Sindaco	SI'	4,0962
TOANO	Volpi Vincenzo	Sindaco	SI'	0,9123
VENTASSO	Manari Antonio	Sindaco	SI'	0,9043
VETTO	Ruffini Aronne	Vice Sindaco	SI'	0,5206
VEZZANO SUL CROSTOLO	Leoni Alessandra	Assessore	SI'	0,8741
VIANO	Borghi Nello	Assessore	SI'	0,7430
VILLA MINOZZO	Manicardi Lucia	Assessore	SI'	0,8249
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Tellini Tania	Consigliere	SI'	10,0000

Presenti n. 29 quote 80,14 Assenti n. 14 quote 19,86



Riconosciuta la validità della seduta Tania Tellini, in qualità di Coordinatrice del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. approvazione consuntivo 2017. Programma Operativo Interventi 2015 - 2019**

**Vista** la L.R. n. 23/2011 che ha istituito l'agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8, comma 6, lettera c) della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art. 7, comma 5, lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n.4 del 01 aprile 2016 e n.10 del 19 dicembre 2017 del Consiglio locale di Reggio Emilia è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Iren S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 27 del 19 aprile 2018 del Consiglio d'Ambito sono state approvate le modifiche al Piano degli Interventi del Piano di Ambito del territorio di Reggio Emilia a seguito della deliberazione del Consiglio Locale n. 10 del 19/12/2017;
- con deliberazione n. 51 del 28 giugno 2018 del Consiglio d'Ambito è stato approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IREN S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
  - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;

- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

**dato atto** che:

- il gestore Iren S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata precedentemente inviata ai Comuni interessati;

**rilevato** che dai dati presentati è emerso per l'annualità 2017 che:

- non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con deliberazioni n.4 del 01 aprile 2016 e n.10 del 19 dicembre 2017 del Consiglio Locale di Reggio Emilia, ai sensi della Delibera n° 75 del 12 ottobre 2017;
- non sono stati avviati n.12 interventi per un importo complessivo lordo di € 2.093.000;
- sono stati anticipati/conclusi n.51 interventi previsti in altre annualità per un importo complessivo lordo di € 3.293.630;
- per n.27 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- gli investimenti realizzati risultano essere di importo inferiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l'annualità 2017;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

**ritenuto** pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;



**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Marco Grana Castagnetti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**con voti:** favorevoli n. 28 pari a quote 79,1, astenuti 0, contrari n. 1 (Comune Campegine) pari a quote 1,00, resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 per il gestore Iren S.p.A. per il bacino tariffario di Reggio Emilia come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 3 del 30.11.2018

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. approvazione consuntivo 2017.  
Programma Operativo Interventi 2015 - 2019**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 30 novembre 2018

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

---



**Servizio Idrico Integrato  
Consuntivo investimenti annualità 2017  
Gestore: IREN S.p.A. (RE)**

**19 novembre 2018**



## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Piano Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibere del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.4 del 01 aprile 2016 e n.10 del 19.12.2017, che il gestore IREN S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2017		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 20.780.413	<b>-€ 2.796.061</b>	€ 17.984.352	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 0	<b>€ 364.294</b>	€ 364.294	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 20.780.413	<b>-€ 3.160.355</b>	€ 17.620.058	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IREN S.p.A. abbia effettuato investimenti che si discostano dalla pianificazione approvata e precisamente: rispetto agli investimenti lordi la differenza ammonta a - € 2.796.060, mentre facendo il confronto con gli investimenti netti è di - € 3.160.354 a fronte dei contributi incassati pari a € 364.294.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

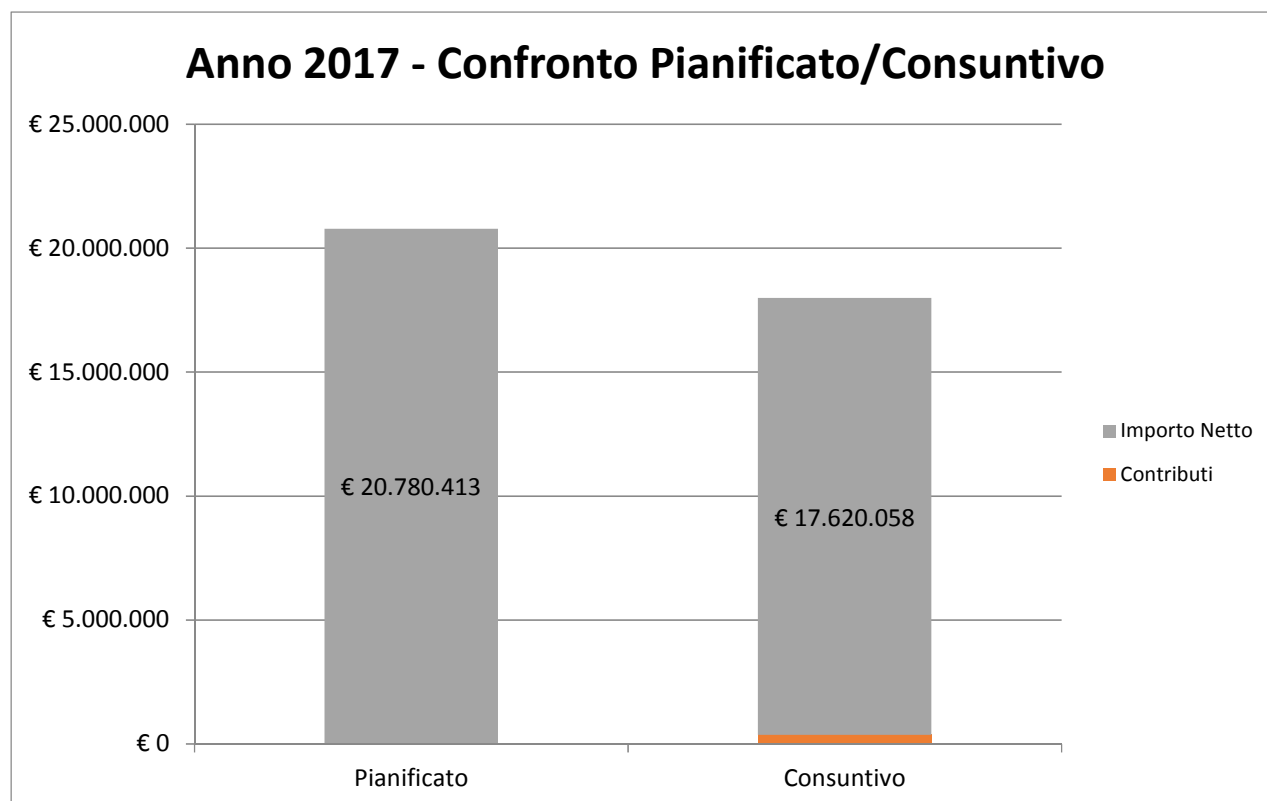


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

## RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2017: 40

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2017: 79

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	12	€ 0	€ 2.093.000	NO	2014REIA0039 2014REIA0061 2014REIA0065 2014REIA0066 2014REIA0071 2014REIA0072 2014REIA0079 2014REIA0080 2014REIA0088 2016REIA0114 2016REIA0139 2017REIA0149	
Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	51	€ 3.293.630	€0	NO	2014REIA0001 2014REIA0004 2014REIA0006 2014REIA0008 2014REIA0012 2014REIA0015 2014REIA0017 2014REIA0018 2014REIA0020 2014REIA0027 2014REIA0028 2014REIA0031 2014REIA0035 2014REIA0038 2014REIA0040 2014REIA0042 2014REIA0043 2014REIA0044 2014REIA0045 2014REIA0046 2014REIA0049 2014REIA0050 2014REIA0051 2014REIA0055 2014REIA0056 2014REIA0057 2014REIA0058 2014REIA0060 2014REIA0063 2014REIA0064 2014REIA0068 2014REIA0070	

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito				NO	2014REIA0076 2014REIA0081 2014REIA0082 2015REIA0097 2015REIA0099 2016REIA0058 2016REIA0070 2016REIA0108 2016REIA0115 2016REIA0119 2016REIA0120 2016REIA0123 2016REIA0126 2016REIA0129 2016REIA0131 2016REIA0133 2016REIA0140 2016REIA0144 2016REIA0145	
Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0					
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	27	€ 14.336.536	€ 18.387.413	NO	2014REIA0007 2014REIA0019 2014REIA0023 2014REIA0025 2014REIA0026 2014REIA0030 2014REIA0032 2014REIA0033 2014REIA0034 2014REIA0037 2014REIA0041 2014REIA0052 2014REIA0083 2014REIA0086 2014REIA0087 2014REIA0091 2014REIA0094 2016REIA0057 2016REIA0107 2016REIA0121 2016REIA0125 2016REIA0127 2016REIA0128 2016REIA0132 2016REIA0134 2016REIA0141 2016REIA0122	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	1	€ 354.186	€ 300.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che il gestore, nel 2017, non ha avviato n.13 interventi che erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella "Allegato 1"), e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva.

Ha avviato anticipatamente oppure chiuso rispetto a quanto programmato n.52 interventi e che n.26 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva. Per n.1 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

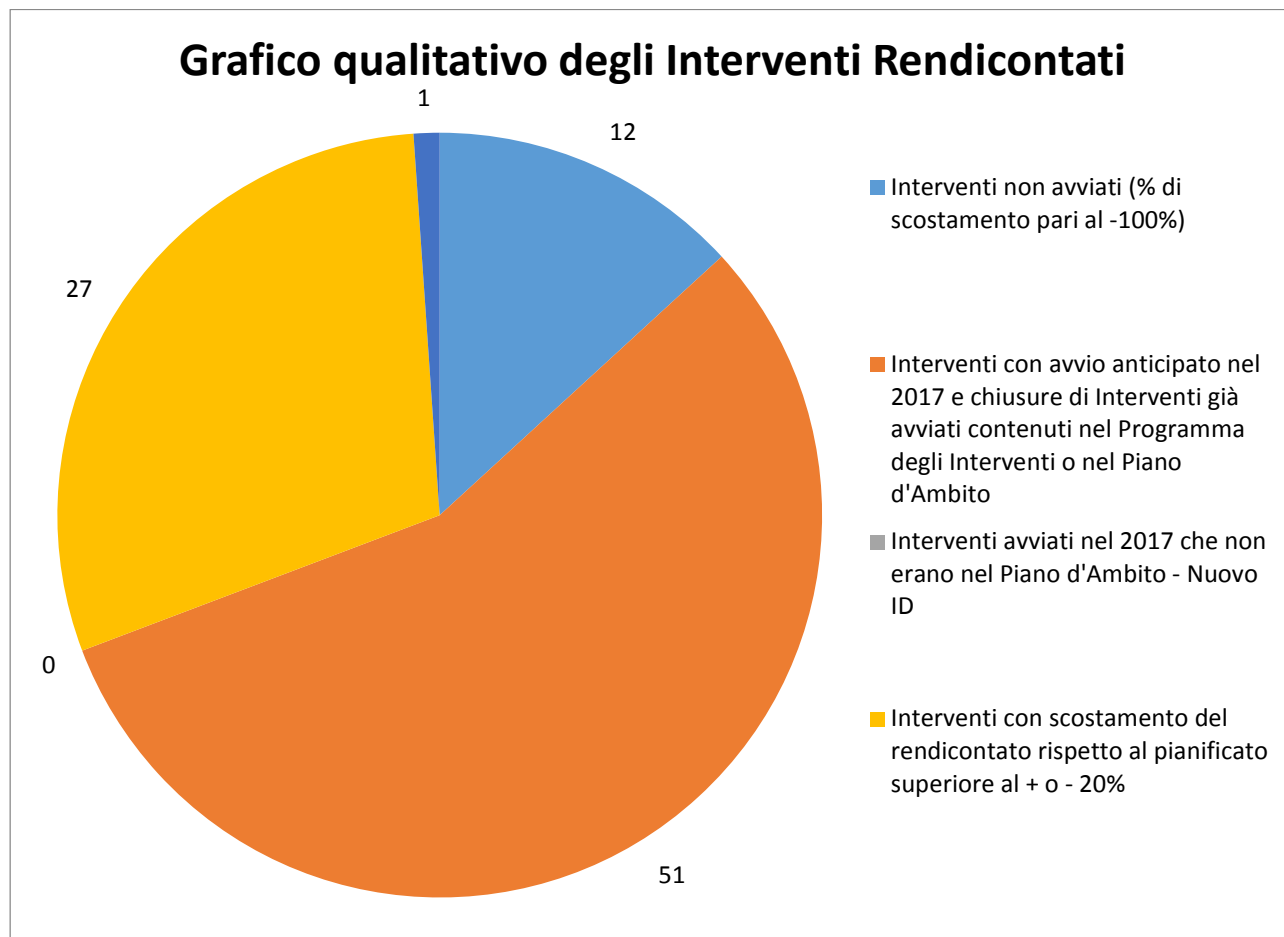


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

Comune	ID ATERSIR	Descrizione intervento	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2017
Gualtieri	2014REIA0039	5.8.Uspf.98 - Potenziamento rete fognaria capoluogo. 1° stralcio	140.000	100.000
Reggio Emilia	2014REIA0061	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento digestori	220.000	170.000
Rio Saliceto	2014REIA0065	5.10.D15.10 - Rio Saliceto: potenziamento impianto 6000 adeguamenti diversi - sedimentatore secondario	150.000	150.000
Rio Saliceto	2014REIA0066	5.8.Uspf.85 - Potenziamento scaricatore di piena fognature del capoluogo.	258.000	200.000
San Martino in Rio	2014REIA0071	5.8.Uspf.125a - Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 1° stralcio	170.000	100.000
San Martino in Rio	2014REIA0072	5.8.Uspf.125b - Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 2° stralcio	130.000	130.000
Viano	2014REIA0079	5.10.D15.29 - Potenziamento impianto 5000 AE N+D+sedimentatore II + ispessimento	900.000	300.000
Viano	2014REIA0080	5.10.D15.9 - Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	243.000	243.000
Opere Pluricomunali	2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fogne nere o miste	369.044	100.000
Casalgrande	2016REIA0114	Risoluzione criticità idraulica collettore di Salvaterra, loc. Villaggio Macina Dinazzano	500.000	450.000
Vezzano sul Crostolo	2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	100.000	100.000
San Polo d'Enza	2017REIA0149	Potenziamento con spostamento dell'impianto di sollevamento fognario in Via G. di Vittorio	50.000	50.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati (percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014REIA0001	5.8.Uspf.90 - Potenziamento fognature Via Chierici e collegamento fognario e adeguamento Rio delle Muratte loc. Borzano	FOGNATURA	Albinea		0 €	0 €	0 €	6.626 €	0 €	6.626 €	100%	Progettazione conclusa, in corso ottenimento autorizzazioni. Si prevede inizio lavori nella primavera 2018
2014REIA0002	5.3.39 - Potenziamento adduttrice DN 600 e DN 400	ACQUEDOTTO	Bagnolo in Piano	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0003	5.3.40 - Potenziamento adduttrice da pensile a DN 600	ACQUEDOTTO	Bagnolo in Piano	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0004	5.8.Uspf.91 - Realizzazione rete in loc. Casale	FOGNATURA	Baiso	150.000 €	0 €	0 €	0 €	7.067 €	0 €	7.067 €	100%	Progettazione in corso. In ritardo rispetto alla pianificazione 2016. Difficoltà di individuare un percorso stabile per la rete fognaria e la fossa Imhoff in zona di dissesto idrogeologico. Ad oggi, a seguito di studio geologico e svariati sopralluoghi con i tecnici della Regione Emilia Romagna, non è stato possibile individuare una zona stabile su cui realizzare la fossa Imhoff
2014REIA0005	5.6.D09.8 - Barco: scaricatore collettore Ciano-Roncocesi	FOGNATURA	Bibbiano	56.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0006	5.10.D15.1 5.10.D15.21 5.8.Uspf.111 - Agglomerato Boretto: potenziamento depuratore a 7500 AE	DEPURAZIONE	Boretto	1.317.024 €	0 €	0 €	0 €	209.484 €	0 €	209.484 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2014REIA0007	5.10.D15.12 5.10.D15.26 - Adeguamento della potenzialità del depuratore capoluogo (completamento 1° linea)	DEPURAZIONE	Brescello	2.151.000 €	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €	1.227 €	0 €	1.227 €	-99%	Progettazione definitiva ultimata. In attesa approvazione variazione di destinazione urbanistica da parte del Comune di Brescello
2014REIA0008	5.10.D15.41 - Potenziamento impianto depurazione	DEPURAZIONE	Cadelbosco di Sopra	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €	42.188 €	0 €	42.188 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, si concluderà nel 2018
2014REIA0009	5.8.Uspf.112 - Estendimento rete fognaria capoluogo 1° stralcio	FOGNATURA	Campagnola	95.228 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0010	5.8.Uspf.113 - Risanamento fognature capoluogo 1° stralcio	FOGNATURA	Campegine	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0011	5.8.Uspf.129 a - Completamento rete fognaria in località Rossena	FOGNATURA	Canossa	47.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0012	5.8.Uspf.129 b - Razionalizzazione e risanamento rete fognaria in località Casetlo di Canossa	FOGNATURA	Canossa	150.000 €	0 €	0 €	0 €	24.246 €	0 €	24.246 €	100%	Cantiere in corso ma in ritardo rispetto alla pianificazione 2016, si prevede la conclusione nel 2018
2014REIA0013	Completamento terza uscita centrale idrica	ACQUEDOTTO	Campegine	157.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0014	5.8.Uspf.114 - Realizzazione collegamento rete fognaria località s.Biagio al depuratore di Cà perizzi 1° stralcio	FOGNATURA	Carpinetti	93.033 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0015	Sistemazione scarico Rio Fontanello	FOGNATURA	Carpinetti	30.000 €	0 €	0 €	0 €	1.115 €	0 €	1.115 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014REIA0016	5.8.Uspf.130 - Realizzazione collegamento rete fognaria località S.Biagio al depuratore di Cà perizzi2° stralcio	FOGNATURA	Carpinetti	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0017	5.10.D15.40 - Adeguamento impianto: nuovo ispessitore	DEPURAZIONE	Casalgrande	250.000 €	0 €	0 €	0 €	20.939 €	0 €	20.939 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017
2014REIA0018	5.8.Uspf.94 - Ristrutturazione rete fognaria capoluogo 3° stralcio	FOGNATURA	Casalgrande	278.527 €	0 €	0 €	0 €	7.604 €	0 €	7.604 €	100%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione
2014REIA0019	Realizzazione di terzo pozzo S.Donnino	ACQUEDOTTO	Casalgrande	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	1.845 €	0 €	1.845 €	-99%	Progettazione conclusa, in corso ottenimento autorizzazioni. Si prevede inizio lavori nella primavera 2018
2014REIA0020	Realizzazione estendimento rete fognaria in località Rovetto	FOGNATURA	Casina	125.000 €	0 €	0 €	0 €	141.244 €	0 €	141.244 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017
2014REIA0021	5.3.36 - M.RE Barazzone 6 km DN 300 (gabellina)	ACQUEDOTTO	Casina	1.020.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0022	5.3.28 - Raddoppio adduttrice 4 km DN 500	ACQUEDOTTO	Castellarano	398.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0023	5.8.Uspf.116 - Realizzazione di Nuova fossa imhoff Montebabbio (100AE)	DEPURAZIONE	Castellarano	150.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	5.224 €	0 €	5.224 €	-89%	Progettazione in corso ma in ritardo rispetto alla pianificazione; acquisita l'area per la realizzazione della fossa Imhoff, in corso ottenimento autorizzazioni
2014REIA0024	5.8.Uspf.78 - Collegamento fognario località Farneto a rete depurata	FOGNATURA	Castellarano	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0025	5.10.D15.23 - Adeguamento impianto di depurazione Rio Dorgola (2° linea acqua trattamento nutrienti ed adeguamento linea fanghi 1° stralcio)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	700.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	5.049 €	0 €	5.049 €	-99%	Progettazione in corso ma in ritardo rispetto alla pianificazione per la complessità di definire gli interventi da realizzare su un impianto in esercizio. E' stata definita la configurazione impiantistica finale, per concludere con la progettazione esecutiva sono attualmente in corso verifiche in loco (saggi) per valutare i collegamenti idraulici tra i vari comparti dell'impianto
2014REIA0026	5.10.D15.5 - Potenziamento Costa de Grassi: 2° linea	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	14.046 €	0 €	14.046 €	-94%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede la realizzazione nel 2018
2014REIA0027	5.10.D15.13 - Potenziamento Impianto Ca' Perizzi - Posa biodischi linea 4	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	200.000 €	0 €	0 €	0 €	39.613 €	0 €	39.613 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017
2014REIA0028	5.10.D15.17 - Castelnovo ne' Monti - Rio Spirola secondario - Realizzazione nitri+filtr.+sist.esistente	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	300.000 €	0 €	0 €	0 €	34.280 €	0 €	34.280 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione
2014REIA0029	5.10.D15.35 - Rio Maillo sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0030	5.10.D15.7 5.10.D15.14 - Meletole: Impianto di depurazione 1° e 2° Linea	DEPURAZIONE	Castelnovo di Sotto	3.110.000 €	1.147.341 €	0 €	1.147.341 €	358.130 €	0 €	358.130 €	-68%	Cantiere in corso, sfasamento degli importi realizzati nelle diverse annualità

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	
2014REIA0031	5.8.Uspf.96 - Estendimento fognario in Via Alberici, Meletole	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	154.710 €	0 €	0 €	0 €	212 €	0 €	212 €	100%	In attesa di concordare con l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio di Bonifica la soluzione progettuale da adottare rispetto alle diverse ipotesi presentate
2014REIA0032	5.8.Uspf.117 - Estendimento fognario Via Peschiera	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	150.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	60.477 €	0 €	60.477 €	-39%	Cantiere in corso, in lieve ritardo rispetto alla pianificazione
2014REIA0033	5.8.Uspf.131 - Risanamento fognature capoluogo con interventi vari via Rivasi, via Marzabotto, via 1° Maggio, via Arduini, via Costituzione, via Spaggiari, via Grandi, Sottopasso Pianella, Via Girondola, via Guerra	FOGNATURA	Cavriago	250.357 €	83.442 €	0 €	83.442 €	30.113 €	0 €	30.113 €	-63%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2014REIA0034	5.10.D15.24 - Cerreto Alpi: 400 AE biosdichi	DEPURAZIONE	Collagna	535.000 €	335.000 €	0 €	335.000 €	4.431 €	0 €	4.431 €	-98%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione tipologia di impianto rispetto al contesto ambientale di pregio
2014REIA0035	PROGR 2009 tab. 2 - Canolo potenziamento impianto depurazione	DEPURAZIONE	Correggio	626.000 €	0 €	0 €	0 €	1.376 €	0 €	1.376 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017
2014REIA0036	5.8.Uspf.96 - Interventi pregressi Dinazzano Lemizzone 1° lotto	FOGNATURA	Correggio	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0037	5.8.Uspf.118 - Risanamento reticolo fognario in via Pozzi e limitrofe	FOGNATURA	Fabbrico	263.258 €	100.000 €	0 €	100.000 €	56.171 €	0 €	56.171 €	-43%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018.
2014REIA0038	5.10.D15.42 - Potenziamento Impianto di depurazione Praticello: nuovo ispessitore	DEPURAZIONE	Gattatico	130.707 €	0 €	0 €	0 €	57.915 €	0 €	57.915 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017
2014REIA0039	5.8.Uspf.98 - Potenziamento rete fognaria capoluogo. 1° stralcio	FOGNATURA	Gualtieri	140.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	A seguito delle verifiche idrauliche effettuate, sono state individuate le priorità di intervento. In corso attività di progettazione
2014REIA0040	5.8.Uspf.80 - Risanamento fognatura scuole	FOGNATURA	Gualtieri	50.000 €	0 €	0 €	0 €	3.810 €	0 €	3.810 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018. Intervento rendicontato non correttamente dal gestore che si impegna ad effettuare la modifica in ARSI al più presto.
2014REIA0041	5.10.D15.19 - Impianto di depurazione Guastalla Nord: nitri-denitri	DEPURAZIONE	Guastalla	300.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	93.405 €	0 €	93.405 €	-62%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2014REIA0042	5.7.D11.3 - Madonna del Ficchetto: risoluzione criticità di deflusso	FOGNATURA	Guastalla	485.566 €	0 €	0 €	0 €	417.678 €	0 €	417.678 €	100%	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in annualità precedenti, si concluderà nel 2018
2014REIA0043	5.8.Uspf.99 - Collegamento fognario loc. San Giacomo alla rete depurata	FOGNATURA	Guastalla	165.000 €	0 €	0 €	0 €	38.326 €	0 €	38.326 €	100%	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in annualità precedenti, si concluderà nel 2018
2014REIA0044	5.8.Uspf.134 - Sistemazione fognature Giarola Campo	FOGNATURA	Ligonchio	137.820 €	0 €	0 €	0 €	10.475 €	0 €	10.475 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti. Cantiere concluso ma manca collaudo statico a completamento della pratica sismica
2014REIA0045	5.3.7 - Nuovo serbatoio Luzzara mc 2000	ACQUEDOTTO	Luzzara	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	372.229 €	0 €	372.229 €	100%	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in annualità precedenti



ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	
2014REIA0046	5.5.D04.8 5.8.Uspf.120 - Casoni: collettamento a rete depurata	FOGNATURA	Luzzara	536.678 €	0 €	0 €	0 €	148.612 €	0 €	148.612 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017
2014REIA0047	Realizzazione di 6° pozzo centale idrica	ACQUEDOTTO	Luzzara	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0049	5.3.8 - Completamento centrale idrica	ACQUEDOTTO	Novellara	300.000 €	0 €	0 €	0 €	1.968 €	0 €	1.968 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, si concluderà nel 2018
2014REIA0050	5.11.1.13 - San Bernardino: nuovo impianto biodischi 450 AE	DEPURAZIONE	Novellara	660.000 €	0 €	0 €	0 €	20.553 €	0 €	20.553 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2014REIA0051	5.7.D11.4 - Potenziamento reticolo fognario in Via Caravaggio (ex via Curie)	FOGNATURA	Novellara	155.000 €	0 €	0 €	0 €	79.737 €	0 €	79.737 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2014REIA0052	5.8.Uspf.81 - Risanamento fognatura Via Nazario Sauro	FOGNATURA	Novellara	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	11.102 €	0 €	11.102 €	-92%	Progettazione in corso.
2014REIA0053	5.8.Uspf.101+ a - Risanamento e potenziamento rete fognaria Capoluogo	FOGNATURA	Poviglio	305.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0054	5.2.25 - Nuovo impianto osmosi Magallana (acq. Quattro Castella)	ACQUEDOTTO	Quattro Castella	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0055	5.8.Uspf.102 - Potenziamento fognario Via Piave	FOGNATURA	Quattro Castella	150.000 €	0 €	0 €	0 €	118.739 €	0 €	118.739 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2014REIA0056	5.8.Uspf.83 5.8.Uspf.121 - Realizzazione collettore fognario in loc. Miscoso	FOGNATURA	Ramiseto	103.644 €	0 €	0 €	0 €	73.465 €	0 €	73.465 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti. Cantiere concluso ma manca collaudo statico a completamento della pratica sismica
2014REIA0057	5.3.38 - Interconnessione acquedotti Reggio-Roncocesi: attraversamento Crostolo	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	350.000 €	0 €	0 €	0 €	2.580 €	0 €	2.580 €	100%	Intervento in ritardo rispetto alla pianificazione 2016. Si prevede l'inizio dei lavori nel corso dell'estate del 2018
2014REIA0058	5.9.D13.1 - Riuso reflui Mancasale - Opere di completamento	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	600.000 €	0 €	0 €	0 €	21.683 €	44.224 €	-22.540 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, si concluderà nel 2018
2014REIA0059	5.8.Uspf.122a - Potenziamento rete fognaria Via Cipriani	FOGNATURA	Reggio Emilia	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0060	5.8.Uspd.103a - Estendimento fognario in Scaruffi	FOGNATURA	Reggio Emilia	500.000 €	0 €	0 €	0 €	10.244 €	0 €	10.244 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017
2014REIA0061	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento digestori	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	220.000 €	170.000 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Intervento in ritardo rispetto alla pianificazione. Da posticipare rispetto ad altri interventi di adeguamento più urgenti da fare sul depuratore di Roncocesi (es. rifacimento impianto di aerazione)
2014REIA0062	Estendimento fognario in via Zannoni	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014REIA0063	U.s.p.f. - Estendimento della rete fognaria in via Beethoven da via Zamenhof a via Sidoli, nella frazione di Massenzatico	FOGNATURA	Reggio Emilia	400.000 €	0 €	0 €	0 €	53.500 €	0 €	53.500 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2014REIA0064	5.8.Uspf.123 + 5.5.D04.7 - Agglomerato Rame Connessione dell'agglomerato al sistema depurato di Reggiolo	FOGNATURA	Reggiolo	1.470.000 €	0 €	0 €	0 €	924 €	0 €	924 €	100%	
2014REIA0065	5.10.D15.10 - Rio Saliceto: potenziamento impianto 6000 adeguamenti diversi - sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Rio Saliceto	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per la difficoltà di reperire dati gestionali complessi da monitorare. Si prevede la realizzazione nel 2018. Ad oggi progettazione esecutiva completata e trasmessa al Comune, in attesa di approvazione
2014REIA0066	5.8.Uspf.85 - Potenziamento scaricatore di piena fognature del capoluogo.	FOGNATURA	Rio Saliceto	258.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Intervento non partito. Da definire con l'amministrazione Comunale e il Consorzio di Bonifica le modalità di intervento. Da pianificare con gli Enti sopracitati le verifiche sugli interventi da attuare: difficoltà di individuazione del tracciato tra proprietà private e strada provinciale.
2014REIA0067	5.7.D11.10 - Potenziamento drenaggio urbano II° lotto	FOGNATURA	Rolo	602.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0068	5.7.D11.2 - Potenziamento drenaggio urbano III° lotto	FOGNATURA	Rolo	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	24.315 €	0 €	24.315 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017
2014REIA0069	5.8.Uspf.124 - Estendimento rete fognaria in Via Bedollo	FOGNATURA	Rolo	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0070	5.8.Uspf.86 5.8.Uspf.138 - Estendimento fognature in via delle Valli, via Togliatti e Completamento lavori TAV	FOGNATURA	Rubiera	235.000 €	0 €	0 €	0 €	42.028 €	0 €	42.028 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017
2014REIA0071	5.8.Uspf.125a - Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 1° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	170.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per la complessità della situazione esistente. Effettuati i rilievi ed individuate le interferenze con sottoservizi e canali di bonifica
2014REIA0072	5.8.Uspf.125b - Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 2° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Intervento non partito. In corso progettazione primo stralcio: intervento conseguente al 2014REIA0071. Differito in attesa del completamento del primo stralcio
2014REIA0073	5.8.Uspf.139 - Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 3° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	182.740 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0074	5.8.Uspf.87 - Costruzione nuovo scolamatore scuole su collettore Ciano Roncoesi e potenziamento fognatura via Riolo.	FOGNATURA	San Polo d'Enza	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0075	5.8.Uspf.141 - Collettore fognario in loc. Rampa d'Enza	FOGNATURA	Sant'Ilario d'Enza	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	
2014REIA0076	5.8.Uspf.105 - Estendimento fognario in loc. Chiozza	FOGNATURA	Scandiano	320.000 €	0 €	0 €	0 €	270.115 €	0 €	270.115 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2014REIA0077	Uspf - pregressi 5.8.Uspf.9 - Sistemazione fognature Arceto 2° e 3° lotto	FOGNATURA	Scandiano	380.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0078	5.8.Uspf.107 5.8.Uspf.127 - Risanamento fognature in loc. Sedrio	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo	108.248 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0079	5.10.D15.29 - Potenziamento impianto 5000 AE N+D+sedimentatore II + ispessimento	DEPURAZIONE	Viano	900.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Progettazione non partita per difficoltà di individuazione priorità e modalità di intervento su impianto in esercizio. Per procedere con la progettazione sono necessari dati gestionali di funzionamento complessi da monitorare. Differito perché si è data priorità ad altri interventi ritenuti più urgenti su altri impianti in peggiori condizioni di funzionamento
2014REIA0080	5.10.D15.9 - Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	DEPURAZIONE	Viano	243.000 €	243.000 €	0 €	243.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Progettazione non partita per difficoltà di individuazione priorità e modalità di intervento su impianto in esercizio. Per procedere con la progettazione sono necessari dati gestionali di funzionamento complessi da monitorare. Differito perché si è data priorità ad altri interventi ritenuti più urgenti su altri impianti in peggiori condizioni di funzionamento
2014REIA0081	5.8.Uspf.108 - Realizzazione collettore fognario in loc. Predale	FOGNATURA	Viano	181.829 €	0 €	0 €	0 €	10.433 €	0 €	10.433 €	100%	Intervento in ritardo rispetto alla pianificazione 2016. Si prevede l'inizio dei lavori nel corso dell'estate del 2018
2014REIA0082	Costruzione di depuratore al servizio della frazione di Gazzano	DEPURAZIONE	Villaminazzo	370.000 €	0 €	0 €	0 €	10.768 €	0 €	10.768 €	100%	Progettazione conclusa, in corso ottenimento autorizzazioni. Si prevede inizio lavori nella primavera 2018
2014REIA0083	Costruzione reti di collettamento e depuratore al servizio della frazione di Carniana	FOGNATURA	Villaminazzo	700.000 €	660.000 €	0 €	660.000 €	2.345 €	0 €	2.345 €	-99%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione di un percorso stabile in zona di rischio idrogeologico: sono stati ipotizzati 2 tracciati alternativi che comunque attraversano frane attive. Ricontrate inoltre difficoltà nell'ottenimento delle servitù di passaggio e nell'acquisizione dell'area per il depuratore
2014REIA0084	5.4.16 - Nuovi impianti di depurazione/potenziamento impianti esistenti	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0085	5.4.7 - Adeguamento depuratori al D.gls 152/06 e delibere regionali - Trattamenti appropriati	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0086	5.4.8 - Piano fognario	FOGNATURA	Opere pluricomunali	4.490.451 €	940.270 €	0 €	940.270 €	129.298 €	0 €	129.298 €	-86%	Disponibilità prevista per interventi da pianificare con le Amministrazioni Comunali. Qui rendicontate le spese di "Realizzazione collettore fognario in Via Le Rosse", Comune di San Polo d'Enza
2014REIA0087	5.2.25 - Estendimenti acqua in zone non servite. Studio zone contaminate da arsenico Comuni di Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	524.860 €	200.000 €	0 €	200.000 €	2.177 €	0 €	2.177 €	-98%	Disponibilità prevista per estendimenti di rete su richieste di privati soggette a cofinanziamento. Nel corso del 2017 non sono pervenute richieste

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	
2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fogne nere o miste	FOGNATURA	Opere pluricomunali	369.044 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Disponibilità prevista per estendimenti di rete su richieste di privati soggette a cofinanziamento. Nel corso del 2017 non sono pervenute richieste
2014REIA0089	5.4.8 - Adeguamento e nuova costruzione di collettori fognari verso gli impianti di trattamento o collettori esistenti	FOGNATURA	Opere pluricomunali		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0090	Distributori di acqua pubblica	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	198.856 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0091	5.2.2. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. - 5.2.9. - 5.2.9. - 5.2.11. - 5.2.12. - 5.2.13 - Manutenzioni straordinarie acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	34.320.631 €	5.500.000 €	0 €	5.500.000 €	6.958.110 €	0 €	6.958.110 €	26%	La nota siccità che nell'estate 2017 ha coinvolto il territorio Emiliano ha avuto impatti anche sugli investimenti effettuati in territorio reggiano non tanto per la difficoltà di approvvigionamento da fonti ma per la numerosità delle rotture di reti e derivazioni d'utenza. Anche l'attività straordinaria sulla manutenzione/realizzazione distretti di rete, modifica degli stessi per renderli più funzionali ai fini di una rapida ricerca perdite idriche ha determinato necessità di investimento non previste.
2014REIA0092	5.2.19 - Interconnessioni acquedotti e nuove opere adduttrici (tab. 5.3)	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0093	5.2.20 - Nuovi serbatoi di stoccaggio	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014REIA0094	5.4.1. - 5.4.2. - 5.4.3. - 5.4.4. - 5.4.5 - Manutenzioni straordinarie fog/dep	FOGNATURA	Opere pluricomunali	20.764.703 €	3.500.000 €	0 €	3.500.000 €	5.673.451 €	0 €	5.673.451 €	62%	<u>FOGNATURE</u> : Maggiori necessità d'interventi di manutenzione straordinaria per: maggior numero d' interventi a seguito di rotture causate da molti fenomeni temporaleschi di forte intensità; maggiori sostituzioni di reti ammalorate in concomitanza di lavori di riqualificazione strade/piazze da parte delle Amministrazioni comunali. <u>DEPURAZIONE</u> : maggior n. di interventi di manutenzione straordinaria dovuti a guasti e rotture su macchine e apparecchiature significative. Mancasale: coclee sollevamento e caricamento fanghi (400.000 €). Roncoesi: comparto di filtrazione (130.000 €). Sono inoltre stati implementati sistemi di controllo avanzato dei comparti biologici su alcuni impianti di depurazione allo scopo di aumentare le performance sull'abbattimento di azoto e fosforo.
2014REIA0095	5.2.1 - Cartografia numerica acqua/fognature	TUTTI	Opere pluricomunali	1.588.814 €	300.000 €	0 €	300.000 €	354.186 €	0 €	354.186 €	18%	
2015REIA0096	Potenziamento impianto idr. linee TAV Autostrada A1-Sesso-RE	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2015REIA0097	Serbatoio di Novellara - 1° Stralcio completamento	ACQUEDOTTO	Novellara		0 €	0 €	0 €	8.408 €	0 €	8.408 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, si concluderà nel 2018

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2015REIA0098	Risoluzione probl.fognari Cavo Linarola-Novellara	FOGNATURA	Novellara		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2015REIA0099	Potenziamento collettore fognario via Fratelli Cervi	FOGNATURA	Montecchio	160.000 €	0 €	0 €	0 €	5.419 €	0 €	5.419 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, si concluderà nel 2018
2015REIA0100	EX 1601786-Montecchio collettore acque nere	FOGNATURA	Montecchio		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2015REIA0101	EX V1602274- Sezione trattamento impianto depurazione RONCOCESI	DEPURAZIONE	Reggio Emilia		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2015REIA0102	Collettore fognario in pressione Noceto di Gattatico	FOGNATURA	Gattatico		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2015REIA0103	Risanamento fognario NASSETA/ACQUABONA	FOGNATURA	Collagna		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0057	Interconnessione acquedotti Reggio-Roncocesi: realizzazione condotta DN 800	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	2.850.000 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	4.038 €	0 €	4.038 €	-99%	In corso procedura espropriativa
2016REIA0058	Riuso reflui Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	2.540.000 €	0 €	0 €	0 €	30.530 €	0 €	30.530 €	100%	Coda di intervento realizzato in annualità precedenti, concluso. In attesa contributo da RER
2016REIA0070	Rifacimento fognatura per acque nere in Via Luxemburg (ex via delle Valli, via Togliatti )	FOGNATURA	Rubiera	70.000 €	0 €	0 €	0 €	51.380 €	0 €	51.380 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2016REIA0105	Estendimento rete fognaria in loc. Pieve Rossa, strada Provinciale Nord	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	130.166 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0106	Criticità deflusso porzione urbana defluente sulla Fossetta II° lotto	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0107	Ristrutturazione rete fognaria in Via Don P. Borghi e limitrofe	FOGNATURA	Bibbiano	141.360 €	141.360 €	0 €	141.360 €	71.070 €	0 €	71.070 €	-49%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2016REIA0108	Razionalizzazione sistema fognario in Via Marchesi	FOGNATURA	Boretto	120.144 €	0 €	0 €	0 €	1.156 €	0 €	1.156 €	100%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pinificazione. Si prevede l'esecuzione dei lavori nel 2018. Il ritardo è stato causato principalmente dalle difficoltà riscontrate nel rilevare la situazione di fatto esistente costituita da vecchi tratti di rete ed allacci di aziende in una zona industriale con diverse commistioni con il sistema di scolo. Ad oggi la progettazione è conclusa ed approvata dal Comune e i lavori sono stati affidati all'impresa esecutrice.
2016REIA0109	Agglomerato Busana: potenziamento impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Busana	325.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0110	Razionalizzazione sistema fognario in Via Zurco, Via Gabella, Via Torquato Tasso	FOGNATURA	Cadelbosco di Sopra	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2016REIA0111	Nuova vasca di stoccaggio Caprara (2000 mc)	ACQUEDOTTO	Campegine	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0112	Potenziamento collettore Caprara-Meletole 1°lotto	FOGNATURA	Campegine	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0113	Depuratore di Valestra: realizzazione 2ª linea	DEPURAZIONE	Carpineti	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0114	Risoluzione criticità idraulica collettore di Salvaterra, loc. Villaggio Macina Dinazzano	FOGNATURA	Casalgrande	500.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione di un percorso attraverso proprietà private in una zona industriale esistente
2016REIA0115	Acquedotto di Salvaterra: potenziamento adduttrice tratto terminale DN 200	ACQUEDOTTO	Casalgrande	180.000 €	0 €	0 €	0 €	1.168 €	0 €	1.168 €	100%	Anticipate spese di progettazione per intervento pianificato nel 2018
2016REIA0116	Agglomerato Salvaterra: adeguamento potenzialità impianto a 27.000 - Realizzazione 4° sedimentatore e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale	DEPURAZIONE	Casalgrande	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0117	Potenziamento impianto di depurazione Casina 2	DEPURAZIONE	Casina	325.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0118	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Casina	FOGNATURA	Casina	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0119	Sostituzione adduttrice Via Manganello	ACQUEDOTTO	Castellarano	200.000 €	0 €	0 €	0 €	136.191 €	0 €	136.191 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017
2016REIA0120	Rifacimento collettore fognario in Via De Gasperi, Via Fontanesi e Via Risorgimento in loc. Felina	FOGNATURA	Castelnovo Monti	165.000 €	0 €	0 €	0 €	52.798 €	0 €	52.798 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2016REIA0121	Acquedotto Gabellina: adeguamento scarico acque controlavaggio Collagna	ACQUEDOTTO	Collagna	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	115.967 €	0 €	115.967 €	-42%	Cantiere in corso, in lieve ritardo rispetto alla pianificazione, si concluderà nel 2018
2016REIA0122	Potenziamento reticolo fognario in Via del Falegname	FOGNATURA	Correggio	500.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	23.164 €	0 €	23.164 €	-90%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede la realizzazione nel 2018. Il ritardo è stato causato dalla complessità dell'intervento che prevede la realizzazione di una rete fognaria a gravità, uno scolmatore e reattivo manufatto di scarico in canale di bonifica e condotta in pressione che attraversa diverse proprietà private. Progettazione esecutiva completata ed autorizzata dal Comune, affidati i lavori all'impresa: ad oggi in corso le attività di accantieramento
2016REIA0123	Estendimento fognario in Via Ville loc. San Girolamo 1° lotto	FOGNATURA	Guastalla	105.000 €	0 €	0 €	0 €	196.079 €	0 €	196.079 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, concluso nel 2017
2016REIA0124	Tagliata: realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento	FOGNATURA	Guastalla	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	
2016REIA0125	Razionalizzazione sistema fognario in strada Barilla e limitrofe	FOGNATURA	Montecchio	150.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	137.372 €	0 €	137.372 €	37%	Cantiere in corso con slittamento temporale rispetto al pianificato, sfioramento dell'importo sulla singola annualità ma non sull'importo totale.
2016REIA0126	Sostituzione adduttrice Novellara-Bettolino	ACQUEDOTTO	Novellara	600.000 €	0 €	0 €	0 €	6.900 €	0 €	6.900 €	100%	Anticipate spee di progettazione per intervento pianificato nel 2019
2016REIA0127	Eliminazione criticità di drenaggio area nord-est: Area Ex-Reggiane	FOGNATURA	Reggio Emilia	500.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €	213.867 €	0 €	213.867 €	-28%	Cantiere in corso con avanzamento in lieve ritardo rispetto al pianificato, dovuto alla concomitanza con opere da realizzarsi da parte del Comune di Reggio Emilia
2016REIA0128	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento impiantistica	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	300.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	8.428 €	0 €	8.428 €	-96%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede la realizzazione nel 2018
2016REIA0129	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	300.000 €	0 €	0 €	0 €	19.452 €	0 €	19.452 €	100%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede la realizzazione nel 2018
2016REIA0130	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	640.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0131	Ristrutturazione collettore fognario in Via Lungocrostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	200.000 €	0 €	0 €	0 €	298.267 €	0 €	298.267 €	100%	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti, si concluderà nel 2018
2016REIA0132	Potenziamento collettore Villaggio Crostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	7.050 €	0 €	7.050 €	-91%	Progettazione esecutiva completata, in corso l'inoltro delle richieste di autorizzazione ad Autostrada A1 e TAV
2016REIA0133	Risoluzione criticità idraulica rete fognaria in loc. Pieve, Parco Buda	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000 €	0 €	0 €	0 €	12.732 €	0 €	12.732 €	100%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede la realizzazione nel 2018
2016REIA0134	Nuovo serbatoio Rubiera mc 2000	ACQUEDOTTO	Rubiera	1.408.465 €	500.000 €	0 €	500.000 €	29.520 €	0 €	29.520 €	-94%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione
2016REIA0135	Depuratore di Rubiera: sistemazione e potenziamento linea fanghi	DEPURAZIONE	Rubiera	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0136	Depuratore di San Martino: potenziamento linea fanghi e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	San Martino in Rio	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0137	Rifacimento collettore di Arceto a monte dello scolmatore	FOGNATURA	Scandiano	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0138	Depuratore di Bosco: sistema di aerazione seconda linea	DEPURAZIONE	Scandiano	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Intervento non partito, da definire con L'amministrazione comunale le modalità di intervento: parte dei lavori deve essere realizzato da privati
2016REIA0140	Trattamenti Appropriati agglomerato <200 AE: realizzazione fossa imhoff a servizio della frazione di Pineto	DEPURAZIONE	Vetto d'enza	250.000 €	0 €	0 €	0 €	74.048 €	0 €	74.048 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm$ 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2016REIA0141	Sostituzione reti idriche da serb. Faggiola a serb. M.Te Cerlino. 1° e 2° stralcio	FOGNATURA	Viano	450.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	319.459 €	0 €	319.459 €	27%	Cantiere in corso con sfasamento temporale rispetto al pianificato. Sforamento sulla singola annualità ma non sul totale dell'intervento
2016REIA0142	Trattamenti Appropriati: realizzazione depuratore a servizio della frazione di Sologno	DEPURAZIONE	Villaminazzo	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0143	Sistemazione rete fognaria in loc. Razzolo	FOGNATURA	Villaminazzo	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0144	Completamento rete fognaria in loc. Minozzo	FOGNATURA	Villaminazzo	30.000 €	0 €	0 €	0 €	1.719 €	0 €	1.719 €	100%	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Si concluderà nel 2018
2016REIA0145	Estendimento reti a carico di privati	TUTTI	Opere pluricomunali		0 €	0 €	0 €	71.294 €	84.276 €	-12.983 €	100%	Rendicontazione a consuntivo di interventi vari richiesti e finanziati al 100% da privati
2016REIA0146	Contributi - Coll.soll.pretratt. Imhoff dep. LUZZARA (2014REIA0085)	DEPURAZIONE	Luzzara		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0147	Contributi - Risanamento Cavo Ariolo RE (2014REIA0094)	DEPURAZIONE	Reggio Emilia		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016REIA0148	Contributi - Raccolta acque nere via Tassoni RE (5.4.17)	FOGNATURA	Reggio Emilia		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0149	Potenziamento con spostamento dell'impianto di sollevamento fognario in Via G. di Vittorio	FOGNATURA	San Polo d'Enza	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Progettazione in corso, difficoltà di ottenimento di servitù di passaggio in terreni privati
2017REIA0150	Rifacimento collettore fognario in Via Colletta, villaggio artigianale Crostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0151	Realizzazione collettore fognario a servizio zona industriale "Dugara"	FOGNATURA	Brescello	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0152	Realizzazione collettore fognario acque nere in loc. Mapriana	FOGNATURA	Castelnovo Monti	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0153	Razionalizzazione sistema fognario in Via Bologna	FOGNATURA	Guastalla	145.179 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0154	Estendimento rete acqua a servizio frazione di Fontana (utenze ex - AIMAG)	ACQUEDOTTO	Rubiera	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0155	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Baiso	FOGNATURA	Baiso	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0156	Realizzazione collettore fognario zona industriale APEA	FOGNATURA	Boretto	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0157	Acquedotto di Caprara:nuova adduttrice DN 300 da Autostrada A1 a Via Marconi	ACQUEDOTTO	Campegine	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0158	Realizzazione nuovo collettore fognario in Via De Amicis	FOGNATURA	Fabbrico	340.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	



ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2017REIA0159	Rifacimento fognature in concomitanza riqualificazione asse viario Corso Garibaldi-Viale Uberto I°	FOGNATURA	Reggio Emilia	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0160	Realizzazione collettore fognario e impianto di sollevamento area Protezione Civile	FOGNATURA	Sant'Ilario d'Enza	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0161	Sostituzione rete idrica in Via della Canalina 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0162	Sostituzione rete idrica in Via Venturi	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0163	Realizzazione collegamento fognario per la dismissione Imhoff Cimitero	FOGNATURA	Ventasso	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0164	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Cereggio	DEPURAZIONE	Ventasso	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0165	Potenziamento impianto di depurazione di Canolo a 3.000 AE	DEPURAZIONE	Correggio	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0166	Sostituzione rete idrica in Strada Macchione	ACQUEDOTTO	Novellara	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0167	Razionalizzazione sistema fognario in loc. Fellegara	FOGNATURA	Scandiano	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2017REIA0168	Realizzazione reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	770.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2018REIA0169	ALLUVIONE LENTIGIONE - BRESCELLO 11/12/2017 - RIPRISTINO DANNI DEPURATORE	DEPURAZIONE	Brescello	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2018REIA0170	ALLUVIONE LENTIGIONE - BRESCELLO 11/12/2017 - RIPRISTINO DANNI RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Brescello	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2018REIA0171	"Contributi Progetto sperimentale Smart meter - comune Reggio di Emilia (rif. 2014REIA0091)"	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia		0 €	0 €	0 €	0 €	44.281 €	-44.281 €	0%	
2018REIA0172	"Contributi Progetto Smart meter - comune di Scandiano (rif 2014REIA0091)"	ACQUEDOTTO	Scandiano		0 €	0 €	0 €	0 €	14.299 €	-14.299 €	0%	
2018REIA0173	"Contributi Realizzazione collettore fognario e sistemazione scarico nel Rio Moreno in Comune di Quattro Castella"	FOGNATURA	Quattro Castella		0 €	0 €	0 €	0 €	177.214 €	-177.214 €	0%	
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>				<b>118.180.542 €</b>	<b>20.780.413 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20.780.413 €</b>	<b>17.984.352 €</b>	<b>364.294 €</b>	<b>17.620.058 €</b>		



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia  
F.to Tania Tellini

Il segretario verbalizzante  
F.to Fausta Pizzaghi

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 2 gennaio 2019
