

CLPR/2024/06 del 28 marzo 2024

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2024-2029. Approvazione.**

IL COORDINATORE
F.to Gianluca Borghi

CLPR/2024/06

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2024** il giorno **28** del mese di **marzo** alle ore **11:00** si è riunito il Consiglio Locale di Parma, convocato con lettera Prot. 18/03/2024.0002990.U, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Gianluca Borghi. Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI PARMA				10
ALBARETO	Davide Riccoboni	Sindaco	Sì	0,5758
BARDI				0,5692
BEDONIA	Gianpaolo Serpagli	Sindaco	Sì	0,7699
BERCETO				0,5593
BORE				0,3246
BORGO VAL DI TARO				1,4068
BUSSETO				1,4245
CALESTANO				0,5742
COLLECCHIO	Roberto Dellavalle	Assessore, delegato	Sì	2,8389
COLORNO				1,8179
COMPIANO	Francesco Mariani	Sindaco	Sì	0,3942
CORNIGLIO	Giuseppe Del Sante	Sindaco	Sì	0,5175
FELINO				1,8579
FIDENZA	Franco Amigoni	Assessore, delegato	Sì	5,0655
FONTANELLATO	Corrado Modernelli	Consigliere, delegato	Sì	1,4639
FONTEVIVO				1,2124
FORNOVO DI TARO	Michela Zanetti	Sindaco	Sì	1,263
LANGHIRANO				2,1329
LESIGNANO DE' BAGNI				1,1117
MEDESANO				2,1257
MONCHIO DELLE CORTI				0,3557
MONTECHIARUGOLO				2,2112
NEVIANO DEGLI ARDUINI				0,8188
NOCETO				2,5636
PALANZANO	Ermes Boraschi	Sindaco	Sì	0,3939

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PARMA	Gianluca Borghi	Assessore, delegato	Sì	35,599
PELLEGRINO PAR.SE	Enrico Ferraroni	Consigliere, delegato	Sì	0,377
POLESINE - ZIBELLO				0,7607
ROCCABIANCA				0,7224
SALA BAGANZA	Norberto Vignali	Assessore, delegato	Sì	1,2519
SALSOMAGGIORE TERME	Michela Bonini	Assessore, delegato	Sì	3,7795
S. SECONDO PAR.SE	Francesco Ilardo	Vicesindaco, delegato	Sì	1,247
SISSA TRECASALI	Sara Tonini	Assessore, delegato	Sì	1,6113
SOLIGNANO	Thomas Villani	Assessore, delegato	Sì	0,5112
SORAGNA				1,0636
SORBOLO MEZZANI				2,4909
TERENZO				0,4124
TIZZANO VAL PARMA				0,5857
TORNOLO				0,3665
TORRILE				1,5884
TRAVERSETOLO				1,9056
VALMOZZOLA				0,2996
VARANO DE' MELEGARI				0,67
VARSI	Angelo Peracchi	Sindaco	Sì	0,4083

Presenti n. 17 quote 58,0679

Assenti n. 28 quote 41,9321

Riconosciuta la validità della seduta Gianluca Borghi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo Interventi 2024-2029 – Approvazione.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.5 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore Emiliambiente S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito;
- con deliberazione n.41 del Consiglio d’Ambito 28 settembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino tariffario di Parma, gestito da Emiliambiente S.p.A.;
- con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d’Ambito è stato approvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito del bacino territoriale di Parma;
- con Deliberazione n. 13 del 3 maggio 2022 del Consiglio Locale di Parma è stata approvata la revisione straordinaria del Programma Operativo degli Interventi delle annualità 2020-2023 per le annualità 2022 e 2023;
- con deliberazione n. 64/2022, integrata dalla C.A.M.B. 84/2022, il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e l’aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed integrazioni alla deliberazione C.A.M.B. 75/2017”;

dato atto che:

- il gestore Emiliambiente s.p.a. ha trasmesso la sua proposta di programma degli interventi del servizio idrico integrato relativa agli anni 2024-2027;
- la struttura tecnica di ATERSIR ha effettuato un’analisi della proposta di Programma degli interventi 2024-2027 presentata e l’ha inviata alle Amministrazioni comunali interessate chiedendo di fornire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento;

- conseguentemente all'invio da parte di ATERSIR della proposta di Programma degli interventi 2024-2027 non sono pervenute osservazioni dalle amministrazioni comunali;
- con la Delibera di ARERA del 28/12/2023 639/2023/R/idr, il periodo regolatorio 2024-2027 è stato esteso anche le annate 2028 e 2029;
- ATERSIR ha quindi chiesto ai gestori di integrare agli anni 2028 e 2029 le proposte di POI;
- con nota PG.AT/2024/0000591 del 25/01/2024 è stato trasmesso dal gestore il programma degli interventi del servizio idrico integrato relativa agli anni 2024-2029 che prevede un significativo incremento degli interventi in arco piano in aggiunta a quelli già individuati con il precedente invio;
- ATERSIR ha effettuato la necessaria istruttoria sul piano 2024-2029 presentato dal gestore;

considerato che:

- il Programma degli interventi 2024-2029 è elemento propedeutico alla definizione della manovra tariffaria del gestore per il periodo 2024-2029, che sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 639/2023/R/idr deve essere approvata entro il 30/04/2024;
- dalle prime simulazioni di applicazione del metodo tariffario MTI-4, emergono incrementi superiori ai limiti di crescita annuali a causa dell'adeguamento inflattivo dei costi operativi di gestione del servizio, dei coefficienti di calcolo dell'onere finanziario e fiscale standard e del recupero dei maggiori costi di energia elettrica sostenuti nel 2022-2023;
- al fine di applicare pienamente il metodo tariffario MTI-4 è necessario acquisire i dati preconsuntivi dei gestori del servizio e procedere alla validazione ed al caricamento sul nuovo tool di calcolo MTI-4 in corso di elaborazione da parte dell'ARERA;
- tali attività, dalle quali emergerà la situazione economico finanziaria della concessione, attuale e prospettica, e la correlata effettiva fattibilità del Programma degli Interventi, saranno completate dall'Agenzia indicativamente entro il prossimo mese di giugno;

considerando, inoltre, che:

- in presenza di incrementi superiori ai limiti di crescita annuali, la regolazione ARERA prevede, a tutela del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione e della corretta applicazione del principio dell'integrale riconoscimento dei costi efficienti del servizio, la possibilità di ricorrere all'applicazione delle misure di riequilibrio previste nelle Convenzioni di affidamento che includono tra le altre in maniera prioritaria la "rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati" e la "revisione del Programma degli Interventi" con la finalità di garantire all'utenza livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda a tariffe socialmente sostenibili;

preso atto che:

- ad oggi non si hanno informazioni in merito all’esito delle candidature avanzate nell’ambito di alcune linee di finanziamento quali ad es. PNISSSI;

ritenuto pertanto di:

- approvare il programma degli interventi 2024-2029 del gestore Emiliambiente s.p.a. modificato a seguito del confronto con le amministrazioni comunali e allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto nelle more delle modifiche che si rendessero necessarie per far fronte agli impegni derivanti dall’accesso a linee di finanziamento per le quali alla data odierna sono già state avanzate candidature;
- dare mandato al Consiglio d’Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria ai sensi del MTI4 di apportare le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per garantire le condizioni succitate dandone opportuna motivazione nella relazione di accompagnamento alla manovra tariffaria e nella delibera di approvazione;

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti favorevoli **palesi ed unanimi** resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il programma degli interventi 2024-2029 del gestore Emiliambiente s.p.a. riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto nelle more delle modifiche che si rendessero necessarie per far fronte agli impegni derivanti dall’accesso a linee di finanziamento per le quali alla data odierna sono già state avanzate candidature;
2. dare mandato al Consiglio d’Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria di apportare le modifiche che si rendessero necessarie al fine di accettare eventuali candidature con esito positivo e/o funzionali alla corretta applicazione del MTI-4;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 6 del 28 marzo 2024

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo Interventi 2024-2029 – Approvazione.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 28 marzo 2024

Allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale

Servizio Idrico Integrato
Gestore Emiliambiente S.p.A.
Sotto Ambito Parma
PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2024-2029

Sommario

1. PREMESSA	2
2. POI 2020-2023 – CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO E IL CONSUNTIVATO	2
3. DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2024-2029	3
4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	3
4.1 Interventi candidati a finanziamento pubblico	5
4.2 Interventi oggetto di finanziamento pubblico	6
4.3 Interventi conclusi	7
4.4 Interventi non più necessari.....	7
4.5 Nuovi interventi.....	7
4.6 Interventi da ripianificare.....	8
5. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI.....	9

1. PREMESSA

Il Gestore Emiliambiente S.p.a., su richiesta dell’Agenzia ATERSIR, di cui alla nota prot. 2212 del 28/02/2023, ha presentato una proposta per il nuovo Programma Operativo degli interventi per il periodo 2024-2027.

La proposta di POI è stata trasmessa dall’Agenzia in via preliminare alle Amministrazioni locali che hanno potuto inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni, delle quali è data evidenza in un capitolo dedicato della presente relazione di istruttoria.

Con nota prot. 12590 del 07/12/2023 il Gestore Emiliambiente S.p.a. ha chiesto di non procedere all’approvazione della proposta sopra indicata in quanto in corso di predisposizione una versione del Programma Operativo degli interventi allineata al Piano Industriale anch’ esso in fase di predisposizione.

A seguito della deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/idr che estende la programmazione degli interventi a tutto l’anno 2029 è stato chiesto, con nota prot. 273 del 12/01/2024, di integrare la proposta già inviata di cui sopra con le annualità 2028-2029, evidenziando le eventuali modifiche sugli anni 2024-2027 rispetto a quanto già trasmesso.

Il Gestore Emiliambiente S.p.a., con nota prot. 591 del 23/01/2024 ha presentato una proposta per il nuovo Programma Operativo degli interventi per il periodo 2024-2029.

A seguito di ulteriori confronti con il Gestore ne è scaturita una versione definitiva che viene posta all’approvazione dei Consigli Locali di ATERSIR, per poi essere approvata successivamente dal Consiglio d’Ambito quale base del nuovo schema regolatorio per il calcolo della tariffa nelle annualità considerate.

2. POI 2020-2023 – CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO E IL CONSUNTIVATO

Al fine di inquadrare la nuova programmazione si ritiene utile riassumere lo stato di attuazione della precedente programmazione relativa al periodo regolatorio 2020-2023; a tal proposito si riporta nella successiva tabella un raffronto tra pianificato e consuntivato. Si precisa che per l’anno 2023 la rendicontazione disponibile ad oggi non fornisce valori confrontabili con quelli pianificati e pertanto non è riportata nella tabella.

		2020	2021	2022	2023	TOTALE
PIANIFICATO	GESTORE	4.397.789	4.000.289	3.040.289	4.015.289	15.453.656
	FONDO PERDUTO	202.500	665.000	112.825	400.000	1.380.325
	TOTALE	4.600.289	4.665.289	3.153.114	4.415.289	16.833.981
CONSUNTIVATO	GESTORE	3.018.077	4.097.092	3.324.394	N.A.	N.A.
	FONDO PERDUTO	739.801	335.976	635.051	N.A.	N.A.
	TOTALE	3.757.878	4.433.069	3.959.444	N.A.	N.A.

Tabella 1 – Raffronto tra Pianificato e Consuntivato 20-23

In estrema sintesi per gli anni 2020-2021-2022 il totale pianificato era pari a €. 12.418.692 mentre il consuntivato ad oggi è di €. 12.150.391, si rileva quindi un impegno finanziario leggermente inferiore rispetto alla programmazione.

3. DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2024-2029

Il nuovo programma degli interventi per il sessennio 2024-2029 prevede investimenti per un totale di €. 49.687.379 di cui €. 3.817.379 contributi (pari a circa 8,3M€/anno); mentre nel precedente quadriennio gli investimenti ammontavano ad €. 16.833.981 di cui €. 1.380.325 contributi (pari a circa 4,2M€/anno) con un incremento pari a circa il 97% di investimenti per anno rispetto a quanto pianificato nel periodo precedente.

Sono stati pianificati gli interventi presenti nel POI 2020-2023, ancora in corso, i nuovi titoli, ritenuti necessari per la risoluzione di criticità o per il miglioramento dei macro indicatori relativi alla qualità tecnica, o per rispondere ad esigenze di adeguamento normativo, aggiornando motivatamente, dove necessario, l'importo progettuale in conseguenza di affinamenti dovuti all'avanzamento dei gradi di progettazione, a causa degli aumenti dei prezzi dei materiali o per scelte progettuali variate. Tali specificità sono trattate in appositi capitoli della relazione.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il Gestore ha formulato la sua proposta, trasmessa con prot.n. 591 del 23/01/2024 riassunta nella tabella che segue, presentata secondo le modalità riportate nelle "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato: modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017" di cui alla Delibera n.64/2022 del Consiglio d'Ambito.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
INVESTIMENTI DEL GESTORE	5.085.000	7.845.000	8.635.000	9.915.000	7.045.000	7.345.000	45.870.000
CONTRIBUTI A F. PERDUTO	2.317.379	420.000	270.000	270.000	270.000	270.000	3.817.379
TOTALE	7.402.379	8.265.000	8.905.000	10.185.000	7.315.000	7.615.000	49.687.379

Tabella 2 – ammontare complessivo degli investimenti proposto dal Gestore per il quadriennio 24-29

Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle e grafici di sintesi da un'analisi che l'Agenzia ha effettuato sulla versione proposta del POI. Tali tabelle e grafici hanno lo scopo di illustrare in termini numerici per alcune macro-categorie tematiche più significative i contenuti del nuovo POI. Per il dettaglio degli interventi si rimanda all'elenco del POI e alla relativa programmazione (Allegato 1 e Allegato 2).

4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi proposti sono stati suddivisi in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura.

	investimenti Ge- store	importo finanzia- mento pubblico	TOTALE
ACQUEDOTTO	34.750.000	2.600.000	37.350.000
FOGNATURA	1.570.000	120.000	1.690.000
DEPURAZIONE	5.600.000	1.097.379	6.697.379
ACQUE BIANCHE	180.000	0	180.000
STRUTTURA	2.250.000	0	2.250.000
TUTTI	1.520.000	0	1.520.000
TOTALE	45.870.000	3.817.379	49.687.379

Tabella 3 – interventi suddivisi per servizio

Gli investimenti maggiori si riscontrano nel servizio acquedottistico.

I contributi pubblici inseriti riguardano un intervento in fase di realizzazione finanziato al 50% con fondi FSC per la riduzione dei valori delle perdite ed un intervento finanziato al 100% con fondi PNRR Fognatura e depurazione – “Messa in sicurezza e opere accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza”.

L'intervento cod. 2019PREA0046 “Messa in sicurezza e opere accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza”, è ammesso ai fondi del PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza), la linea di finanziamento (fognatura e depurazione) relativa all'investimento 4.4 -Investimenti fognatura e depurazione, missione 2, componente 4. Il finanziamento è stato assegnato con il decreto ministeriale n. 262 del 9 agosto 2023, per un importo pari ad €. 1.097.379.

Gli altri contributi inseriti sono contributi di natura “privata” e riguardano gli allacciamenti di acquedotto e fognatura.

Per quanto riguarda gli investimenti di struttura il Gestore ha valutato di inserire un importo leggermente inferiore, precisamente pari ad €.375.000 per ogni singola annualità, rispetto alla misura massima pari ad €.376.167, definita dalla Delibera di Consiglio d'Ambito n. 32 del 19/04/2018, aggiornata dalla Delibera di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

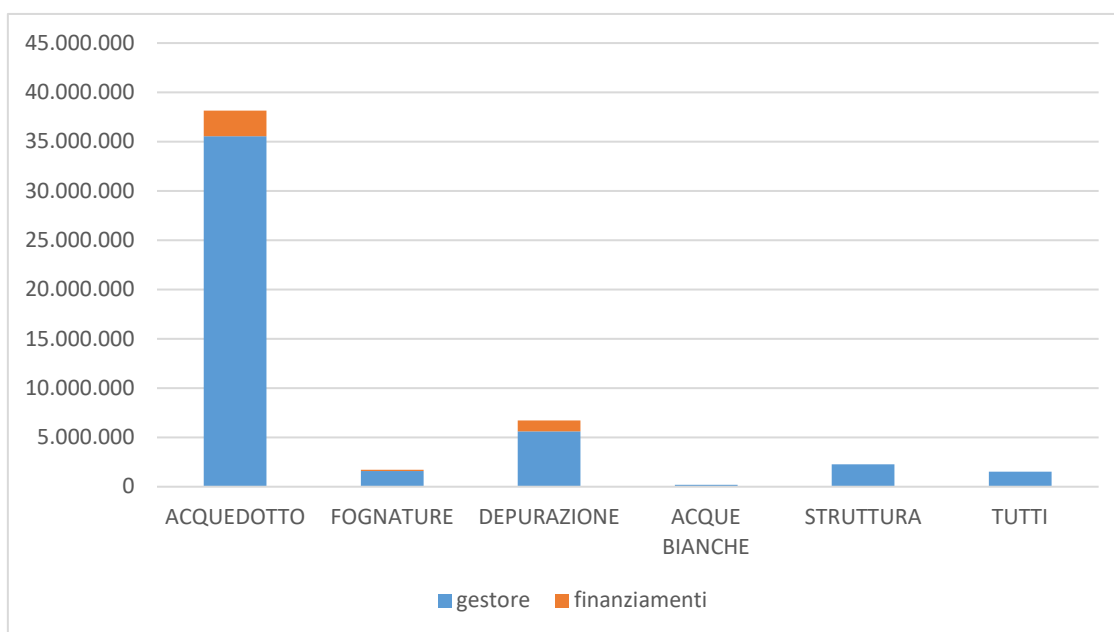


Figura 1 - Suddivisione investimenti totali proposti per servizio

Nella tabella e nel grafico successivo si rappresentano gli interventi in base alla loro classificazione tramite i macro indicatori della qualità tecnica così come definiti da ARERA con la delibera 917/17. È evidente l'impegno nel settore acquedottistico (macro indicatori M1, M2, M3).

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Altro	475.000,00	1.075.000,00	375.000,00	375.000,00	975.000,00	975.000,00
M1	1.900.000,00	2.450.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00
M1-M2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00
M1-M2-M3	2.550.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	3.550.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00
M1-M3-M6	30.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
M2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
M3	270.000,00	430.000,00	270.000,00	970.000,00	270.000,00	270.000,00
M4	190.000,00	240.000,00	290.000,00	290.000,00	370.000,00	370.000,00
M5	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
M6	1.717.379,00	720.000,00	820.000,00	920.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00

Tabella 4 – suddivisione degli investimenti per macroindicatori

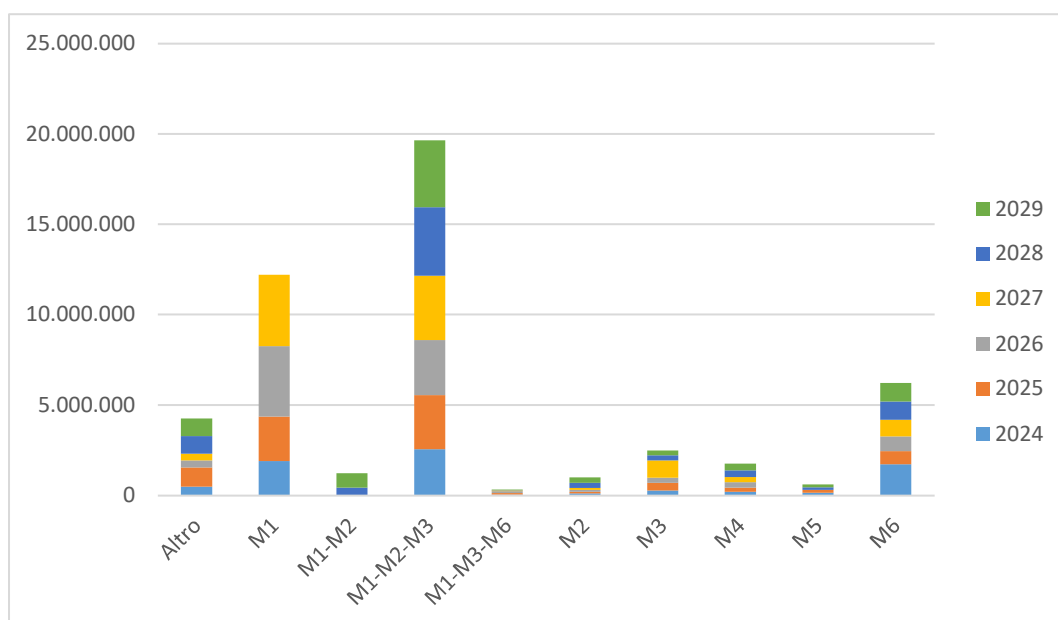


Figura 2 - Suddivisione investimenti per macroindicatore

4.1 Interventi candidati a finanziamento pubblico

Nella proposta di piano è contenuto n.1 titolo candidato per l'ottenimento di finanziamento pubblico:

- l'intervento **cod. 2018PREA0034** "Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato - (ex-FSC)" nei comuni di Parma e Fontanellato, è stato candidato per essere finanziato con le risorse del **PNISSI (Piano nazionale interventi infrastrutturali sicurezza settore idrico)**. Al momento gli importi indicati risultano a carico della tariffa del SII e non vi è evidenza del finanziamento. Una volta che sarà accertata l'assegnazione del finanziamento e l'erogazione del contributo, verrà allineata la programmazione cambiando il soggetto finanziatore.

Il Gestore per questo intervento ha inoltre proposto la revisione dell'importo progettuale, con aumento della spesa superiore al 20%, da €2.852.900 a €3.950.000. Il progetto di fattibilità

tecnico-economica, era stato redatto nel 2019 al fine di richiederne il finanziamento con i fondi FSC, mentre il progetto esecutivo è stato completato nel 2022, a causa del complesso iter autorizzativo che ha previsto la convocazione da parte di Atersir di numerose conferenze dei servizi.

Come noto nel periodo intercorso fra le due progettazioni vi è stato un notevole aumento del costo delle materie prime, e di conseguenza l'adeguamento dei prezzi, di cui si sono utilizzate prevalentemente le voci dell'Elenco Prezzi Regionale dell'Emilia Romagna.

4.2 Interventi oggetto di finanziamento pubblico

Nella proposta di POI sono presenti alcuni interventi, finanziati con risorse FSC (**Fondo di sviluppo e Coesione**), di seguito elencati.

L'intervento finanziato, in parte, con risorse **FSC, cod. 2022PREA0057** "ricerca e riduzione perdite commerciali acquedotto (sostituzione contatori e adeguamento allacci) – FSC" nei comuni di Soragna, Busseto e Salsomaggiore, relativo al bando per la **riduzione delle perdite**, di importo complessivo pari ad €. 2.852.900 e contributo pari ad €.1.426.450.

Tale intervento risulta essere **in fase di realizzazione** per questo motivo sono stati pianificati importi per le annualità 2024 e 2025, relativi alla parte non ancora realizzata.

L'intervento **cod. 2018PREA0032** "Manutenzione straordinaria della centrale idrica di Parola (Fidenza) - FSC - Scheda numero 2" nei comuni di Fidenza, Fontanellato e Parma, relativo al bando per la riduzione dei valori delle perdite.

Tale intervento terminato nel corso dell'annualità 2023 è stato mantenuto in pianificazione per la rendicontazione di eventuali code di intervento e del contributo.

Per n.2 interventi, finanziati al 50% con risorse **FSC** per la **riduzione dei valori delle perdite**, risultano **terminati** e per i quali si è conclusa anche la rendicontazione e quindi non presenti nel POI 2024-2029.

Codice	Titolo	Comune
2018PREA0033	Ricerca perdite acquedotto; sostituzione contatori - FSC - Scheda numero 3	Opere Pluricomunali
2018PREA0035	Sostituzione reti e allacciamenti reti distributive dei comuni in gestione - FSC - Scheda numero 4	Opere Pluricomunali

Tabella 5 - FSC terminati

Sono altresì presenti n.2 interventi finanziati al 100% con risorse della Protezione Civile, per fronteggiare situazioni di **emergenza idrica 2022** (OCDPC N.906/2022).

Tali interventi che risultano terminati, sono stati mantenuti in pianificazione per la rendicontazione del contributo.

Codice	Titolo	Comune
2022PREA0058	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante rigenerazione di n.3 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Parola.	Fidenza
2022PREA0059	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica ai fini idropotabili mediante rigenerazione di n.2 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Priorato	Fontanellato

Tabella 6- FSC terminati in attesa dell'incasso del contributo

Per l'intervento cod. 2022PREA0058 "Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante rigenerazione di n.3 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Parola" si è proceduto inoltre ad una revisione parziale del titolo, per renderlo coerente con il titolo inserito nell'ordinanza della protezione civile.

4.3 Interventi conclusi

Il Gestore ha evidenziato in un capitolo a parte gli interventi che nel frattempo, rispetto al quadriennio precedente, sono stati terminati e rendicontati.

Si tratta di complessivi n. 3 lavori, di seguito elencati:

Codice	Titolo	Comune
2014PREA0016	054-EA - Realizzazione collettore fognario e aumento potenzialità del depuratore di Colorno sud (3° Livello). San Protaso. A servizio dei comuni Fiorenzuola, Castell'Arquato, Lugagnano,	Colorno
2019PREA0047	Rifacimento pozzo 3 di San Donato	Parma
2019PREA0048	Ricostruzione cabina viale Battej, opere accessorie e demolizione pensile	Sissa Tre Casali

Tabella 7 – Interventi conclusi

4.4 Interventi non più necessari

Sono stati evidenziati inoltre, nella proposta di revisione, gli interventi che il Gestore ha ritenuto non più necessari, di seguito elencati, si tratta di n.1 intervento sostituito con altro titolo:

Codice	Titolo	Comune	Motivazione
2014PREA0011	037-EA - Sostituzione condotta adduttrice interconnessione comuni della Bassa - I LOTTO	Opere Pluri-comunali	In passato era stato eseguito un progetto di massima, il quale è poi stato sostituito dal progetto "Sostituzione condotta adduttrice nei comuni di Parma e Fontanellato" (già inserito nel POI)

Tabella 8 – Interventi non più necessari

4.5 Nuovi interventi

Il Gestore ha proposto l'inserimento di complessivi n. 10 interventi ritenuti prioritari o da inserire per adempiere a prescrizioni normative:

Titolo	Servizio	Comuni
Nuovi allacciamenti fognatura	FOGNATURA	Opere pluricomuni
Collegamento idrico di S.Polo - Sostituzione rete	ACQUEDOTTO	Torrile
Piezometri	ACQUEDOTTO	Noceto
Impianto fotovoltaico c/o c.le S.Donato	ACQUEDOTTO	Parma

<i>Impianto biossido c/o c.le Priorato e Lodesana</i>	ACQUEDOTTO	Fontanellato
<i>Revamping trattamento bottini (nuove centrifughe)</i>	DEPURAZIONE	Busseto-Fidenza
<i>Impianti fotovoltaici</i>	TUTTI	Opere pluricomunali
<i>Risanamento vasche di accumulo</i>	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali
<i>Risanamento e realizzazione locali tecnici</i>	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali
<i>Realizzazione impianto ad osmosi presso c.le idrica di Priorato</i>	ACQUEDOTTO	Parma

Tabella 9 – Nuovi interventi proposti

Sono inoltre stati proposti alcuni titoli cumulativi necessari per la rendicontazione dei contributi per gli estendimenti di rete fognaria a carico di privati o per nuovi allacci fognari.

In riferimento agli **estendimenti di rete alle case sparse**, coerentemente con quanto stabilito dalla delibera CAMB n. 122 del 18/12/2023, che prevede che per ciascuna annualità siano destinate risorse pari ad una percentuale, definita dal Consiglio Locale e calcolata sulla media dell'ammontare degli investimenti pianificati nel quadriennio precedente, è fissato un budget annuale pari a 168.340 €/anno.

In relazione alle effettive convenzioni sottoscritte, gli interventi verranno via via inseriti nel POI, fino a copertura del budget prefissato. Gli importi residui o eventualmente non impegnati a carico degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse potranno essere utilizzati, sulla medesima annualità, per eventuali interventi afferenti al capitolo delle manutenzioni straordinarie acquedotto.

Ad oggi non risultano interventi di estendimenti rete alle case sparse per i quali siano state sottoscritte convenzioni.

4.6 Interventi da ripianificare

In attesa di avviare lo studio di fattibilità, finalizzato a definire gli interventi risolutivi e i relativi importi alcuni interventi presenti ma non ancora iniziati, non è stato possibile procedere a pianificare gli importi necessari per la realizzazione.

Resta inteso che qualora dovesse rendersi necessario ed urgente procedere alla realizzazione, potranno essere inseriti nella Programmazione 2024-2029.

L'elenco degli interventi oggetto di futura ripianificazione è riportato di seguito:

Codice	Titolo	Comuni	Note
2020PREA0053	Adeguamento sismico e messa in sicurezza serbatoi pensili	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali
2020PREA0052	Sostituzione reti di adduzione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali
2020PREA0055	Realizzazione vasche/trattamenti per riduzione carico inquinante "prima pioggia"	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali
2020PREA0056	Realizzazione impianti ad osmosi presso c.le idrica di S.Donato	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali

Tabella 10 – Interventi da ripianificare

5. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI

Per il bacino di affidamento del Gestore Emiliambiente S.p.a, Atersir ha proceduto ad inviare la documentazione tecnica ai comuni con nota prot. PG.AT/2023/007912 del 10/08/2023 e non ha ricevuto osservazioni o richieste di approfondimento.

Si evidenzia che rispetto alla versione indicata la presente proposta ha sostanzialmente confermato gli interventi specifici individuati prevedendo variazioni importanti in aumento degli importi messi a Piano oltre alla estensione della pianificazione alle annualità 2028 e 2029 per le motivazioni esposte in precedenza.

Proposta nuovo Piano Interventi 2024-2029

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Importo progettuale	PIANO ATERSIR 2024			PIANO ATERSIR 2025			PIANO ATERSIR 2026			PIANO ATERSIR 2027			PIANO ATERSIR 2028			PIANO ATERSIR 2029			
						Investimenti del gestore 2024	Contributi fondo perduto 2024	Investimenti complessivi 2024	Investimenti del gestore 2025	Contributi fondo perduto 2025	Investimenti complessivi 2025	Investimenti del gestore 2026	Contributi fondo perduto 2026	Investimenti complessivi 2026	Investimenti del gestore 2027	Contributi fondo perduto 2027	Investimenti complessivi 2027	Investimenti del gestore 2028	Contributi fondo perduto 2028	Investimenti complessivi 2028	Investimenti del gestore 2029	Contributi fondo perduto 2029	Investimenti complessivi 2029	
1	2014PREA0013	042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria	T	Opere pluricomunali	Gestore	320.000 €	30.000 €	-€	30.000 €	100.000 €	-€	100.000 €	100.000 €	-€	100.000 €	30.000 €	-€	30.000 €	30.000 €	-€	30.000 €	30.000 €	-€	30.000 €
2	2018PREA0032	FSC -Manutenzione straordinaria della centrale idrica di Parola (Fidenza) - Scheda numero 2	A	Fidenza, Fontanellato, Parma	Gestore	600.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
3	2018PREA0034	(ex-FSC) - Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato	A	Parma, Fontanellato	Gestore	3.950.000 €	-€	-€	-€	400.000 €	-€	400.000 €	1.900.000 €	-€	1.900.000 €	1.700.000 €	-€	1.700.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€
4	2022PREA0057	FSC - Ricerca e riduzione perdite commerciali acquedotto (sostituzione contatori e adeguamento allacci)	A	Soragna, Busseto e Salsomaggiore	Gestore	2.852.900 €	950.000 €	950.000 €	1.900.000 €	150.000 €	150.000 €	300.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
5	2019PREA0036	Nuovi allacciamenti acquedotto	A	Opere pluricomunali	Gestore	-€	-€	250.000 €	250.000 €	-€	250.000 €	250.000 €	-€	250.000 €	250.000 €	-€	250.000 €	250.000 €	-€	250.000 €	250.000 €	-€	250.000 €	250.000 €
6	2019PREA0037	Sostituzione contatori e Smart Metering	A	Opere pluricomunali	Gestore	400.000 €	-€	-€	-€	1.750.000 €	-€	1.750.000 €	2.000.000 €	-€	2.000.000 €	2.250.000 €	-€	2.250.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€
7	2019PREA0038	Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche	AB	Opere pluricomunali	Gestore	-€	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	50.000 €	-€	50.000 €	50.000 €	-€	50.000 €
8	2019PREA0039	Cartografia	F	Opere pluricomunali	Gestore	325.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €
9	2019PREA0040	Interventi di rinnovo reti e allacci, per la riduzione delle perdite	A	Opere pluricomunali	Gestore	-€	500.000 €	-€	500.000 €	600.000 €	-€	600.000 €	650.000 €	-€	650.000 €	750.000 €	-€	750.000 €	900.000 €	-€	900.000 €	900.000 €	-€	900.000 €
10	2019PREA0041	Manutenzione straordinaria fognature	F	Opere pluricomunali	Gestore	-€	150.000 €	-€	150.000 €	200.000 €	-€	200.000 €	250.000 €	-€	250.000 €	250.000 €	-€	250.000 €	300.000 €	-€	300.000 €	300.000 €	-€	300.000 €
11	2019PREA0042	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	D	Opere pluricomunali	Gestore	-€	600.000 €	-€	600.000 €	700.000 €	-€	700.000 €	800.000 €	-€	800.000 €	900.000 €	-€	900.000 €	1.000.000 €	-€	1.000.000 €	1.000.000 €	-€	1.000.000 €
12	2019PREA0043	Manutenzione straordinaria acquedotto	A	Opere pluricomunali	Gestore	-€	2.000.000 €	-€	2.000.000 €	2.000.000 €	-€	2.000.000 €	2.000.000 €	-€	2.000.000 €	2.000.000 €	-€	2.000.000 €	2.300.000 €	-€	2.300.000 €	2.200.000 €	-€	2.200.000 €
13	2019PREA0044	Modellazione idraulica di acquedotti, distrettualizzazione della rete, analisi e ricerca delle perdite idriche, progetto generale acquedotto	A	Opere pluricomunali	Gestore	1.400.000 €	30.000 €	-€	30.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
14	2019PREA0045	Investimenti di struttura *	S	Opere pluricomunali	Gestore	-€	375.000 €	-€	375.000 €	375.000 €	-€	375.000 €	375.000 €	-€	375.000 €	375.000 €	-€	375.000 €	375.000 €	-€	375.000 €	375.000 €	-€	375.000 €
15	2019PREA0046	PNRR Fognatura e depurazione - Messa in sicurezza e opere accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza	D	Fidenza	Gestore	1.097.379 €	-€	1.097.379 €	1.097.379 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16	2020PREA0050	demolizione e ripristino pensile San Polo	A	Torricelle	Gestore	400.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	400.000 €	-€	400.000 €	-€	-€	-€
17	2020PREA0051	WSP	A	Opere pluricomunali	Gestore	-€	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €
18	2020PREA0052	Sostituzione reti di adduzione	A	Opere pluricomunali	Gestore	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
19	2020PREA0054	Rifacimento pozzi c/o c.li idriche	A	Opere pluricomunali	Gestore	-€	20.000 €	-€	20.000 €	400.000 €	-€	400.000 €	400.000 €	-€	400.000 €	800.000 €	-€	800.000 €	600.000 €	-€	600.000 €	600.000 €	-€	600.000 €
20	2022PREA0058	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante rigenerazione di n.3 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Parola.	A	Fidenza	Gestore	59.950 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
21	2022PREA0059	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica ai fini idropotabili mediante rigenerazione di n.2 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Priorato	A	Fontanellato	Gestore	47.875 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
22	New	Nuovi allacciamenti fognatura	F	Opere pluricomunali	Gestore	-€	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	20.000 €
23	New	Collegamento idrico di S.Polo - Sostituzione rete	A	Torricelle	Gestore	820.000 €	20.000 €	-€	20.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	800.000 €	800.000 €
24	New	Piezometri	A	Noceto	Gestore	60.000 €	-€	-€	-€	60.000 €	-€	60.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
25	New	Impianto fotovoltaico c/o c.le S.Donato	A	Parma	Gestore	800.000 €	100.000 €	-€	100.000 €	700.000 €	-€	700.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
26	New	Impianto biossido c/o c.le Priorato e Lodesana	A	Fontanellato	Gestore	100.000 €	-€	-€	-€	100.000 €	-€	100.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
27	New	Revamping trattamento bottini (nuove centrifughe)	D	Busseto-Fidenza	Gestore	600.000 €	150.000 €	-€	150.000 €	150.000 €	-€	150.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	150.000 €	-€	150.000 €	150.000 €	-€	150.000 €
28	New	Impianti fotovoltaici	T	Opere pluricomunali	Gestore	1.200.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	600.000 €	-€	600.000 €	600.000 €	-€	600.000 €
29	New	Risanamento vasche di accumulo	A	Opere pluricomunali	Gestore	600.000 €	50.000 €	-€	50.000 €	50.000 €	-€	50.000 €	50.000 €	-€	50.000 €	50.000 €	-€	50.000 €	200.000 €	-€	200.000 €	200.000 €	-€	200.000 €
30	New	Risanamento e realizzazione locali tecnici	A	Opere pluricomunali	Gestore	400.000 €	50.000 €	-€	50.000 €	50.000 €	-€	50.000 €	50.000 €	-€	50.000 €	50.000 €	-€	50.000 €	100.000 €	-€	100.000 €	100.000 €	-€	100.000 €
31	New	Realizzazione impianto ad osmosi presso c.le idrica di Priorato	A	Fontanellato	Gestore	700.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	700.000 €	-€	700.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€

Investimenti del gestore 2024	Contributi fondo perduto 2024	Investimenti complessivi 2024	Investimenti del gestore 2025	Contributi fondo perduto 2025	Investimenti complessivi 2025	Investimenti del gestore 2026	Contributi fondo perduto 2026	Investimenti complessivi 2026	Investimenti del gestore 2027	Contributi fondo perduto 2027	Investimenti complessivi 2027	Investimenti del gestore 2028	Contributi fondo perduto 2028	Investimenti complessivi 2028	Investimenti del gestore 2029	Contributi fondo perduto 2029	Investimenti complessivi 2029
5.085.000 €	2.317.379 €	7.402.379 €	7.845.000 €	420.000 €	8.265.000 €	8.635.000 €	270.000 €	8.905.000 €	9.915.000 €	270.000 €	10.185.000 €	7.045.000 €	270.000 €	7.315.000 €	7.345.000 €	270.000 €	7.615.000 €

Proposta nuovo Piano Interventi 2024-2029

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	NOTE
1	2014PREA0013	042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria	T	Opere pluricomunali	320.000 €	I MODESTI IMPORTI ANNUALI SONO NECESSARI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI O PER PICCOLE IMPLEMENTAZIONI.
2	2018PREA0032	FSC -Manutenzione straordinaria della centrale idrica di Parola (Fidenza) - Scheda numero 2	A	Fidenza, Fontanellato, Parma	600.000 €	TITOLO MANTENUTO PER RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO
3	2018PREA0034	(ex-FSC) - Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato	A	Parma, Fontanellato	3.950.000 €	IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLA "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE DI INTERCONNESSIONE NEI COMUNI DI PARMA E FONTANELLATO", IL CUI IMPORTO ERA DI €. 2.846.000, È STATO REDATTO NEL 2019 AL FINE DI RICHIEDERNE IL FINANZIAMENTO CON I FONDI FSC , MENTRE IL PROGETTO ESECUTIVO È STATO COMPLETATO NEL 2022, A CAUSA DEL COMPLESSO ITER AUTORIZZATIVO CHE HA PREVISTO LA CONVOCAZIONE DA PARTE DI ATERSIR DI NUMEROSE CONFERENZE DEI SERVIZI. COME NOTO NEL PERIODO INTERCORSO FRA LE DUE PROGETTAZIONI VI È STATO UN NOTEVOLE AUMENTO DELLE MATERIE PRIME, E DI CONSEGUENZA L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI, DI CUI SI SONO UTILIZZATE PREVALENTEMENTE LE VOCI DI PREZZO DELL'ELENCO PREZZI REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA HA DETERMINATO IL NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO IN € 3.950.000.
4	2022PREA0057	FSC - Ricerca e riduzione perdite commerciali acquedotto (sostituzione contatori e adeguamento allacci)	A	Soragna, Busseto e Salsomaggiore	2.852.900 €	PROGETTO FINANZIATO IN PARTE CON FONDI FSC
5	2019PREA0036	Nuovi allacciamenti acquedotto	A	Opere pluricomunali	-€	
6	2019PREA0037	Sostituzione contatori e Smart Metering	A	Opere pluricomunali	400.000 €	
7	2019PREA0038	Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche	AB	Opere pluricomunali	-€	
8	2019PREA0039	Cartografia	F	Opere pluricomunali	325.000 €	
9	2019PREA0040	Interventi di rinnovo reti e allacci, per la riduzione delle perdite	A	Opere pluricomunali	-€	MODIFICATO LEGGERMENTE IL TITOLO, RESO PIÙ COERENTE.
10	2019PREA0041	Manutenzione straordinaria fognature	F	Opere pluricomunali	-€	
11	2019PREA0042	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	D	Opere pluricomunali	-€	
12	2019PREA0043	Manutenzione straordinaria acquedotto	A	Opere pluricomunali	-€	
13	2019PREA0044	Modellazione idraulica di acquedotti, distrettualizzazione della rete, analisi e ricerca delle perdite idriche, progetto generale acquedotto	A	Opere pluricomunali	1.400.000 €	
14	2019PREA0045	Investimenti di struttura *	S	Opere pluricomunali	-€	
15	2019PREA0046	PNRR Fognatura e depurazione - Messa in sicurezza e opere accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza	D	Fidenza	1.097.379 €	
16	2020PREA0050	demolizione e ripristino pensile San Polo	A	Torile	400.000 €	
17	2020PREA0051	WSP	A	Opere pluricomunali	-€	
18	2020PREA0052	Sostituzione reti di adduzione	A	Opere pluricomunali	-€	
19	2020PREA0054	Rifacimento pozzi c/o c.li idriche	A	Opere pluricomunali	-€	
20	2022PREA0058	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante rigenerazione di n.3 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Parola.	A	Fidenza	59.950 €	INTERVENTO GIÀ REALIZZATO. MANTENUTO IN PIANIFICAZIONE AL FINE DI RENDICONTARE IL CONTRIBUTO DELLA PROT. CIV. UNA VOLTA INCASSATO. MODIFICATO IL TITOLO RESO ANALOGO A QUELLO DELLE SCHEDE DELLA PROT. CIVILE.
21	2022PREA0059	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica ai fini idropotabili mediante rigenerazione di n.2 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Priorato	A	Fontanellato	47.875 €	INTERVENTO GIÀ REALIZZATO. MANTENUTO IN PIANIFICAZIONE AL FINE DI RENDICONTARE IL CONTRIBUTO DELLA PROT. CIV. UNA VOLTA INCASSATO
22	New	Nuovi allacciamenti fognatura	F	Opere pluricomunali	-€	CREATO TITOLO ANALOGO PER LA FOGNATURA, PRIMA ERA PRESENTE SOLO PER ACQUEDOTTO
23	New	Collegamento idrico di S.Polo - Sostituzione rete	A	Torile	820.000 €	
24	New	Piezometri	A	Noceto	60.000 €	
25	New	Impianto fotovoltaico c/o c.le S.Donato	A	Parma	800.000 €	
26	New	Impianto biossido c/o c.le Priorato e Lodesana	A	Fontanellato	100.000 €	
27	New	Revamping trattamento bottini (nuove centrifughe)	D	Busseto-Fidenza	600.000 €	
28	New	Impianti fotovoltaici	T	Opere pluricomunali	1.200.000 €	
29	New	Risanamento vasche di accumulo	A	Opere pluricomunali	600.000 €	
30	New	Risanamento e realizzazione locali tecnici	A	Opere pluricomunali	400.000 €	
31	New	Realizzazione impianto ad osmosi presso c.le idrica di Priorato	A	Fontanellato	700.000 €	PROGETTAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO AD OSMOSI PER RIDUZIONE NO3



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Gianluca Borghi

Il segretario verbalizzante

F.to Marialuisa Campani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 27 maggio 2024

Il Direttore
F.to Vito Belladonna
